



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedh@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Chihuahua, Chih., a 14 de febrero del 2020

OFICIO: CEDH:17c.12.043/2020


LIC. JAIR JESUS ARAIZA GALARZA
SECRETARIO TECNICO EJECUTIVO.
P R E S E N T E.-


Por medio del presente le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por el importe de \$1'900,506.67, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Remodelación oficinas C.E.D.H. en Chihuahua.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
Recursos propios	6000	6223 – Reconstrucción y Remodelación por contrato (Chih)	2'200,000.00

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible para pago en el ejercicio fiscal 2020; sin embargo, para llevar a cabo la adquisición del bien, servicio o arrendamiento, es necesario cumplir lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS





COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ACTA DE LA SESIÓN PRIMERA ORDINARIA CELEBRADA POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A 17 DE FEBRERO DEL 2020, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CITO EN AVE. ZARCO, COL. ZARCO No. 2427, SE REUNIERON LOS SIGUIENTES: MTRO. NÉSTOR M. ARMENDÁRIZ LOYA.- PRESIDENTE DEL ORGANISMO, C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON, DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, QUIEN ADEMÁS, PRESIDIRÁ ESTA SESIÓN, LIC. JAIR JESÚS ARAIZA GALARZA, SECRETARIO TÉCNICO EJECUTIVO DE ESTA COMISIÓN Y LA LIC. YULIANA ILEM RODRÍGUEZ GONZALEZ, DIRECTORA DE CONTROL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. -----

UNA VEZ QUE SE PASO LISTA DE ASISTENCIA, Y HABIENDO QUORUM LEGAL, LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ PROCEDIERON A LA DICTAMINACION DE LOS ASUNTOS A TRATAR, LOS CUALES SE ENVIARON CON ANTELACIÓN, ANEXANDO SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE. -----

EN USO DE LA PALABRA EL MTRO. NÉSTOR M. ARMENDÁRIZ LOYA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, INFORMA A LOS PRESENTES LA NECESIDAD DE CONSTITUIR EL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ORGANISMO, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, YA QUE A PARTIR DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018, POR DECRETO No. LXV/EXLEY/0891/2018 I P.O. DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REFORMO E INCLUYO EN LA APLICACIÓN DE DICHA LEY A NUESTRO ORGANISMO DE ACUERDO AL ARTICULO 1° FRACCIÓN V, DE LA CITADA LEY. POR LO QUE SE DEBERÁ OBSERVAR LA APLICACIÓN DE ESTE ORDENAMIENTO EN ESTE ORGANISMO, CUANDO SE TRATE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, GASTO, EJECUCIÓN, Y CONTROL EN MATERIA DE LICITACIONES; CONTRATACIONES, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DERIVADO DE LO ANTERIOR, Y EN APEGO AL ARTÍCULO 25 DE LEY ANTES MENCIONADA, SE DETERMINA LA INTEGRACIÓN Y DESIGNACIÓN DE SUPLENTE DE ESTE ORGANO COLEGIADO EJERCICIO FISCAL 2020, CABE ACLARA QUE UN SERVIDOR COMO PRESIDENTE DE ESTE ORGANISMO DESIGNO AL C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON, DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, PRESIDENTE DE ESTE CUERPO COLEGIADO.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ACTA DE LA SESIÓN PRIMERA ORDINARIA CELEBRADA POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

INTEGRANTES:

PRESIDENTE DEL COMITÉ.- C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON, DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CON VOZ Y VOTO.

SUPLENTE: C. PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ, AUXILIAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

VOCAL.- LIC. JAIR JESÚS ARAIZA GALARZA, SECRETARIO TÉCNICO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CON VOZ Y VOTO.

SUPLENTE: C. ADRIANA CASTRO RUIZ, SECRETARIA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

VOCAL: LIC. YULIANA ILEM RODRÍGUEZ GONZALEZ.- TITULAR DE AL DIRECCIÓN DE CONTROL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CON VOZ Y VOTO.

SUPLENTE: LIC. ADA MIRIAM AGUILERA MERCADO.- PRIMER VISITADORA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

NOTA.- LAS DECISIONES DEL COMITÉ SERÁN TOMADAS POR MAYORÍA DE VOTOS, EN CASO DE EMPATE, LA PRESIDENCIA TENDRÁ VOTO DE CALIDAD.

SE INVITARA AL REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL QUIEN PODRÁ ASISTIR A LAS SESIONES DE ESTE ORGANO COLEGIADO COMO OBSERVADOR, CON VOZ PERO SIN VOTO. LOS INVITADOS QUE ASISTAN PARA PROPORCIONAR Ó ACLARAR INFORMACIÓN DE LOS ASUNTOS A TRATAR, TENDRÁN DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO, POR LO QUE EXCLUSIVAMENTE DEBERÁN FIRMAR EL ACTA DE SESIÓN A LA QUE ASISTAN. -----

-----ACUERDO 01-01-20 -----

SE DICTAMINA PROCEDENTE POR LOS MIEMBROS DEL ESTE ORGANO COLEGIADO LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EJERCICIO FISCAL 2020.-----

SE SOLICITA A ESTE CUERPO COLEGIADO SU DICTAMINACION Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIÓN QUE DEBERÁ OBSERVAR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EJERCICIO FISCAL 2020. -----



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ACTA DE LA SESIÓN PRIMERA ORDINARIA CELEBRADA POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

CALENDARIO DE SESIONES 2020, DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

• CALENDARIO.

	SESIÓN.	MES	DÍA	HORA
FEBRERO	ORDINARIA.	2	17	10:00 AM
MARZO	ORDINARIA.	3	4	10:00 AM
ABRIL	ORDINARIA.	4	6	10:00 AM
MAYO	ORDINARIA.	5	7	10:00 AM
JUNIO	ORDINARIA.	6	3	10:00 AM
JULIO	ORDINARIA.	7	3	10:00 AM
AGOSTO	ORDINARIA.	8	5	10:00 AM
SEPTIEMBRE	ORDINARIA.	9	4	10:00 AM
OCTUBRE	ORDINARIA.	10	6	10:00 AM
NOVIEMBRE	ORDINARIA.	11	9	10:00 AM
DICIEMBRE	ORDINARIA.	12	7	10:00 AM

LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ESTE ORGANO COLEGIADO SE LLEVARAN A CABO UNA VEZ POR MES Y SERA ENVIADA LA INFORMACIÓN A LOS MIEMBROS DE ESTE, LA CUAL INCLUIRÁ INVITACIÓN, ORDEN DEL DÍA Y EXPEDIENTES DE ASUNTOS A TRATAR. -----

----- ACUERDO 01-02-20 -----

SE DICTAMINA PROCEDENTE POR LOS MIEMBROS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO CALENDARIO DE SESIÓN QUE DEBERÁ OBSERVAR EL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EJERCICIO FISCAL 2020. -----



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ACTA DE LA SESIÓN PRIMERA ORDINARIA CELEBRADA POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

EL C. PRESIDENTE DE ESTE ORGANISMO, HA INSTRUIDO A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFECTUAR LA REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE QUEJAS, ÁREA DE CALDERAS Y BODEGA (PLANTA BAJA), QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN ESTAS OFICINAS Y QUE FORMA PARTE DEL INMUEBLE DONDE SE ALBERGA LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICINA CHIHUAHUA. LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE QUE EL ÁREA DE QUEJAS CUENTE CON MAYOR ACCESIBILIDAD Y PRESENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS (VISITANTES). CON REFERENCIA EL ÁREA DE CALDERAS Y BODEGA, SON ESPACIOS OBSOLETOS Y QUE SE PRETENDE UTILIZAR PARA OFICINAS QUE ES LO QUE SE ADOLECE DE ESPACIOS EN ESTE MOMENTO. LO ANTERIOR, LA DIRECCIÓN SE ABOCO A LLEVAR A CABO EL PROYECTO EJECUTIVO, ASÍ COMO EL CATALOGO DE CONCEPTOS, E INVITAR A 3 CONTRATISTAS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LO ANTERIOR SE ATENDERÁ CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA REALIZAR ESTE TIPO DE CONTRATACIONES. EL DÍA 27 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SE LLEVO A CABO LA VISITA DE OBRA PARA DISIPAR CON LOS INVITADOS (CONTRATISTAS) CUALQUIER DUDA AL RESPECTO. DESTACO QUE EL PROVEEDOR DENOMINADO "DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V." ES QUIEN PRESENTA EL PRECIO MAS BAJO DE ACUERDO AL CUADRO COMPARATIVO SIGUIENTE Y CUMPLE A CABALIDAD CON LA SOLVENCIA LEGAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS.

CONTRATISTA	IMPORTE TOTAL C/IVA.
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	\$ 1, 900,506.64
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A. DE C.V.	\$ 2,024,757.58
C. FELIPE FERNANDO DÁVILA RIVAS.	\$ 2,058,217.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ACTA DE LA SESIÓN PRIMERA ORDINARIA CELEBRADA POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

TAMBIÉN INFORMO QUE PARA ESTE TIPO DE ADJUDICACIONES NOS ENCONTRAMOS EN EL TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO SEGÚN EL ARTICULO 59, FRACCIÓN I Y QUE A LA LETRA DICE: SE PODRÁ ADJUDICAR DIRECTAMENTE CUANDO EL MONTO DEL CONTRATO NO EXCEDA OCHENTA VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE ELEVADA AL AÑO, LO ANTERIOR DA COMO RESULTADO \$ 2,536,896.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) LA FUNDAMENTACIÓN DE TODO LO ANTES DESCRITO SE ENCUENTRA CONTENIDA EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. CON RESPECTO A LAS PENAS CONVENCIONALES POR PARTE DEL "CONTRATISTA" EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y/O SERVICIOS, SE SOLICITA APLICARLE PENA CONVENCIONAL DEL 0.3% DIARIO DEL MONTO TOTAL, O BIEN OPTAR POR LA RESCISIÓN. NO SE APLICARÁN LA PENA AQUÍ SEÑALADA, CUANDO EL ATRASO SEA POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PLENAMENTE JUSTIFICADO POR "EL CONTRATISTA", DEBIENDO PRESENTAR LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE POR ESCRITO, DENTRO DEL PLAZO PREVISTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA LA ENTREGA Y ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTIME CONVENIENTE. "LA COMISIÓN" PODRÁ ACEPTAR O NO DICHA JUSTIFICACIÓN SEGÚN LO ESTIME CONVENIENTE. POR ULTIMO, COMENTO QUE DE APROBARSE LA REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS YA DESCRITAS, ES NECESARIO Y OBLIGATORIO EFECTUAR DE TRAMITE Y PAGO DE LICENCIA EN EL MUNICIPIO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS POR UN IMPORTE DE \$ 25,172.00 (VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). -----

----- ACUERDO 01-03-20 -----

SE DICTAMINA PROCEDENTE POR LOS MIEMBROS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO LA SOLICITUD, PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN ANTES ANOTADOS. (SE ANEXA DICTAMEN)-----



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ACTA DE LA SESIÓN PRIMERA ORDINARIA CELEBRADA POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN SIENDO LAS 14:20 PM, DEL MISMO DÍA DE SU FECHA, FIRMANDO AL MARGEN Y CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.--




MTRO. NÉSTOR M. ARMENDÁRIZ LOYA.
PRESIDENTE DE LA CEDH. CHIHUAHUA.



C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
PRESIDENTE DEL COMITÉ.



LIC. JAIR JESÚS ARAIZA GALARZA.
SECRETARIO TÉCNICO EJECUTIVO
VOCAL.



LIC. YULIANA ILEM RODRÍGUEZ GONZALEZ.
DIRECTORA DE CONTROL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.
VOCAL.

17 DE FEBRERO DEL 2020.

CERAM CANVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	3,45	632,47	2.182,02
PUERT 1	DESMONTAR PUERTA EXISTENTE E INSTALAR PUERTA NUEVA DE MADERA	LOTE	1,00	4.000,00	4.000,00
	SALIDA AL AUDITORIO		1,00	16.069,94	16.069,94
TEMP*9	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	M2	2,70	65,07	175,69
CERAM CANVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	2,70	632,47	1.707,87
PUERT 2	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 36*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1	9.386,58	9.386,58
CER AUD 1	QUITAR CERAMICAS EXISTENTES	PZ	30	80,00	2.400,00
CER AUD 2	COLOCACION DE CERAMICAS	PZ	30	80,00	2.400,00
	AREA DE ESCALERAS		1,00	42.995,97	42.995,97
RET TAP	RETIRO DE PAPEL TAPIZ EN PISO Y MUROS	LOTE	1,00	2.000,00	2.000,00
TERM MUR	TERMINACION DE MUROS CON CON APLANADO DE YESO	M2	82,40	45,00	3.708,00
MOD BAR	MODIFICACION DE BARANDAL	LOTE	1,00	3.800,00	3.800,00
PUERT 3	SUMINISTRO DE PUERTAS CON REJILLAS INFERIOR	PZ	2,00	4.550,00	9.100,00
PUERT 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINADA PARA EXTERIOR	PZ	1,00	4.000,00	4.000,00
SUM CERAM 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN ESCALERAS	LOTE	1,00	9500,00	9500,00
1,36	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	M2	82,40	59,32	4887,97
VENT ESC 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2.00.X 1.00 DE VIDRIO DE 6MM	PZ	1,00	6.000,00	6.000,00
	ACCESO		1,00	62.255,72	62.255,72
SUM BAR 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL PARA DISCAPACITADOS	LOTE	1,00	6.000,00	6.000,00
SUM MICR 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROPERFORADO EN COLOR DORADO	LOTE	1,00	5.530,00	5.530,00
SUM MICR 2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROPERFORADO EN COLOR ROJO	LOTE	1,00	4.841,72	4.841,72
SUM CORT 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE ACERO METALICA	LOTE	1,00	45.884,00	45.884,00
	OFICINAS COLINDANTES		1,00	7.678,00	7.678,00
AD 1	CAMBIO DE GIRO DE PUERTA (inc cambio de marco, recorte de vidrio y colocacion d	LOTE	1,00	2.438,00	2.438,00
AD 2	SUMINISTRO DE PAPEL ARENADO EN PUERTAS	LOTE	2,00	1.310,00	2.620,00
AD 3	SUMINISTRO Y COLOCAION DE PAPEL ARENADO EN VENTANAS	LOTE	2,00	1.310,00	2.620,00
	CANCELARIA		1,00	193.071,17	193.071,17
	SALA DE JUNTAS		1,00	21.043,41	21.043,41
TEMP*13	FIJO CLARO DE 98*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	6.119,95	6.119,95
TEMP*14	FIJO CLARO DE 79*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	6.272,96	6.272,96
TEMP*38	PUERTA DE 80*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	8.650,50	8.650,50
	CUBICULO 5		1,00	21.420,50	21.420,50
TEMP*37	FIJO CLARO DE 283X220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	12.770,00	12.770,00
TEMP*38	PUERTA DE 80*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	8.650,50	8.650,50
	CUBICULO 4		1,00	16.094,58	16.094,58
TEMP*15	VENTANA DE 90*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	5.708,00	5.708,00
TEMP*16	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 36*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	10.386,58	10.386,58
	CUBICULO 3		1,00	\$ 10.380,69	\$ 10.380,69
TEMP*17	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 36*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	10.380,69	10.380,69
	PASILLO		1,00	\$ 19.031,39	\$ 19.031,39
TEMP*18	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 51*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	10.380,69	10.380,69
TEMP*38	PUERTA DE 80*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	8.650,70	8.650,70
	CUBICULO 2		1,00	\$ 15.477,10	\$ 15.477,10
TEMP*22	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 165*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	15.477,10	15.477,10
	CUBICULO 1		1,00	\$ 15.477,10	\$ 15.477,10
TEMP*23	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 165*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	15.477,10	15.477,10
	REECEPCION		1,00	\$ 74.146,40	\$ 74.146,40
TEMP*20	VENTANA CORREDIZA DE 1.75*0,40 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIOS CLAROS DE 6MM	PZ	2,00	1.983,20	3.966,40
TEMP*36	VENTANAL FIJO DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 mm. 480*220 INLCUYE PUERTA D	PZ	1,00	57.080,00	57.080,00
AD ARE 1	SUMINISTRO DE PAPEL ARENADO EN PUERTAS	PZ	3,00	1.310,00	3.930,00
AD ARE 2	SUMINISTRO Y COLOCAION DE PAPEL ARENADO EN VENTANAS	PZ	7,00	1.310,00	9.170,00
	ELECTRICIDAD		1,00	\$ 130.838,55	\$ 130.838,55
SAL TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE	PZ	29,00	537,44	15.585,76

SAL ILUM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION	PZ	33,00	537,44	17.735,52
LAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA GENERAL ELECTRIC INTERIOR SUSP LED60W100-240V400K5400LM	PZ	6	2.631,79	15.790,74
LAMP SJUNT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EN SALA DE JUNTAS CONSTRULIT	PZ	1	2.631,79	2.631,79
SPOT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT INTERIOR	PZ	25	1.028,84	26.749,84
TEMP*29	SUMINISTRO DE SALIDA PARA MINISPLIT	PZ	11,00	2.436,39	26.800,29
TEMP*30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA	PZ	1,00	12.772,31	12.772,31
TEMP*30A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINISPLITS EN AREA DE AZOTEA	PZ	1,00	12.772,31	12.772,31
	VOZ Y DATOS		1,00	\$ 6.638,62	\$ 6.638,62
SAL VOZ Y DAT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELEFONIA	PZ	13,00	427,98	5.563,74
SAL TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE	PZ	2,00	537,44	1.074,88
	CCTV		1,00	\$ 2.550,27	\$ 2.550,27
TEMP*40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CCTV	PZ	3,00	850,09	2.550,27
	CLIMAS		1,00	\$ 213.296,54	\$ 213.296,54
TEMP*31	INSTALACION DE MINISPLIT EXISTENTE	PZ	2,00	6.497,04	12.994,08
TEMP*33	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TON	PZ	1,00	27.071,00	27.071,00
TEMP*32	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON	PZ	8,00	21.297,68	170.381,46
DEM 1	DEMOLICION DE PISO Y SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA CONSENSADOS	LOTE	1,00	2.850,00	2.850,00
	CARPINTERIA		1,00	\$ 70.620,00	\$ 70.620,00
TEMP*34	FABRICACION DE MUEBLE PARA RECEPCION DE MADERA DE MDF ACABADO MELANIMADO, MURO Y PLAFON DE MDF, FIJO DE ALUMINIO DE 2" CON VIDRIO DE 6MM	LOTE	1,00	70.620,00	70.620,00
	CONSTRUCCION EXTERIOR		1,00	\$ 358.321,04	\$ 358.321,04
	ALBAÑILERIAS		1,00	\$ 35.223,97	\$ 35.223,97
ALB 2	CASTILLOS DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTR	ML	9,00	420,78	3.787,02
1,28	DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 cms. CONCRETO f _c =210 kg/cm ² CERRAMIENTO EN DESPLANTE DE MUROS DE BLOCK	ML	6,00	326,85	1.961,10
MURO DE 6	MURO DE BLOCK DE 6" CON VAR. NO. 3@ 80 CM CON CONCRETO DE 150 KG/C	M2	15,90	493,60	7.848,24
1,23	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR	M3	6,99	441,60	3.086,78
061018	Firme de 10 cm. de espesor, de concreto f _c = 200 kg/cm ² acabado llana metalica, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye materiales, acerros, preparacion de la superficie, nivelacion, cimbrado colado, Mano de obra, equipo y herramienta.	M2	46,59	306,05	14.258,87
TEMP*25	MODIFICACION DE BAJADA PLUVIAL	LOTE	1,00	2.446,96	2.446,96
REG 1	REGISTRO SANITARIO EN RAMPA DE ACCESO	PZA	1,00	1.835,00	1.835,00
	ACABADOS		1,00	\$ 306.346,26	\$ 306.346,26
1.33-1	APLANADO A BASE ENJARRE ACABADO FIJO	M2	27,30	178,78	4.880,69
CANTERA 40" X 40"	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA DE 40"X40 COLOR PIÑON	M2	27,30	737,32	20.128,84
TEMP*24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL	M2	64,62	1.606,02	103.781,01
PUERT 5	PUERTA DE SERVICIO PARA CUARTO ELECTRICO	PZ	1,00	5550,00	5.550,00
REJ 1	REJAS GRANDES 1.2 *1.5 M	PZ	2,00	3240,00	6.480,00
REJ 2	REJAS PEQUEÑAS .3* .8M	PZ	1,00	650,00	650,00
MURO DUROCK	MUROS DE DURÓCK 2 CARAS	M2	6,60	789,77	5.212,48
1,36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA	M2	132,00	59,32	7.830,24
TEMP*35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUCUBOND	LOTE	1,00	151833,00	151833,00
	LIMPIEZA		1,00	\$ 16.750,81	\$ 16.750,81
LIMP GRUESA	LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA	M2	130,10	43,26	5.628,13
RET ESCOMBRO	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA OBRA	VIAJES	6,00	1.853,78	11.122,68
	OFICINAS AREA DE CALDERA		1,00	249.638,09	\$ 249.638,09
	PRELIMINARES		1,00	55.266,93	55.266,93
	INTERIOR		1,00	28.029,02	28.029,02
1,21	TRAZO Y NIVELACION	M2	47,30	15,09	713,76
TEMP*3	DESMONTAR Y DESCONEXION DE SISTEMA ELECTRICO	LOTE	1,00	4.872,78	4.872,78
TEMP*12	QUITAR VENTANA	PZ	1,00	974,56	974,56
TEMP*19	DESMANTELIAMIENTO DE CALDERA	LOTE	1,00	12.977,13	12.977,13
TEMP*002	DEMOLICION DE MUROS DE MUROS DE TABLAROCA	M2	17,25	162,66	2.805,89
TEMP*27	RETIRO DE MINISPLIT	PZ	2,00	974,56	1.949,12

TEMP*4	DESMONTAR REJAS METALICAS	PZ	2,00	649,70	1.299,40
TEMP*6	DESMONTAR TECHUMBRE	PZ	1,00	2.436,39	2.436,39
	MUROS, DALAS Y CASTILLOS	1,00		27.237,91	27.237,91
cas K3	CASTILLO K2 DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 cms. CON CONCRETO FC 200 KG/CM2	ML	10	307,85	3.078,50
MURO DE 6	MURO DE BLOCK DE 15-20-40	M2	12	388,00	4.656,00
LOSA CARC	LOSA DE CONCRETO DE CONCRETO	M2	15,9	1.078,12	17.142,11
DALA CER 20-1	DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 cms. CONCRETO fc=210 kg/cm2	ML	7,5	314,84	2.361,30
	CONSTRUCCION INTERIOR	1,00		194.371,16	194.371,16
	ACABADOS:	1,00		82.428,97	82.428,97
OBRE MURO TA	SOBREMURO DE TABLAROCA DE HOJA BLANCA	M2	28,40	284,25	8.072,70
	FALSO PLAFON DE A BASE DE CANAL LISTON Y CANALETA DE CARGAS SOPORTADA DE LA ESTRUCTURA ESPACIADA @24"	M2	29,00	278,07	8.064,03
PLAFON H VERL	MURO DUROCK MUROS DE DUROCK 2 CARAS	M2	8,40	789,77	6.634,07
AI SLANT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE R11 DE FIBRA DE VIDRIO	M2	64,80	80,34	5.206,03
REN 1	RENIVELACION DE PISOS EXISTENTES	M2	47,00	150,00	7.050,00
CERAM CANVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	47,00	632,47	29.726,09
ZOCLO 10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE CERAMICA DE 10 CM	ML	77,00	132,49	10.201,73
1,36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA	M2	126,00	59,32	7.474,32
	CANCELERIA	1,00		20.656,36	20.656,36
TEMP*16	PUERTA DE 90*24 Y FIJO LATERAL DE 36*240 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	2,00	9.388,58	18.773,16
TEMP*20	VENTANA CORREDIZA DE 1*1 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIOS CLAROS O ELECTRICIDAD	PZ	1,00	1.883,20	1.883,20
		1,00		16.002,16	16.002,16
SAL TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE	PZ	6,00	537,44	3.224,64
SAL I LUM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION	PZ	3,00	537,44	1.612,32
LAMP SJUNT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA CONSTRULITA RE8075BBCB	PZ	2,00	2.631,79	5.263,58
SPOT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT INTERIOR	PZ	1,00	1.028,84	1.028,84
TEMP*29	SUMINISTRO DE SALIDA PARA MINISPLIT	PZ	2,00	2.436,39	4.872,78
	VOZ Y DATOS	1,00		2.567,88	2.567,88
SAL VOZ Y DAT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELEFONIA	PZ	6,00	427,98	2.567,88
	CLIMAS	1,00		42.695,37	42.595,37
TEMP*32	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON	PZ	2,00	21.297,68	42.595,37
	CONSTRUCCION EXTERIOR	1,00		22.512,89	22.512,89
IMP PAPEL	IMPERMEABILIZACION A BASE DE PAPEL MINERALIZADO	M2	15,00	188,32	2.824,80
1.33-1	APLANADO A BASE DE ENJARRE ACABDO FINO	M2	18,00	178,78	3.218,04
COL DUC 1	COLOCACION DE DUCTOS PARA VENTILACION DE CALDERA	LOTE	1,00	10.500,00	10.500,00
ESC MAR	ESCALERA MARINA	LOTE	1,00	5.970,05	5.970,05
	LIMPIEZA	1,00		7.607,54	7.607,54
LIMP GRUESA	LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL POCESO DE LA OBRA	M2	47,30	43,26	2.046,20
RET ESCOMBRC	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA OBRA	VIAJE	3,00	1.853,78	5.561,34

SUBTOTAL 1.638.367,83
IVA 16% 262.138,85
TOTAL PRESUPUESTO 1.900.506,64

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO

PADRON UNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO
EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 26, 27, 28, 29 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE OTORGA EL PRESENTE CERTIFICADO QUE ACREDITA AL TITULAR ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS.

DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.
 REP. O APODERADO LEGAL: RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS ING.
 EMAIL: contacto@dicosa.com.mx
 DOMICILIO: CALLE FCO. PIMENTEL NO. 3108, FRACC.: RESID. UNIVERSIDAD, CP.: 31125, CHIHUAHUA, CHIH.
 TELEFONO: (614) 413-96-92 CÁMARA: CMIC-105263
 R.F.C.: DCC-060124-KS2 I.M.S.S.: A80-70022-10-9 INFONAVIT: A80-70022-10-9 CAPITAL CONTABLE: \$ 22,730,656.00 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: 24 DE ENERO DE 2006
 No. DE REGISTRO: PUCGE-10032 INSCRIPCIÓN: 27/09/2010 REVALIDACIÓN: 24/02/2020 MODIFICACIÓN: REEXPECIÓN: FEB-2021 VIGENCIA:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ESPECIALIDADES
111 Sa*	TANQUES	REDES DE DISTRIBUCIÓN
114 Sa*	PREFABRICADOS (PRE-POST)	TÁBLEROS
116 Sa*	ESTRUCTURAS DE CONTROL Y CASETAS	SUBESTACIÓN
118 Sa*	MUROS DE CONTENCIÓN	INSTALACIONES
121 Sa*	TECHUMBRES	AIRE ACONDICIONADO
122 Sa*	TANQUES	INTERCOMUNICACIÓN Y SONIDO
123 Sa*	PAJERÍA Y SOLDADURA	OXÍGENO, VACÍO Y AIRE COMPRIMIDO
124 Sa*	MONTAJE	SISTEMA CONTRA INCENDIO
130 G*	EDIFICACIÓN	INSTALACIONES DE GAS
151 Sa*	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	ELECTRÓNICAS
153 Sa*	ALUMBRADO PÚBLICO	ELEVADORES
154 Sa*	DRENAJES	APARTARAYOS
155 Sa*	GUARNICIONES Y BANQUETAS	AISLANTES TÉRMICOS Y ACÚSTICOS
156 Sa*	VIVEROS, PARQUES Y JARDINES	CERCAS DE MALLAS DE ALAMBRE
157 Sa*	REHABILITACIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS - RECREATIVOS	REFRIGERACIÓN
163 Sa*	CANALES Y DRENAJES (EXCAVACIÓN RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA ETC.)	ELECTROMECÁNICAS
167 Sa*	TERRACERAS PARA CAMINOS Y/O AEROPUERTOS	VOZ Y DATOS
168 Sa*	EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO	PILAS, PILOTES Y TABLAESTACAS
170 Sa*	ACARREOS	LOSAS DE CONCRETO
171 Sa*	PRODUCCIÓN DE AGREGADOS	URBANAS Y SUBURBANAS
173 Sa*	PLATAFORMAS PARA EDIFICIOS	DEMOLICIONES
175 Sa*	TERRACERAS PARA VALIDADES URBANAS Y SUBURBANAS	PLANTAS POTABILIZADORAS O DE TRATAMIENTO
176 Sa*	TERRACERAS PARA PLATAFORMAS EN EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES	DE EDIFICACIÓN
181.1 Sa*	DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINOS	RENTA DE MAQUINARIA PESADA
182.1 Sa*	DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VALIDADES URBANAS Y SUBURBANAS	INFORMÁTICA
182.4 Sa*	POR EL SISTEMA DE RIEGOS DE BELLO EN VALIDADES URBANAS Y SUBURBANAS	
183 Sa*	EN ESTACIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES	

OBSERVACIONES: REVALIDACIÓN 2020-2021

LIC. FRANCISCO BAÑER-SORRALES-MITJÁN
 REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
 LIC. PEDRO ESCOBEDO TORRES
 REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
 INC. SAUL ALFONSO FRANCO MARTINEZ
 REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
 HACIENDA

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

LUGAR DE FIRMAS Y EXHIBICIÓN: CHIHUAHUA, CHIH., 24 DE FEBRERO DE 2020
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Tels. 410-41-46 410-02-18 410-52-09 410-62-74

Fax 410-41-46
Chihuahua, Chih.

Manes

PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA POR
VIRTUD DE LA CUAL SE CONSIGNO EL ACTA
CONSTITUTIVA QUE CELEBRO "DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES CIVILES", SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE.

ESCRITURA NUMERO.- 17,868

VOLUMEN.- 557

FOLIO.- 162

CHIHUAHUA, CHIH., Marzo 29 del 2006.

*CVC.

Lic. Oviedo Baca Garcia
Notaria Pública No. 15
Venustiano Carranza No. 1511 Primer Piso
Tels. 410-41-46, 410-02-18, 410-52-09, 410-62-74
Fax. 410-41-46
Chihuahua, Chih.

VOLUMEN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

NUMERO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, a los veinticuatro días del mes de Enero del dos mil seis, ANTE MI, Licenciado OVIEDO BACA GARCIA, Notario Público Número Quince, en actual ejercicio para este Distrito Morelos, Estado de Chihuahua, comparecieron: Por una parte los señores JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ y JACOBO HERIBERTO MARQUEZ BALDERRAMA, con objeto de constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se denominará "DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES", al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES:

- I.- Manifiestan los comparecientes que han convenido en constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de acuerdo con lo que disponen los artículos 87 ochenta y siete, 89 ochenta y nueve, 90 noventa, 91 noventa y uno, 96 noventa y seis y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor.
- II.- Que para tal efecto se solicitó y obtuvo el Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores número 08000010 cero, ocho, cero, cero, cero, cero, uno, cero, Expediente número 200608000010 dos, cero, cero, seis, cero, ocho, cero, cero, cero, cero, uno, cero, que agrego al Apéndice de este Tomo del Protocolo, en el Legajo número TREINTA Y CUATRO, marcado con el número 1 uno y se insertará en el Testimonio que se expida.
- III.- Que han convenido los comparecientes en las condiciones necesarias para organizar la compañía y la constituyen al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA- La Sociedad se denominará "DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o su abreviatura S.A. de C.V.

SEGUNDA- El domicilio de esta Sociedad será en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, pudiendo establecer Agencias o Sucursales en cualquier lugar de la República Mexicana y del Extranjero, así como señalar domicilios convencionales para la ejecución de determinados actos y contratos. -----

TERCERA- El objeto de la sociedad será: -----

1).- La fabricación y montaje de todo tipo de estructuras de acero, instalación de cubiertas de lámina, proyectos y diseños de obras civiles y electromecánicas, asistencia técnica y especializada en construcciones comerciales e industriales, ejecución de todo tipo de obras civiles o industriales, movimiento de tierras, construcción de pavimentos, construcción de instalaciones hidráulicas, sanitarias y de alcantarillado, promover, construir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de Sociedades Mercantiles, Civiles, Asociaciones, o Empresas Industriales, Comerciales de Servicios o de cualquier otra índole tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración o liquidación. -----


2).- La adquisición, enajenación y en general la negociación con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título-valor permitidos por la Ley. -----

3).- La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval o cualesquier títulos o valores mobiliarios que la Ley permita. Obtener o conceder préstamos otorgando y recibiendo garantías específicas, emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros. -----

4).- Adquirir, enajenar tomar y otorgar el uso y goce por cualquier título permitido por la Ley, de bienes muebles e inmuebles. Obtener y otorgar por cualquier título, patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor y concesiones para todo tipo de actividades. -----

5).- La prestación o contratación de servicios técnicos, consultivos y de asesoría, así

Lic. Ovidio Baca García
Notaria Pública No. 15
Venustiano Carranza No. 1811 Primer Piso
Tels. 410-41-46, 410-02-18, 410-52-09, 410-62-74
Fax 410-41-46
Chihuahua, Chih.



como la celebración de los contratos y convenios para la realización de estos fines.
Girar en el ramo de comisiones, mediaciones y aceptar el desempeño de representaciones de negociaciones de toda especie.-----

6).- Realizar, supervisar o contratar por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones así como fabricar, comprar y enajenar por cualquier título, materiales de construcción. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros servicios de transporte de todo tipo, previo cumplimiento de los requisitos legales.-----

7).- La sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos de comercio a que pueda dedicarse legítimamente, en los términos de la Ley, una Sociedad Mercantil Mexicana, de acuerdo al artículo 146 ciento cuarenta y seis de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.-----

8).- La Sociedad no podrá dedicarse a la construcción de oleoductos y gasoductos sin que celebre los contratos respectivos con Petroleos Mexicanos. La Sociedad no podrá realizar actos de intermediación habitual en los mercados financieros, mediante los cuales obtenga recursos del público destinados a su colocación lucrativa, ya sea por cuenta propia o ajena.-----

9).- La adquisición, enajenación y en general la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título o valor permitido por la ley, así como la obtención de todo tipo de préstamos con o sin garantía.-----

10).- La sociedad podrá realizar toda clase de negocios y transacciones comerciales, tanto dentro de la República Mexicana o del extranjero, pudiendo adquirir bienes muebles e inmuebles, necesarios para su objeto social, asimismo arrendarlos, poseerlos y utilizarlos bajo cualquier título legal.-----

C U A R T A.- La duración de la Sociedad será de 99 noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de la constitución de la misma.-----

[Handwritten signature]

QUINTA- La Sociedad es de nacionalidad mexicana, por lo tanto ninguna persona extranjera física o moral y ningún mexicano que no lo sea por nacimiento, podrá tener participación alguna en esta sociedad. Si por algún motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir participación social, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por lo tanto, cancelada y sin ningún valor la participación de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada.

SEXTA- El capital es variable, estando constituido por un capital mínimo de \$50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, dividido en 100 cien acciones nominativas, serie "A", con un valor de \$500.00 QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, cada una, totalmente suscrito y pagado en la siguiente forma:

NOMBRE	ACCIONES	VALOR
JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ	50	\$25,000.00
JACOBO HERIBERTO MARQUEZ BALDERRAMA	50	\$25,000.00
TOTAL	100	\$50,000.00

El capital variable será ilimitado.

SEPTIMA- La Sociedad que por medio de este instrumento público constituyen los comparecientes, se regirá por los Estatutos que debidamente firmados se agregan al legajo de esta escritura, marcados con el número 2-dos, y se insertarán en el Testimonio que se expida.

OCTAVA- Los comparecientes aceptan la presente escritura en todas sus partes.

TRANSITORIOS

Lic. Ovidio Basa García
Notaria Pública No. 15
Venustiano Carranza No. 1871 Primer Piso
Tels. 410-41-46, 410-02-18, 410-52-09, 410-62-74
Fax. 410-41-46
Chihuahua, Chih.

- 3 -

I.- Los fundadores de esta Sociedad constituidos en primer Asamblea General

Ordinaria de Accionistas, acuerdan que la dirección y administración esté a cargo de un Consejo de Administración, el cual estará integrado por las siguientes personas:-

PRESIDENTE SR. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ

SECRETARIO SR. JACOBO HERIBERTO MARQUEZ BALDERRAMA

II.- Se otorga al Presidente como al Secretario para que lo ejerciten en forma conjunta o separadamente las facultades contenidas en el Artículo 7º Séptimo de los

Estatutos Sociales, por los que se entiende que se les confieren a cada uno de ellos Poder General para Pleitos y Cobranzas, para Actos de Administración y para Actos

de Dominio, sin ninguna limitación; asimismo podrán otorgar y suscribir toda clase de Títulos de Crédito, de conformidad con el Artículo 9º Noveno de la Ley General

de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

III.- Se designa como Comisario de la Sociedad al señor MAITAS MARQUEZ SAENZ.-----

IV.- El Presidente del Consejo de la Sociedad señor JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ, se da por recibido del capital social de la sociedad en dinero

efectivo, así como de las cauciones del propio Consejo de Administración y del Comisario, por lo que habiendo caucionado sus respectivos cargos, entran desde

luego al desempeño de sus respectivos cargos.-----

-----YO EL NOTARIO DOY FE Y CERTIFICO-----

I.- Que conozco a los comparecientes y los conceptuo capacitados legalmente para la celebración de este acto.-----

II.- El suscrito Notario hace constar que para los efectos del Artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación, hizo saber a los constituyentes de esta Sociedad,

que deberán obtener de la Oficina Federal de Hacienda de esta Ciudad, la inscripción de la misma en el Registro Federal de Contribuyentes, lo que justificará

con copia certificada de la solicitud y alta de inscripción que se agregarán al Legajo

Dr. Ovidio Baca Garcia

Notaria Pública No. 15
Venustiano Carranza No. 4841, Primer Piso
Tels. 410-41-46, 410-02-18, 410-52-09, 410-62-74
Fax 410-41-46
Chihuahua, Chih.

En caso de Segunda Convocatoria, la asamblea se reunirá sea cual sea el número de acciones que se representen y las resoluciones se tomarán por lo menos por acuerdo de accionistas que representen la mitad del capital social.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Los accionistas podrán representar en las asambleas, por mandatario, mediante carta poder. Presidirá las asambleas el Administrador Unico Propietario o el Presidente del Consejo de Administración, quien nombrará entre los presentes, a dos personas para que funjan como Escrutadores y levanten la lista de asistencia, haciendo constar el nombre del asistente, la representen, certificando en su caso, si hay o no quórum para declarar instalada la Asamblea.

La lista de asistencia deberá ser firmada por los asistentes y los escrutadores. Si los escrutadores certifican que hay quórum, el Presidente declarará abierta la sesión pasándose el desahogo de los puntos contenidos en la Orden del Día.

El acta de la Asamblea deberá ser firmada por el Presidente y los Escrutadores y se formará un expediente en el que se agregaran los ejemplares en los que hayan aparecido las convocatorias, las listas de asistentes, los documentos justificando la personalidad de los comparecientes, su calidad de socio, el número de acciones que representen y cualquier otro documento relacionado con la Asamblea, como informe del Administrador Unico Propietario o del Consejo de Administración, dictamen de los Comisarios, etcétera.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Si en una Asamblea se reúne el cien por ciento del capital social, esta podrá realizarse sin necesidad de convocatoria previa, pudiendo discutir cualquier punto que la propia Asamblea señale.

CAPITULO SEXTO:

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. En caso de disolución de la Sociedad anticipada o no, por cualquiera de los supuestos previstos en el Artículo 229 doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas nombrarán un Liquidador, quien deberá de practicar la liquidación de la sociedad, de acuerdo con las instrucciones que la Asamblea de Accionistas le confiera y las señale la Ley de la Materia.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. Durante la liquidación y respecto al liquidador, los Comisarios desempeñarán las mismas facultades que en la vista normal de la Sociedad desempeñen en relación con el Administrador Unico Propietario o con el Consejo de Administración.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Durante la liquidación, las Asambleas Generales de Accionistas se reunirán bajo los mismos términos y condiciones

asamblea designe o a falta de designación por el Administrador Único Propietario, por el Consejo de Administración o por su Presidente.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Las Asambleas Generales de Accionistas con Ordinarias o Extraordinarias. Las Asambleas Generales de Accionistas deberán celebrarse en el domicilio social, y sin este requisito serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Son Asambleas Ordinarias las que se reúnan para tratar de cualquier asunto, que no sea dentro de los expresamente reservados a las Asambleas Extraordinarias de Accionistas.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Las Asambleas Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social y se encargaran además de los asuntos incluidos en el Orden del Día de aquellos a que se refiere el Artículo 181 ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Las Asambleas Extraordinarias serán las que se reúnan en las condiciones y para tratar los asuntos a que se refiere el Artículo 182 ciento ochenta y dos del Ordenamiento antes citado.

ARTICULO DECIMO NOVENO.- La convocatoria para las Asambleas deberá ser formulada por el Administrador Único Propietario, por el Consejo de Administración, por el Comisario, o por las personas a que se refieren los artículos 178 ciento setenta y ocho, 184 ciento ochenta y cuatro y 185 ciento ochenta y cinco de la Ley de la Materia. La convocatoria deberá hacerse por medio de una publicación que se efectúe en el Periódico Oficial del Estado, o en alguno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social, con una anticipación mínima de diez días antes de la fecha de su celebración. Durante este tiempo, los libros y documentos relacionados con el objeto de la Asamblea, deberán estar en las Oficinas de la negociación a disposición de los accionistas que quieran consultarlos, para que puedan enterarse de ellos.

La convocatoria para las asambleas deberá contener la Orden del Día y estar firmada por quien lo haga.

ARTICULO VIGESIMO.- Para que una Asamblea Ordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida, deberá estar representada por lo menos la mitad del capital social y las resoluciones serán válidas cuando así lo acuerde la mayoría de los votos presentes.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Para que una asamblea Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida, deberán estar representadas por lo menos tres cuartas partes del capital social y las resoluciones serán válidas cuando así lo acuerden por lo menos los votos que representen a la mitad más uno del capital social.

Lic. Oreste Baca Garcia

Notaria Pública No. 15
Venustiano Carranza No. 1811 Primer Piso
Tels. 410-41-46, 410-02-12, 410-52-09, 410-62-74
Fax 410-41-46



Lic. Oreste Baca Garcia
Notario Público

elegidos anualmente por la Asamblea Ordinaria de Accionistas y facultades que les confiere la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ARTICULO DECIMO. Los comisarios duraran en su encargo un año pudiendo ser reelectos y continuaran en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fueron designados, si los nombrados no toman posesion de sus cargos.

CAPITULO CUARTO:
DEL BALANCE

ARTICULO DECIMO PRIMERO. El ejercicio social durara un año computado del dia primero de enero al treinta y uno de diciembre. La sociedad, a la fecha del cierre del ejercicio, treinta y uno de diciembre del año que corresponda, practicara un Balance para mostrar claramente el estado economico de la sociedad.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. De las utilidades que se obtengan se separara el cinco por ciento como minimo para formar el fondo de Reserva hasta que este importe sea la quinta parte del capital social.

Cuando por cualquier motivo este fondo de Reserva disminuya a una suma menor a la quinta parte del capital social, debera ser reconstituido en la forma anteriormente establecida.

ARTICULO DECIMO TERCERO. El Balance debera quedar concluido dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social y debera ser entregado por el Administrador unico o por el Consejo de Administracion al Comisario Proprietario, o Suplente en su caso, por lo menos un mes antes de la fecha que se fija para la Asamblea Ordinaria de Accionistas, junto con los documentos justificativos y un informe general sobre la marcha de los negocios sociales. El Comisario dentro de los quince dias siguientes a la fecha en que reciba el Balance y sus anexos debera formular un dictamen con las observaciones propuestas que considere pertinentes.

CAPITULO QUINTO:
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.

ARTICULO DECIMO CUARTO. La Asamblea General de Accionistas es el Organó Supremo de la Sociedad, podra acordar y ratificar todos los actos y operaciones de esta y sus resoluciones seran cumplidas por la persona que la propia

Handwritten signature and stamp on the right margin.

juntas de trabajo, tanto Federales como Locales y para celebrar convenios de orden laboral.

En consecuencia de estos cuatro incisos, se otorga al Administrador Unico Propietario y en su caso, al Consejo de Administración, un Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Acto de Dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, de acuerdo con el artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil para el Estado de Chihuahua y su correlativo el Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, que a la letra dice:

ARTICULO 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderles. Cuando se quisieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertaran este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.

e).- Nombrar un consejero o Delegado, que sera quien ejecute los acuerdos del Consejo, excepto en los casos en que el propio Consejo nombre a otras personas para realizarlo.

f).- Nombrar apoderados generales o especiales, confiriendoles la suma de facultades que estimen necesaria o convenientes para el mas eficaz manejo de su mandato, pudiendo revocar estos poderes cuando lo juzguen conveniente.

g).- Confiar la Administración directa de la sociedad a un Gerente General, con las facultades que el propio Consejo o Administrador Unico Propietario le señale.

ARTICULO OCTAVO.- El presidente del consejo de Administración, quedara investido con todas las facultades y poderes que en el Artículo anterior se otorgo al propio Consejo de Administración.

CAPITULO TERCERO:

DEL COMISARIO.

ARTICULO NOVENO.- La vigilancia de las operaciones sociales queda encomendada a un Comisario propietario y su respectivo suplente, los cuales serán

Lic. Oriedo Baca Garcia

Notaria Pública No. 15
Venustiano Carranza No. 1811, Primer Piso
Tels. 410-41-46, 410-02-18, 410-52-09, 410-62-74
Fax 410-41-46
Chihuahua, Chih.

Lic. Oriedo Baca Garcia

compuesto de tres o más miembros, que podrán ser o no accionistas, a elección de la Asamblea Ordinaria de Accionistas a mayoría de votos y duraran en su cargo por tiempo indefinido, pudiendo ser reelectos, pero continuaran en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados, en tanto no se hagan nuevos nombramientos, o él, o los nombrados tomen posesión de sus cargos.

Al elegirse el consejo de Administración, queda expresamente pactado que el nombrado en primer lugar, será el Presidente del Consejo y los demás vocales.

ARTICULO SEXTO. - El Administrador Unico Propietario o el Consejo de Administración, es el órgano de la representación genuina de la Sociedad, teniendo a su cargo, cuidar del exacto cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y vigilar las operaciones sociales, tomando las medidas que juzgue convenientes para el mejor desarrollo de los objetos y fines de la Sociedad.

ARTICULO SEPTIMO. - Se confiere al Administrador Unico Propietario y en su caso al Consejo de Administración, el poder mas amplio, no teniendo en sus facultades mas limite que el ejercicio de aquellas facultades que la Ley o estos Estatutos reservan expresamente a las Asambleas Generales de Accionistas. Sin embargo, en forma enunciativa, pero no limitativa, se les señalan las siguientes facultades:

- a).- El Administrador Unico Propietario o el Consejo de Administración, estaran facultados para tomar los acuerdos tendientes a aumentar o disminuir el capital social en los terminos del Artículo Cuarto de estos Estatutos; pudiendo así mismo establecer las bases, formalidades y requisitos mediante los cuales se haran efectivos dichos aumentos o disminuciones.
- b).- En el orden administrativo, de las que sean necesarias para llevar a cabo las operaciones, actos y contratos relacionados con el objeto de la Sociedad, inclusive la de contratar préstamos y otorgar y suscribir títulos de crédito en los terminos del Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito.
- c).- En lo que mira ejercitar actos de dominio, respecto del activo fijo de la empresa y de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, en sus derechos reales y personales tambien se le apodera ampliamente.
- d).- En lo que toca a la representación jurídica ante toda clase de autoridades y en toda clase de negocios, se apodera al Administrador Unico Propietario o al Consejo de Administración, para que ejerciten todas las facultades generales inherentes al mandato para pleitos y cobranzas, y aun las especiales que requieran cláusula especial, conforme a la Ley.

En materia laboral, se le faculta ampliamente en los terminos de los articulos 9 nueve, 11 once, 692 seiscientos noventa y dos, fracciones II dos y III tres, 786 setecientos ochenta y seis, 787 setecientos ochenta y siete y 876 ochocientos setenta y seis, de la Ley Federal del Trabajo, para representar a la Sociedad.

- b).- El capital social, no podrá reducirse a menos del mínimo establecido en la Clausula Sexta del Contrato Social.
- c).- La Asamblea o el Organó de Administración que acuerde la disminución del capital variable, fijarán las condiciones en que esta se llevara a cabo, aparte de las que se establecen en el siguiente inciso.
- d).- Todas las reducciones se harán por acciones íntegras y de acuerdo con lo establecido en los siguientes párrafos.
- 1.- Tan pronto como se decrete una reducción, la resolución deberá notificarse a cada uno de los accionistas, concediéndoles el derecho para amortizar sus acciones, en proporción a la disminución del capital decretada; tal derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes al recibo de la notificación.
 - 2.- Si dentro del término establecido, hubiere peticiones de reembolso por un número de acciones que comprendan el capital que va a reducirse, se reembolsará a los accionistas que lo soliciten, en la fecha que se hubiere determinado.
 - 3.- Si las solicitudes de reembolso excedieren del capital amortizable, el monto de la reducción se distribuirá para su amortización entre los solicitantes, en proporción al número de acciones que cada uno haya ofrecido para su amortización y se procederá al reembolso en la fecha que se hubiere determinado.
 - 4.- Si las solicitudes hechas no completaren el número de acciones que deban ser amortizadas, se reembolsaran las acciones de los accionistas que así lo solicitaren y se designara por sorteo, ante Notario o Corredor Titulado, el resto de las acciones que deban amortizarse, hasta completar el monto en que se haya acordado la disminución del capital social.
- En este último caso, las amortizaciones surtirán efecto hasta el fin del ejercicio que está corriendo; si el sorteo se hubiere efectuado antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere en el curso del último trimestre. Las variaciones del capital deberán ser anotadas en el Libro de Registro que para el efecto lleve la Sociedad.
- Los accionistas en todo caso, tendrán siempre preferencia para acciones, conforme el artículo 132 ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.


CAPITULO SEGUNDO:

DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO QUINTO.- La sociedad será administrada por un Administrador Único Propietario, con su respectivo Suplente, o por un Consejo de Administración.

Lic. Orindo Baca Garcia

Notaria Pública No. 15
Venustiano Carranza No. 1811 - Primer Piso
Tels. 410-41-46, 410-02-18, 410-52-09, 410-62-74
Fax 410-41-46
Chihuahua, Chih.



ESTATUTOS

- 5 -

CAPITULO PRIMERO:

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.

ARTICULO PRIMERO - El capital social es variable y su máximo será ilimitado. Por encima del límite mínimo, el capital será variable, aumentado o disminuyendo por acuerdo de la Asamblea o del Organó Administrativo, según las reglas contenidas en estos Estatutos.

Las cifras del capital mínimo y en su caso las del capital variable estarán representadas por acciones nominativas.

ARTICULO SEGUNDO - Los fundadores no se reservan participación especial alguna en las utilidades de la sociedad.

ARTICULO TERCERO - Las acciones en que se divide el capital social estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de los socios, podrán amparar una o varias acciones y llevarán adheridos los cupones correspondientes, estos últimos que podrán ser al portador.

Los títulos que amparen dichas acciones estarán firmados por el Administrador único o por dos Consejeros en representación del Consejo de Administración. llenarán los requisitos que señala el Artículo 126 ciento veintiseis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y llevarán impresa la Clausula Quinta de la Escritura Constitutiva.

ARTICULO CUARTO - La Asamblea General o el Organó de Administración podrá acordar los aumentos o disminuciones del capital variable, por el ingreso de nuevos accionistas, aportaciones de los mismos accionistas, o bien por retiro parcial o total de las aportaciones de los accionistas.

Las variaciones del capital se regirán por las siguientes disposiciones:

a) - La misma Asamblea o el Organó de Administración que acuerde el aumento del capital, resolverá sobre la forma y términos en que dicho aumento deba ser suscrito y pagado, pero ningún nuevo aumento podrá decretarse antes de que sea pagado, pero ningún nuevo aumento podrá decretarse antes de que sea pagado íntegramente el aumento anterior. Igualmente se podrá fijar un capital autorizado en cuyo caso el Organó de Administración tendrá facultades para colocar las acciones representativas de dicho capital en el mercado, respetando siempre el derecho preferente de los accionistas, incluso podrá colocar las acciones a su discreción, en



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE SOCIEDADES

PERMISO

PERMISO
EXPEDIENTE
FOLIO

08000010
200608000010
1Y041P11

En atención a la solicitud presentada por el (la) C. JOSE CARLOS CONTRERAS VILLARREAL esta Secretaría concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la denominación

DISENOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

Este permiso quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

El interesado deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

NOTARIO
CHIH.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de la Ley Orgánica de L. Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

CHIHUAHUA, CHIH., a 06 de enero de 2006

EL SUBDELEGADO

OLIVIA J. BANUELOS GUADERRAMA

11

Lic. Oviedo Baca Garcia
Notaria Pública No. 15
Venustiano Carranza No. 1811 Primer Piso
Tels. 410-41-46, 410-02-18, 410-52-09, 410-62-74
Fax. 410-41-46
Chihuahua, Chih.



AUTORIZO y firmo definitivamente la anterior escritura pública número 17.868 diecisiete mil ochocientos sesenta y ocho, en la Ciudad de Chihuahua, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil seis, en virtud de haberse cumplimentado con todos los requisitos legales y fiscales correspondientes. Agrego al Apéndice de este Tomo del Protocolo en el Legajo número TREINTA Y CUATRO, marcados con los números 5 cinco y 6 seis, Declaración Notarial y Certificado de Ingreso de la Recaudación de Rentas Local, respectivamente. - DOY

FE-----

FIRMADO: O. BACA G. - RUBRICA-----

SELLO: El Escudo Nacional - Estados Unidos Mexicanos - Lic. Oviedo Baca Garcia - Notario Público No. 15 - Chihuahua, Chih.-----

17868

de esta escritura, marcadas con los números 3 tres y 4 cuatro y se insertarán en el Testimonio que se expida.-----

III.- POR SUS GENERALES los comparecientes manifestaron bajo protesta de decir verdad: El señor JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ, con fecha de nacimiento el día veintiocho de octubre de mil novecientos setenta y nueve, soltero, Ingeniero Civil, originario y vecino de esta Ciudad, con domicilio en Calle Ocotillos número tres mil seiscientos cincuenta y tres, Fraccionamiento Jardines de San Francisco, siendo su Registro Federal de Contribuyentes ROHL-791028 R7A setecientos noventa y un mil veintiocho; el señor JACOBO HERIBERTO MARQUEZ BALDERRAMA, con fecha de nacimiento el día quince de octubre de mil novecientos setenta y ocho, soltero, Ingeniero Civil, soltero, originario y vecino de esta Ciudad, con domicilio en la Calle Medicina número setecientos del Fraccionamiento Universidad, siendo su Registro Federal de Contribuyentes MABI-78115 SC3 setecientos ochenta y un mil quince, siendo mexicanos por nacimiento e hijos de padres mexicanos y en cuanto al pago del Impuesto sobre la Renta, manifestaron que lo pagan y se encuentran al corriente sin justificarlo en este acto; haciéndoles saber las sanciones en que incurrir quienes se conducen con falsedad en declaraciones fiscales.-----

IV.- Que lo inserto y relacionado en la presente escritura concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista.-----

L E I D O que fue todo lo anterior por los comparecientes, bien impuestos del alcance y fuerza legal de la presente escritura, estuvieron conformes con su tenor, la ratificaron y firmaron en unión del Notario autorizante, el día de su otorgamiento.---

FIRMADO:- J. L. R.- JACOBO MARQUEZ B.- O. BACA G.- RUBRICAS.-----

SELLO:- El Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Lic. Oviedo Baca García.- Notario Público No. 15-Chihuahua, Chih.-----



BOLETA DE INSCRIPCION

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. **22807 * 10**

Control Interno Fecha de Prelación
4 * 06 / ABRIL / 2006

Antecedentes Registrales:

Denominación:
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Afectaciones al:		Fecha	
Folio: ID	Acto	Registro	Registro
22807 10	M4 Constitución de sociedad	06-04-2006	1

Derechos de Inscripción:

Fecha	03 ABRIL	2006
Importe	\$1,140.00	
Siendo	\$.00	

Boleta de Pago No. 22398366

REGISTRADOR ADSCRITO AL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS

[Handwritten Signature]
LUZ MARIA BALDERRAMA RODRIGUEZ



CHIHUAHUA CERTIFICADO DE INGRESO 1970977 E
 DIRECCION DE REGISTRO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 29/03/2006 12:03 PM CAJA 3 OPERACION 980 *1370075* Pag 1/1

REGISTRO PUBLICO CANTIDAD "6"
 CONTRIBUYENTE: NOTARIA 15
 IMPUESTO SOBRE ACTOS JURIDICOS 75.00
 IMPUESTO UNIVERSITARIO 3.00


36 (SON SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
 "PORTE EL CONTORN DE SEGURIDAD"
 CONTRIBUYENTE

SUBTOTAL \$ 78.00
 TOTAL \$ 78.00

SE EXPIDE PRIMER TESTIMONIO PARA USO DE "DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONSTA DE CATORCE HOJAS UTILES, DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS Y RUBRICADAS Y SE AUTORIZA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL SEIS. DOY FE.

EL NOTARIO NUMERO QUINCE

[Handwritten Signature]
 LIC. OVELDO BACA GARCIA



Lic. Oviedo Baca Garcia

Notaria Pública No. 15
Venustiano Carranza No. 1811 Primer Piso
Tels. 410-41-46, 410-02-18, 410-52-09, 410-62-74
Fax 410-41-46
Chihuahua, Chih.

Lic. Oviedo Baca Garcia
Notario Público No. 15

DECLARACION NOTARIAL
IMPUESTO SOBRE ACTOS JURIDICOS

BSFA 61501

C. RECAUDADOR DE RENTAS EN CHIHUAHUA, CHIH. DIA 27 MES MARZO DEL 2006

HAGO DE MI CONOCIMIENTO QUE ANTE MI SE OTORGO LA ESCRITURA CUYOS DATOS SON:

ESCRITURA NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE FIRMA	
17,868	24 DE ENERO DEL 2006	24 DE ENERO DEL 2006	557

ACTOS JURIDICOS QUE CONTIENE

CONSTITUCION DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., CON CAPITAL SOCIAL DE \$50,000.00 M.N. CON CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS CONFIA DA A UN CONSEJO DE ADMINISTRACION COMPUESTO POR UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO.

OTORGANTE(S)

APELLIDO PATERNO	MATERNO	NOMBRE(S)	CARACTER DEL OTORGANTE EN EL ACTO
RODRIGUEZ	HERNANDEZ	JOSE LUIS	PRESIDENTE
MARQUEZ	BALDERRAMA	JACOBO HERIBERTO	SECRETARIO

DATOS DEL NOTARIO

APELLIDO PATERNO	MATERNO	NOMBRE(S)
BACA	GARCIA	LIC. OVIEDO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
BAGO-291229AP9		
No. DE NOTARIA QUINCE		
DISTRITO JUDICIAL		
MORFOS		



[Handwritten Signature]
FIRMA

OPERACION EXENTA Y PRECEPTO LEGAL QUE LA ESTABLECE

PRECEPTO LEGAL QUE ESTABLECE EL PAGO DEL IMPUESTO

ART. 305 FRACCION I DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ADEUDOS ANTERIORES

PREDIAL	OTROS
\$	



CVC

FIRMA DEL CAJERO/RECIPIENTE

IMP. SOBRE ACTOS JURIDICOS

IMP. UNIV.

TOTAL

LIQUIDACION

\$75.00

3.00

\$78.00

IMPRESION DE LA MAQUINA REGISTRADORA

si cuando no se cuenta con esta, número de folio del certificado de ingresos DCF 154-0;




Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO, Dirección General de Finanzas y Administración

EL C. LICENCIADO OVIEDO BACA GARCIA, NOTARIO PUBLICO
NUMERO QUINCE EN ACTUAL EJERCICIO PARA EL MUNICIPIO
MOCTEZUMA ESTADO DE CHIHUAHUA, CERTIFICA
QUE LA PRESENTE COPIA CONCORDA EXACTAMENTE CON SU
ORIGINAL SEGUN EL COTIZACION QUE SE LE
SE ENTREGA EN EL PRESENTE
PARTI INTERESADO Y AUTORIZADO EN LA CIUDAD
DE CHIHUAHUA, A LOS *siete* DIAS DEL MES DE
Febrero DEL *2006* DOY FE

EL NOTARIO NUMERO QUINCE
LIC. OVIEDO BACA GARCIA



Lic. Ordo Baca Garcia

Notaria Pública No. 15
Venustiano Carranza No. 1811 - Primer Piso
Tels. 410-41-46, 410-02-18, 410-52-09, 410-62-74
Fax 410-41-46
Chihuahua, Chih.

LIC. ORDO BACA GARCIA
Notario Público No. 15
Chihuahua, Chih.

SAT
Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE PER. FED. DE CONTRIBUYENTE
DCC060124KS2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

FDUO **F 5476642**

CHIH-07/02/2006-F 3faAEg4pxwt

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C. RFC-1

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO, CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

DOMICILIO **PIMENTEL 3108 UNIVERSIDAD RESIDENCIAL INGENIERIA Y MEDICINA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CP-31125**

CLAVE DEL R.F.C. **DCC060124KS2**

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN **CHIHUAHUA**

ACTIVIDAD **EDIFICACION**

SITUACIÓN DE REGISTRO **ACTIVO**

FECHA DE INSCRIPCIÓN **2006/02/07** FECHA DE RAZO DE OPERACIONES **2006/01/24**

OBLIGACIONES

CL	DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
17	IMPAC Es sujeto del impuesto al activo.	2006/01/24
17	RETENCIÓN Salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral.	2006/01/24
16	RETENCIÓN Prestación de servicios profesionales.	2006/01/24
16	RETENCIÓN Arrendamiento y, en general por otorgar el uso o goce de un inmueble.	2006/01/24
200	Sociedad mercantil u otra persona moral.	2006/01/24
VS	IVA por los actos o actividades que realicen causa este impuesto.	2006/01/24
VS	IVA Es Retenedor de este impuesto.	2006/01/24

TRÁMITES EFECTUADOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	FDUO DEL TRÁMITE
INSCRIPCIÓN PERSONA MORAL	2006/02/07	3625347

CHIHUAHUA, CHIH. A 27 DE FEBRERO DE 2006
TELÉFONO DE ATENCIÓN CIUDADANA
(QUEJAS Y SUGERENCIAS) 01-800-728-2000.



ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACION
CHIHUAHUA

00184602499097

LIC. JORGE CORDOVA CHAVEZ

EL LICENCIADO OVIEDO DACA GARCIA, NOTARIO PUBLICO
NUMERO QUINCE EN ACTUAL FUNCION PARA EL ESTADO
MOROS EN EL ESTADO DE GUERRERO, DE QUIEN
QUE LA PRESENTE COMO CRUCIADA FIDUCIARIA
CRUCIADA, SUPLEN EL CERTIFICADO QUE SE
SE HUBIERA EN PRESENCIA DE LA COMISION
DE NOTARIOS EN EL ESTADO DE GUERRERO
DE GUERRERO, EN EL DIA SIETE
febrero DEL 2006 - D.O.F.

EL NOTARIO NUMERO QUINCE
LIC. OVIEDO DACA GARCIA



Notaria Pública No. 15
Venustiano Carranza No. 1811 - Primer Piso
Tels. 410-41-46, 410-02-18, 410-52-09, 410-62-74
Fax 410-41-46
Chihuahua, Chih.

LIC. ORNELA ROSA GARCÍA
Notaria Pública No. 15
Chihuahua, Chih.

3

2.2 RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SI MARCO CON "X" ALGUN CAMPO DEL APARTADO 2.1, NO DEBERÁ HACER ANOTACIÓN ALGUNA EN ESTE APARTADO. EN CASO CONTRARIO, DEBERÁ MARCAR CON "X" EL CAMPO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO CON EL TIPO DE PERSONA MORAL DE QUE SE TRATE, INDICANDO UNA SOLA OPCIÓN.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> a1 ASOCIACIÓN RELIGIOSA | <input type="checkbox"/> i1 FIDEICOMISO NO EMPRESARIAL |
| <input type="checkbox"/> b1 SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO | <input type="checkbox"/> j1 PARTIDO O ASOCIACIÓN POLÍTICA LEGALMENTE RECONOCIDA |
| <input type="checkbox"/> c1 MUNICIPIO O SU ÓRGANO DESCONCENTRADO | <input type="checkbox"/> k1 SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO |
| <input type="checkbox"/> d1 ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO | <input type="checkbox"/> l1 SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE |
| <input type="checkbox"/> e1 DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA FEDERACIÓN O SU ÓRGANO DESCONCENTRADO | <input type="checkbox"/> m1 SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA |
| <input type="checkbox"/> f1 DEPENDENCIA O ENTIDAD DE ESTADO DE LA REPÚBLICA O DISTRITO FEDERAL O SU ÓRGANO DESCONCENTRADO | <input type="checkbox"/> n1 SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO |
| INDIQUE LA ENTIDAD FEDERATIVA | <input type="checkbox"/> o1 ASOCIACIÓN U ORGANISMO QUE AGRUPE A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRÉDITO |
| <input type="checkbox"/> g1 ORGANISMO DESCENTRALIZADO, FONDO O FIDEICOMISO PÚBLICO O EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | <input type="checkbox"/> p1 SOCIEDAD CAPITALISTA QUE NO OPERE CON TERCEROS, SIEMPRE QUE NO REALICE GASTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE NEGOCIOS |
| INDIQUE LA ENTIDAD FEDERATIVA | <input type="checkbox"/> q1 EMBAJADA, CONSULADO U ORGANISMO INTERNACIONAL |
| <input type="checkbox"/> h1 ORGANISMO DESCENTRALIZADO, FONDO O FIDEICOMISO PÚBLICO O EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DE LA FEDERACIÓN | <input type="checkbox"/> r1 OTRA INSTITUCIÓN, PARTICIPACIÓN, ORGANISMO, SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL COMPRENDIDA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DEL ISR, NO ESPECIFICADA EN CAMPOS ANTERIORES |

RETENCIONES DE ISR

MARQUE CON "X" EL(LOS) CONCEPTO(S) QUE PAGA PARA LA REALIZACIÓN DE SUS OPERACIONES:

- SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL
- INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS (Ver instrucciones)
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
- ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES A PERSONAS FÍSICAS
- INTERESES (Folio IV, Capítulo VI de la Ley del ISR)

PREMIOS POR LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS DE APUESTAS Y CONCURSOS

OTROS INGRESOS A PERSONAS FÍSICAS (Folio IV, Capítulo IX de la Ley del ISR)

A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS

ADQUISICIONES COMPROBADAS MEDIANTE AUTOFACTURACIÓN (Ver instrucciones)

REALIZA PAGOS COMPROBADOS MEDIANTE AUTOFACTURACIÓN POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

IMPUESTO AL ACTIVO

4.1 MARQUE CON "X" SI ES:

- SUJETO GRAVADO DEL IMPUESTO AL ACTIVO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

5.1 MARQUE CON "X" SI:

- POR LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE REALIZA CAUSA ESTE IMPUESTO

5.2 MARQUE CON "X" SI:

- ES RETENEDOR DE ESTE IMPUESTO

OTROS

6 MARQUE CON "X" SI:

ES RESIDENTE EN EL EXTRANJERO CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN MÉXICO

REALIZA ACTIVIDADES EMPRESARIALES A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS

PAGA FINANCIAMIENTOS OTORGADOS POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

ES ENTIDAD O EMPRESA EXENTA DEL PAGO DEL ISR POR CONVENIO O TRATADO INTERNACIONAL PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN

OBTIENE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

CUMPLE POR CUENTA DE TERCEROS CON LAS OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS DE OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EMPRESAS MULTINACIONALES)

- 11 -
Lic. Ordo Baca Garcia

Notaria Pública No. 15
Venustiano Carranza No. 1811, Primer Piso.
Tels: 410-41-46, 410-02-18, 410-52-09, 410-62-74.
Fax 410-41-46
Chihuahua, Chih.

FO. 00 CERTIFICACION DEL
CLF SER FCB EL R-1 GR-2



REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL Y DEL
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Lic. Ordo Baca Garcia
Notario Público
Cl. 1000

ANTES DE INICIAR EL LLENADO DE ESTE
FORMULARIO, LEA LAS INSTRUCCIONES.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(Solo en caso de aumento de obligaciones)

DATOS DEL CONTRIBUYENTE (Solo en caso de inscripción)

1 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A DE C.V.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Solo en caso de inscripción)

2.1 PERSONAS MORALES: RÉGIMEN GENERAL

MARQUE CON "X" EL TIPO DE PERSONA MORAL DE QUE SE TRATE, INDICANDO UNA SOLA OPCIÓN:

- | SECTOR FINANCIERO | | SECTOR PÚBLICO | |
|-------------------|---|----------------|--|
| a | INSTITUCIÓN DE CRÉDITO | 1 | ORGANISMO DESCENTRALIZADO, FONDO O FIDEICOMISO PÚBLICO O EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DE LA FEDERACIÓN, CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL |
| b | INSTITUCIÓN PARA EL DEPOSITO DE VALORES | 4 | ORGANISMO DESCENTRALIZADO, FONDO O FIDEICOMISO PÚBLICO O EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, INCLUYE LA ENTIDAD FEDERATIVA |
| c | INSTITUCIÓN DE SEGUROS | 5 | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO, CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL |
| d | INSTITUCIÓN DE FIANZAS | | |
| e | SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL | | SECTORES DIVERSOS |
| f | SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO | 6 | RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE REALICE ACTIVIDADES EMPRESARIALES A TRAVÉS DE UN FIDEICOMISO |
| g | ALMACÉN GENERAL DE DEPOSITO | 7 | LÍNEA AEREA EXTRANJERA, CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS |
| h | ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO | 8 | LÍNEA NAVIERA EXTRANJERA, CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS |
| i | ARRENDADORA FINANCIERA | 9 | ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN |
| j | UNIÓN DE CRÉDITO | 10 | FIDEICOMISO CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL |
| k | SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR | 11 | FIDEICOMISO CUYA ÚNICA ACTIVIDAD SEA LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE INMUEBLES |
| l | OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN | 12 | SOCIEDAD MERCANTIL, U OTRA PERSONA MORAL NO ESPECIFICADA EN CAMPOS ANTERIORES |
| m | EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO | 13 | X |
| n | BOLSA DE VALORES | | |
| o | CASA DE BOLSA | | |
| p | CASA DE CAMBIO | | |
| q | SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO | | |
| r | SOCIEDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO | | |
| s | ORGANIZACIÓN, INSTITUCIÓN, ENTIDAD, O INTERMEDIARIO FINANCIERO, DISTINTO A LOS SEÑALADOS EN CAMPOS ANTERIORES | | |

DECLARO BAJO PROTESTA DE PERJURIO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE ANEXO SON CIERTOS.

JACOBO MARQUEZ B.

ESTE DOCUMENTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL
ARTÍCULO 147 DEL C.O.F.I.R. Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE PERJURIO
QUE EL MERCANTIL CON EL QUE SE OFERTAN O LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO
SE PRESENTA POR DUPLICADO.

Lic. Ornelo Baca Garcia

Notaria Publica No. 15
Venustiano Carranza No. 1811 Primer Piso
Tels. 410-41-46, 410-02-18, 410-52-09, 410-62-74
Fax 410-41-46
Chihuahua, Chih.

3
6

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MABJ781015VC5

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION

MABJ781015CHRLC02

APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S)

MARQUEZ BALDERRAMA JACOBO HERIBERTO

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (Ver instrucciones)

(Tratándose de inscripciones en el registro de representantes legales, deberá acompañarse el Anexo 10, y subscrito en el rubro 12 de esta página)

DATOS GENERALES (Ver instrucciones)

FECHA DE NACIMIENTO DE LA PERSONA FISICA O FECHA DE FIRMA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA
7.1 FECHA DE NACIMIENTO O FECHA DE FIRMA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DEL CONTRATO DE AQUISICION CON EL DOCUMENTO QUE DEBE ACOMPAÑAR

2006 01 24

FECHA DE FINICIO DE OPERACIONES 2006 01 24

ACTIVIDAD PREPONDERANTE

8.1 INDICAR LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE

CONSTRUCCION EN GENERAL, ANALISIS Y DISEÑO DE PROYECTOS

8.2 INDICAR EL NUMERO DEL SECTOR AL QUE CORRESPONDE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE A DESARROLLAR (Ver instrucciones)

MARQUE CON "X" SI: PRODUCE BIENES VENDE BIENES PRESTA SERVICIOS ARRENDABA BIENES

8.3 REALIZARA ACTIVIDADES CON EL PUBLICO EN GENERAL

CONTABA CON REGISTRO REGISTRADORA DE CONTRIBUCION FISCAL

PERSONA FISICA SIN ACTIVIDAD ECONOMICA (Ver instrucciones)

9

OTROS

9.1 SI SE REGISTRA EN EL RFC COMO SOCIO, ACCIONISTA, ASOCIANTE O ASOCIADO DE PERSONA MORAL INDICAR SI ES (Ver instrucciones)

SOCIO ACCIONISTA ASOCIANTE ASOCIADO EN CASO DE ESTAR INSCRITO, INDICAR EL RFC DE LA PERSONA MORAL (De ser necesario, acompañar extracto)

9.2

MARQUE CON "X" SI: ES EMPRESA EXPORTADORA DE SERVICIOS DE HOTELERIA ES EMPRESA EXPORTADORA DE SERVICIOS DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

10

TRATANDOSE DE FUSION Y ESCISION DE SOCIEDADES

MARQUE CON "X" SI SE TRATA DE: FUSION ESCISION

11

APERTURA DE ESTABLECIMIENTO (Solo si el domicilio es distinto al señalado en el rubro 4.3)

CALLE

NUMERO Y LETRA EXTERIOR

NUMERO Y LETRA INTERIOR

ENTRE LAS CALLES DE

CALLE

YUE

COLONIA

CODIGO POSTAL

TELEFONO

LOCALIDAD (en su caso)

MUNICIPIO O DELEGACION

ENTIDAD FEDERATIVA

CORREO ELECTRONICO

12

ANEXOS

- ANEXO 1 Personas Morales del Regimen Especial y Regimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos.
- ANEXO 2 Personas Morales del Regimen Simplificado y sus Integrantes Personas Morales.
- ANEXO 3 Personas Físicas con Ingresos por Salarios, Anualidades, Pensiones y Jubilación de Bajas, Premios, Intereses y Prestaciones Fiscales.

- ANEXO 4 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
- ANEXO 5 Personas Físicas con Actividades Empresariales del Regimen Intermedio.
- ANEXO 6 Personas Físicas con Actividades Empresariales del Regimen de Personas con Ingresos.

- ANEXO 7 Personas Físicas con Otros Ingresos.
- ANEXO 8 Personas Morales y Físicas LEPS, ISAR, ISLW (Luz y Fuerza) y Derechos Sobre Concesión y/o Asignación Minera.
- ANEXO 9 Residentes en el Extranjero en Establecimientos Permanentes en México.
- ANEXO 10 Registro de Representantes Legales.

(1) Este señalamiento únicamente aplica en el caso de que se registre el Anexo 10 en el Diario Oficial de la Federación.
(2) Las personas morales constituidas en México que sean sociedades en el extranjero se considerarán como fecha de inicio de operaciones, y como fecha que la de constitución.

Handwritten signature and stamp on the right side of the page.

-9-

Lic. Ornelo Baca Parra
 Notaria Pública No. 15
 Venustiano Carranza No. 1811 Primer Piso
 Tels. 410-41-46, 410-02-18, 410-52-09, 410-62-74
 Fax 410-41-46
 Chihuahua, Chih.

1. ACUSE DE RECIBO POR CERTIFICACION O RELOJ FRANQUEADOR
 (PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD)



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
MODELO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMA OFICIAL LEA LAS INSTRUCCIONES

2. CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION (Cualquier Fecha)

3. ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE AL TIPO DE SOLICITUD QUE PRESENTA: N= NORMAL, C= COMPLEMENTARIA **N**

CUANDO SE TRATA DE SOLICITUD COMPLEMENTARIA, INDICAR EL NUMERO DE FOLIO A QUE HUBO POR LA AUTORIDAD A LA SOLICITUD ANTERIOR.

DATOS DEL CONTRIBUYENTE QUE SE INSCRIBE
 SOLO TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS (Ver Instrucciones)

D 59707
 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2006 FEB 7 AM 10:44
 05/10/2006 10:44

4.1. APELLIDO PATERNO

4.2. APELLIDO MATERNO

4.3. NOMBRE(S)

SOLO TRATANDOSE DE PERSONAS MORALES (Ver Instrucciones)

4.4. DENOMINACION O RAZON SOCIAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.

4.5. TRATANDOSE DE CONTRIBUYENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, SI SE ESTABLECIERON PERMANENTE EN MEXICO

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL ASIGNADO EN EL PAIS EN QUE RESIDA

PAIS DE RESIDENCIA FISCAL

DATOS POR FIDEICOMISO

4.6. SI SE TRATA DE LA INSCRIPCIÓN DE UN FIDEICOMISO, INDIQUE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA FIDUCIARIA

RFC DE LA FIDUCIARIA

NUMERO DE FIDEICOMISO

4.7. DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE SE INSCRIBE O DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

CALLE

PIMENTEL

NUMERO Y LETRA EXTERIOR

3108

NUMERO Y LETRA INTERIOR

ENTRADA CALLES DE

INGENIERIA

CALLE

MEDICINA

COLONIA

RESIDENCIAL UNIVERSIDAD

LOCALIDAD (Ver Instrucciones)

CHIHUAHUA

5. DECLARO BAJO PENALIDAD DE FOLIA DE JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SON CIERTOS

MUNICIPIO O DELEGACION

CHIHUAHUA

CODIGO POSTAL

31125

TELEFONO

413-96-92

JACOBO MARQUEZ B.

ENTIDAD FEDERATIVA

CHIHUAHUA


CORREG. ELECTRONICO

di.ccsa_ch_prodigy.net.mx

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O SU REPRESENTANTE VERIFICADA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BAJO PROTESA DE DECIR VERDAD, PARA ESTA FECHA Y EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTAN, LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

previstos para la vida normal de la Sociedad, con la sola excepción de que serán convocadas con el Liquidador, en vez de por el Presidente del Consejo de Administración o por el Administrador Unico Propietario.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.A handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke and a horizontal stroke at the bottom.

OTROS
NOTAS

0342

0002809

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE C
21504450183 SUC. 014
R.F.C. DCC060124KS2
CLABE 044150215044501839
CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA 21 Febrero 2020

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Comision Estatal de los derechos humanos \$ 190,050.66

Son ciento noventa mil cincuenta pesos 56/100

MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NO 0342

5789 515004471 21504450183 0002809

0002809

COMISION ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO

Luis Argueta
21 FEB. 2020

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

*Recibi cheque en
Original.*

Scotiabank

CHEQUE
FAVOR DE
CANTIDAD ANTERIOR \$
POSITIVO
MATERIA
EQUIVALENCIA
MISIONES
VALIDO AL SIG. \$

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE C
21504450183 SUC. 014
R.F.C. DCC060124KS2
CLABE 044150215044501839
CHIHUAHUA, CHIH.

0342

0002811

FECHA 03 Julio 2020

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Comision Estatal de los derechos humanos | \$ 190,050.66

Con ciento noventa mil cincuenta pesos 66/100

MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

0342

0002811

8568051150044702150445018390002811

Scotiabank


COMISION ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECEBIDO

Leis Arguelles
03 JUL. 2020

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Recibi cheque en original.





COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 DE FEBRERO DEL 2020.

No. DE CONTRATO: No. CEDH 01A/2020.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEDH 01A/2020 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CONCERNIENTE A LA REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS, ÁREA DE CALDERA Y BODEGA" DE OFICINAS CENTRALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR **LOS C.C. LIC. NÉSTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA**, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y **C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON**, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "**LA COMISIÓN**" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR **C. ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA.- DECLARA "LA COMISIÓN":

- a) QUE LA OBRA MOTIVO DE ESTE CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUBRIR EL IMPORTE DE DICHA OBRA, SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL 6223 DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2020, EMITIDO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
- b) QUE LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA EN CUESTIÓN SE EFECTUÓ MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN DICTAMEN TÉCNICO, APROBADO EN SU PRIMER SESIÓN ORDINARA, DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2020, ACUERDO No. 01-03-2020, POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE "LA COMISIÓN".
- c) QUE EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE "LA COMISIÓN" ESTÁ VIGENTE Y POR LO TANTO, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LXVI/NOMBR/0327/ 2019 II P.O.
- d) QUE EL DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUENTA CON EL NOMBRAMIENTO, EXPEDIDO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

- e) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVE. ZARCO No. 2427, COL. ZARCO, C.P. 31020, CHIHUAHUA, CHIH., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS EFECTOS Y FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

- a) QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 17,868 VOLUMEN 557 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2006, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. OVIEDO BACA GARCÍA, NOTARIO PÚBLICO No. 15, DISTRITO MORELOS, CHIHUAHUA CHIH, LA CUAL FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO No. 22807*10, CON FECHA 6 DE ABRIL DEL 2006.
- b) ASÍ MISMO ACREDITA LAS FACULTADES CON LAS QUE SE CONDUCE COMO SU PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 17,868 VOLUMEN 557 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2006, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. OVIEDO BACA GARCÍA, NOTARIO PÚBLICO No. 15, DISTRITO MORELOS, CHIHUAHUA CHIH, LA CUAL FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO No. 22807*10, CON FECHA 6 DE ABRIL DEL 2006.
- c) QUE SU REPRESENTADA ES UNA EMPRESA MEXICANA Y CONVIENE CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.
- d) QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE ASUME SU RESPONSABILIDAD COMO PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE DURANTE Y CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.
- e) QUE CUENTA CON REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO A80-79584-10-9 Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL NÚMERO **DCC060124KS2**.
- f) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE FRANCISCO PIMENTEL No. 3108, FRACCIONAMIENTO UNIVERSIDAD, C.P. 31203, CHIHUAHUA CHIH., MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO
- g) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

CLÁUSULAS

- PRIMERA:** OBJETO DEL CONTRATO. "LA COMISIÓN" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS, ÁREA DE CALDERA Y BODEGA" DE OFICINAS CENTRALES, EN CHIHUAHUA, CAPITAL.
- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN SU PROPUESTA ECONÓMICA (CATALOGO DE CONCEPTOS), DEL CUAL DERIVÓ EL PRESENTE CONTRATO, EN EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, EN LOS PRESUPUESTOS, EN LOS PLANOS, EN LOS PROYECTOS, EN LAS ESPECIFICACIONES, EN EL CLAUSULADO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO.
- SEGUNDA:** MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,900506.64 (UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 64/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- TERCERA:** PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN UN PLAZO DE 120 DÍAS NATURALES, DEBIENDO INICIARLOS EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2020.
- CUARTA:** DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "LA COMISIÓN" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", ÉL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.
- QUINTA:** ANTICIPO. NO HABRÁ ANTICIPO
- SEXTA:** FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE REALICE POR MEDIO DE FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES PARCIALES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS, Y HARÁN LAS VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, PREVIO LA ENTREGA DE LA FACTURA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DÍAS. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE SERÁN LOS DÍAS ÚLTIMOS DE CADA MES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LAS CUALES DEBERÁN IR ACOMPAÑADAS DE LOS NÚMEROS GENERADORES Y DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ANTES SEÑALADO, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ DENTRO DE IGUAL PLAZO EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA".

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, SALVO QUE REITERADAMENTE EXISTA DESACUERDO ENTRE EL RESIDENTE Y "EL CONTRATISTA" EN RELACIÓN CON ALGÚN O ALGUNOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE OBRA EJECUTADA, CASO EN EL CUAL, "EL CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 294 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. EN NINGÚN CASO PODRÁ EL RESIDENTE AUTORIZAR EL PAGO DE TRABAJOS NO EJECUTADOS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SERÁN PAGADAS EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. EL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERÁ EN AVE. ZARCO No 2427, COL. ZARCO, C.P. 31020, CHIHUAHUA, CHIH.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, A SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA", SE LE PAGARÁN COSTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCió EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA". DICHA SOLICITUD ESCRITA DEBERÁ PRESENTARSE POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" AL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

POSTERIORES AL DÍA QUE SE GENEREN, BAJO PENA DE QUE PRECLUYA SU DERECHO A RECLAMAR EL PAGO DE LOS MISMOS. UNA VEZ INGRESADA LA SOLICITUD POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", "LA COMISIÓN" CONTARÁ CON VEINTE DÍAS NATURALES PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE SU PROCEDENCIA, EMITIENDO UN DICTAMEN DONDE SE DETERMINE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE COSTOS FINANCIEROS. SI DE DICHO ANÁLISIS RESULTA PROCEDENTE HACER ALGÚN PAGO POR CONCEPTO DE COSTO FINANCIERO, "LA COMISIÓN" CONTARÁ CON UN PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA CUBRIR EL MONTO ARROJADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA PRESENTADA LA FACTURA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, PARA LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO EXCESIVO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA COMISIÓN". NO SE CONSIDERARÁN PAGOS EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA COMISIÓN" SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO.

SÉPTIMA: AJUSTE DE COSTOS. CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA O COTIZACIÓN OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, DICHS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

EL PROCEDIMIENTO DEL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SUJETÁNDOSE A LO SIGUIENTE.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;
2. LA REVISIÓN DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.
3. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE EL ENTE PÚBLICO TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LAS PERSONAS CONTRATISTAS NO ESTÉN DE ACUERDO CON LA PROPORCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICIÓN DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, PODRÁN SOLICITAR SU REVISIÓN A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCIÓN I DE ESTE ARTÍCULO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ **"EL CONTRATISTA"** QUIEN LO PROMUEVA, DENTRO DE LOS CUARENTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN POR ESCRITO DE LA SOLICITUD QUE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR EL ARTÍCULO 207 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. EN CASO CONTRARIO, PRECLUYE SU DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS MISMOS. SI EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERÁ **"LA COMISIÓN"** QUIEN LO DETERMINARÁ ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 202 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"LA COMISIÓN", DENTRO DE LOS CUARENTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A QUE **"EL CONTRATISTA"** PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA, AL EFECTO NO SE REQUERIRÁ DE CONVENIO ALGUNO, DE NO HACERLO ASÍ, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR RECHAZADA.

EL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE AJUSTE DE COSTOS, SE DEBE HACER DE MANERA SIMILAR A UNA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS ORDINARIOS EJECUTADOS, SIGUIENDO LOS MISMOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y PAGO QUE INTERNAMENTE TIENE ESTABLECIDO **"LA COMISIÓN"** CONTRATANTE.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

NO DARÁ LUGAR A AJUSTES DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERE ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA. EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, A SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ RESOLVERSE Y CUBRIRSE CUANDO PROCEDA, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "LA COMISIÓN" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTIVO.

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ÉSTOS SE APLICARÁN EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE OTORGADA.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", EL AJUSTE SE REALIZARÁ CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

OCTAVA: **GARANTÍAS.** "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y TOMANDO COMO BASE LOS FORMATOS QUE LE SEAN PROPORCIONADOS POR "LA COMISIÓN" Y DEBERÁN SER PRESENTADAS EN EL DOMICILIO DE ESTE ENTE PÚBLICO, LAS GARANTÍAS SIGUIENTES:

- A) **CHEQUE CRUZADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.-** A FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- B) **CHEQUE CRUZADO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.-** "EL CONTRATISTA" GARANTIZARÁ LOS TRABAJOS PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, SUSTITUYENDO EL CHEQUE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO VIGENTE POR OTRO DEL MISMO MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA RESPONDER DEL SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VIGENCIA DE



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS, EN EL CASO DE QUE NO EXISTA INCONFORMIDAD POR PARTE DE "LA COMISIÓN". SI "EL CONTRATISTA".

NOVENA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ COMUNICAR A "LA COMISIÓN" LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTE DENTRO DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA COMISIÓN" CONTARÁ CON UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DE SEIS DÍAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

SI LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS RESULTA QUE ESTOS NO HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS, SE LE NOTIFICARÁN AL CONTRATISTA PARA QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES CONTRATADAS O CONVENIDAS.

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁ SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE LAS RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON "LA COMISIÓN" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN. DENTRO DE ESTE PLAZO, "LA COMISIÓN" CONVOCARÁ A "EL CONTRATISTA" A UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, INVITANDO A UN REPRESENTANTE DE -DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A "EL CONTRATISTA", ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "LA COMISIÓN" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE,



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES A SU FAVOR; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DÉCIMA: REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CON DOMICILIO EN EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, QUIEN DEBERÁ CONTAR CON SU REGISTRO EN EL DEPARTAMENTO ESTATAL DE PROFESIONES, DICHO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, ADEMÁS DE CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

"LA COMISIÓN", SE RESERVA EL DERECHO DE PEDIR SU SUSTITUCIÓN EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA", A NOMBRAR OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS.

"EL CONTRATISTA", A TRAVÉS DE SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, DEBERÁ REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE LE PERMITAN CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y EJERCER LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO, SUS ANEXOS Y DE LA BITÁCORA.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA", PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONTAR CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA COMISIÓN", EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS EN EL TEXTO DE ESTE CONTRATO, LIBERANDO DE TODA OBLIGACIÓN LABORAL A "LA COMISIÓN".



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A RETIRAR DE LA OBRA AQUEL PERSONAL QUE A JUICIO DE “LA COMISIÓN” NO SEA CONVENIENTE SU PERMANENCIA EN LA OBRA.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS PARA TAL EFECTO Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA COMISIÓN” O A TERCEROS, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LA OBRA; EN CASO CONTRARIO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL.

EN CASO DE QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EN LA OBRA QUE UTILICE “EL CONTRATISTA” NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HARÁ ACREEDOR A UNA SANCIÓN ECONÓMICA DEL TRES POR CIENTO (3%). LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE.

IGUALMENTE SE OBLIGA “LA CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS, FÍSICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO SUPUESTO DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”.

CUANDO A JUICIO DE “LA COMISIÓN” SE REQUIERA EL EMPLEO DE DOS O MÁS TURNOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA EVITAR DESFASAMIENTOS DEL PROGRAMA, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A UTILIZARLOS. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, SERÁ MOTIVO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE LE PERMITAN CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. ASÍ MISMO, ASUMIRÁ LA CONSERVACIÓN, LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS Y LOS RIESGOS DE LAS OBRAS QUE REALICE, HASTA SU ENTREGA FÍSICA A “LA COMISIÓN”.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DEL RESIDENTE DE OBRA, ÉSTE ORDENARÁ SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO NI AMPLIACIÓN DEL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN ESCRITA POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, O EL CONVENIO RESPECTIVO, INDEPENDIEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A TODAS LAS LEYES, REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA Y A LAS DISPOSICIONES QUE CON BASE EN AQUÉLLOS, TENGA ESTABLECIDOS "LA COMISIÓN", PARA LA EJECUCIÓN DE SUS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES.

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A "LA COMISIÓN" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR LA INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR LA RESIDENCIA DE OBRA O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES, REGLAMENTOS O NORMATIVIDAD EXISTENTE.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA; IGUALMENTE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DAR AVISO A LA RESIDENCIA DE OBRA, DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

"EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR A LA SECRETARÍA DE SALUD, LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO, CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. "LA COMISIÓN" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA LO CUAL "LA COMISIÓN", COMPARARÁ MENSUALMENTE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS. SI DE DICHA COMPARACIÓN RESULTA QUE EL AVANCE ES MENOR QUE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, "LA COMISIÓN" PROCEDERÁ A:

- A) RETENER EL TRES POR CIENTO (3%) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA LA REVISIÓN. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA PROCEDENTE.
- B) APLICAR PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL TRES POR CIENTO (3%) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO REALIZADOS EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA, QUE CUBRIRÁ "EL CONTRATISTA" MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A FAVOR DE "LA COMISIÓN".

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE "LA COMISIÓN" NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, "LA COMISIÓN" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO, SI "LA COMISIÓN" OPTA POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, APLICARÁ A "EL CONTRATISTA" UNA SANCIÓN CONSISTENTE EN UN PORCENTAJE DEL VALOR DEL MISMO, QUE PODRÁ SER A JUICIO DE "LA COMISIÓN", HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "EL CONTRATISTA" SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS RETENCIONES QUE LE HAYAN SIDO EFECTUADAS, APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO. LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DECIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. "LA COMISIÓN" EN CUALQUIER MOMENTO, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. LA SUSPENSIÓN SE EFECTUARÁ CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 90 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 153 DE SU REGLAMENTO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DECIMA QUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "LA COMISIÓN", PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL. LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, LA SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", O QUE "EL CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA COMISIÓN", ADEMÁS DE QUE SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

SI "LA COMISIÓN" DETERMINA RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR TANTO NO SE CONSIDERARÁ INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, DEBIENDO DOCUMENTARSE TAL SITUACIÓN.

"LA COMISIÓN" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

QUE EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y EN SU CASO, SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO AL ESTADO, PARA TALES EFECTOS SE APLICARÁ EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 159, 160, 161 Y 162 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

DECIMA SEXTA: "LA COMISIÓN" CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DESIGNA AL C. C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON, PARA QUE EN CASO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN EN TODO O EN PARTE DE LA OBRA, SEA DICHO FUNCIONARIO QUIÉN EJERZA LAS FACULTADES OTORGADAS EN DICHO ARTÍCULO.

DECIMA SÉPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODOS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL MISMO, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SEAN APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: AL RECIBIRSE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS O PARTE DE ELLOS, SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A FIN DE DETERMINAR EL SALDO A FAVOR O A CARGO DE "EL CONTRATISTA". SI EXISTEN RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE ÉSTE, SE DEDUCIRÁ DEL SALDO A SU FAVOR, PERO SI NO LO HUBIESE, "LA COMISIÓN" HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, EN LA MEDIDA QUE PROCEDA.

DECIMA NOVENA: LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, SERÁN RESUELTAS MEDIANTE EL JUICIO DE OPOSICIÓN PREVISTO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AMBAS PARTES RESOLVERÁN DE COMÚN ACUERDO LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

VIGÉSIMA: EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, Y LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERE EN EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULARÁN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2020.

"POR LA COMISIÓN"




LIC. NÉSTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA.
PRESIDENTE.



C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

"EL CONTRATISTA"



DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.
ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Acta Entrega-Recepción de Conclusión de los trabajos de Obra Pública de la Remodelación y Rehabilitación del Área de "Atención y Quejas, Área de Calderas y Bodega de Oficinas Centrales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con domicilio en Ave. Zarco No. 2435, Colonia Zarco, C.P. 31020, adjudicada mediante Contrato de Residencia de Obra No. CEDH 01B/2020.

Chihuahua, chihuahua, a 30 de Junio del 2020, siendo 10:00 Horas, reunidos en el Inmueble de las Oficinas Centrales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sito en Ave. Zarco No. 2435, Colonia Zarco, C.P. 31020, los siguientes: Presidente del Comité de Obras Publicas de la C.E.D.H., C.P. Rafael Valenzuela Licón, Director de Servicios Administrativos, Residente de Obra.- el C. Felipe Fernando Dávila Rivas, y el Auxiliar Arquitecto C. Carlos Vargas Ortega y el Contratista Ing. José Luis Rodríguez Hernández, en representación de la Empresa " Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V., con el Objeto de proceder a la Entrega- Recepción de los trabajos encomendados mediante Contrato de Obra Pública No. CEDH 01A/2020, a precios unitarios y tiempo determinado, mediante Adjudicación Directa. -----

Lo anterior en apego a los artículos 83°, 85°, 86°, 87° y 88° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. Se lleva a cabo la Entrega-Recepción de los trabajos arriba descritos:

I. Lugar, fecha y hora.- Ave. Zarco No. 2427, Colonia Zarco, C.P. 31020, 30 de Junio del 2021, 10:00 A.M. (Anexo No. 1).

II. Nombre y firma del Residente y del Supervisor de los trabajos por parte del Ente Público y del Superintendente por parte del Contratista.- Residente de Obra el C. Felipe Fernando Dávila Rivas, y los Auxiliares los Arquitectos el C. Carlos Olivas Saucedo y el C. Carlos Vargas Ortega y el Contratista el Ing. José Luis Rodríguez Hernández, Administrador Único. (Anexo No. 2).

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Acta Entrega-Recepción de Conclusión de los trabajos de Obra Pública de la Remodelación y Rehabilitación del Área de "Atención y Quejas, Área de Calderas y Bodega de Oficinas Centrales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con domicilio en Ave. Zarco No. 2435, Colonia Zarco, C.P. 31020, adjudicada mediante Contrato de Residencia de Obra No. CEDH 01B/2020.

- III. Descripción de los trabajos que se reciben.- Remodelación y Rehabilitación del Área de "Atención y Quejas, Área de Calderas y Bodega de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en Chihuahua, Capital.
✓(Anexo No. 3 A Catalogo Original).
- IV. Importe contractual, incluyendo el de los Convenios Modificatorios.- Contrato Original No. CEDH 01A/2020, por un importe de \$ 1,900,506.64 (Un Millón Novecientos Mil Quinientos Seis Pesos 64/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado. (Anexo No. 4).
- V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios modificatorios o adicionales. Contrato Original No. CEDH 01A/2020, Plazo de ejecución. "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 120 días naturales, debiendo iniciarlos el día 18 de Febrero del 2020, y terminarlos a más tardar el día 30 de Junio del 2020. (Anexo No. 5).
- ✓VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como los pendientes de autorización. (Anexo No. 06).
- ✓VII. Declaración del Contratista de haber terminado los trabajos contratados. Escrito emitido por "El Contratista" el cual se explica por si solo (Anexo 07).
- VIII. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimientos correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los Benes Instalados. (Anexo No. 8).

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Acta Entrega-Recepción de Conclusión de los trabajos de Obra Pública de la Remodelación y Rehabilitación del Área de "Atención y Quejas, Área de Calderas y Bodega de Oficinas Centrales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con domicilio en Ave. Zarco No. 2435, Colonia Zarco, C.P. 31020, adjudicada mediante Contrato de Residencia de Obra No. CEDH 01B/2020.

IX. Fecha de inicio y cierre de bitácora.- 18 de Febrero del 2020 y terminarlos a más tardar el día 30 de Junio del 2020. (Anexo No. 9)

X. Constancia de que el contratista entregó a la residencia o a la supervisión los documentos derivados de la realización de los trabajos. Escrito emitido por "El Contratista" el cual se explica por si solo (Anexo No. 10).

XI. Descripción del documento en el cual se garantice la responsabilidad por Defectos y Vicios Ocultos de la Obra o los Servicios y cualquier otra en que hubiere incurrido el Contratista.

En el Acto de entrega física de los trabajos el Contratista exhibió Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, en el cual se responsabiliza por 12 meses contados a partir de la fecha de la presente Acta Entrega-Recepción a Garantizar el 100% de los trabajos ejecutados y descritos en el Contrato No. CEDH 01A/2020, a precios unitarios y tiempo determinado, en apego al Artículo 68°, fracción IV y 85° primer párrafo de la Ley. Se recibe en Original Escrito por Defectos y Vicios Ocultos. (Anexo No. 11).

No habiendo más que agregar se da por terminada la presente Acta de Entrega-Recepción de los trabajos consignados mediante Contrato de Obra Pública No. CEDH 01A/2020, a precios unitarios y tiempo determinado, siendo las 6:45 P.M., del mismo día de su inicio, firmado al margen y alcalce los que en ella intervinieron. -----

C.P. Rafael Valenzuela Licón.
Presidente del Comité de la C.E.D.H.

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS


Acta Entrega-Recepción de Conclusión de los trabajos de Obra Pública de la Remodelación y Rehabilitación del Área de "Atención y Quejas, Área de Calderas y Bodega de Oficinas Centrales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con domicilio en Ave. Zarco No. 2435, Colonia Zarco, C.P. 31020, adjudicada mediante Contrato de Residencia de Obra No. CEDH 01B/2020.

C. Felipe Fernando Dávila Rivas.-----
Residente de Obra.

Arq. Carlos Vargas Ortega.-----
Auxiliar del Residente de Obra.

Ing. José Luis Rodríguez Hernández.-----
El Contratista Administrador Único.

Esta hoja No. 4, corresponde al Acta Acta Entrega-Recepción de Conclusión de los trabajos de Obra Pública de la Casa Contigua a Oficinas Centrales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.



diseños y construcciones civiles s.a. de c.v.

Comisión Estatal de
los Derechos Humanos
Chihuahua

ARCHIVO

11 FEB 2020
Recibido

**PRESUPUESTO DE REMODELACION DE OFICINAS DE COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS DE ESTA CIUDAD CHIHUAHUA.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
PRESUPUESTO REMODELACION CEDH		1,00	60.269,58	1.388.729,73
PREELIMINARES		1,00	58.645,32	58.645,32
INTERIOR		1,00	30.761,57	30.761,57
1,21 TRAZO Y NIVELACION	M2	130,10	19,50	2.536,95
TEMP*1 DEMOLICION DE MUROS DE MUROS DE TABLAROCA	M2	34,28	175,66	6.021,62
TEMP*3 DESMONTAR Y DESCONEJON DE SISTEMA ELECTRICO	LOTE	1,00	6.034,35	6.034,35
TEMP*2 DESMONTAR CANCELERIA	LOTE	1,00	5.260,65	5.260,65
TEMP*26 DEMOLICION DE PARED Y REPARACION DE HUECO PARA CALDERA	LOTE	1,00	4.735,80	4.735,80
TEMP*27 RETIRO DE MINISPLIT	PZ	3,00	974,56	2.923,68
TEMP*39 DEMOLICION DE PARED PARA HACER PUERTA, INLCUYE PERFILADO DE HUECO EXTERIOR	PZ	2,00	1.624,26	3.248,52
TEMP*4 DESMONTAR REJAS METALICAS	PZ	9,60	27.883,74	27.883,74
TEMP*5 DESMONTAR BARANDAL Y REJA DE ACCESO	PZ	1,00	6.747,30	6.747,30
TEMP*6 DESMONTAR PORTON ELECTRICO	PZ	1,00	2.923,67	2.923,67
TEMP*7 DEMOLICIONES EN FACHADA (tablaroca, molduras de preti y ventanas)	LOTE	1,00	2.536,39	2.536,39
TEMP*8 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO PARA HACER ACCESO A OFICINAS	M2	1,00	4.160,65	4.160,65
TEMP*9 RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	M2	56,00	2.698,82	2.698,82
TEMP*10 RETIRO DE ABULTADO LADRILLO DE FACHADA EN AREA DE COCHERA	M2	6,72	65,07	3.643,92
TEMP*11 RETIRO DE FACHALETA DE LADRILLO PARA LA COLOCAION DE BARANDAL	ML	13,00	97,59	655,80
TEMP*28 DEMOLICION Y REUBICACION DE ESCALONES PARA ACCESO A SUBESTACION	M2	1,00	97,59	1.269,67
CONSTRUCCION INTERIOR		1,00	3.248,52	3.248,52
ACABADOS		1,00	971.763,37	971.763,37
OBRE MURO TA SOBREMURO DE TABLAROCA DE HOJA BLANCA	M2	1,00	214.542,08	214.542,08
MURO TABL 2 CAR MURO DE TABLA ROCA DE DOS CARAS A BASE DE HOJA DE TABLAROCA DE 1/2" SUJETO A CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL 25 COLOCADA VERTICALMENTE @ 24" (0,61M) LAS HOJAS DE TABLA ROCA DEBERAN UNIRSE UNAS A OTRAS DE MANERA NO QUEDEN FORZADAS EN LAS JUNTAS	M2	90,20	284,25	25.639,35
PLAFON H VERT FALSO PLAFON DE A BASE DE CANAL LISTON Y CANALETA DE CARGAS SOPORTADA DE LA ESTRUCTURA ESPACIADA @24"	M2	34,10	383,11	13.064,05
CAJ 1 CAJILLOS DE TABLAROCA A BASE DE HOJA DE TABLAROCA DE 1/2" SUJETO A CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL 25	ML	32,27	278,07	36.178,91
ANT 1 ANTEPECHO DE TABLAROCA EN PUERTA Y VENTANAS DE CANCELERIA	ML	5,51	284,24	9.172,42
ASLANT SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE R11 DE FIBRA DE VIDRIO	ML	6,51	386,10	2.513,51
CERAM CANVA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	124,30	80,34	9.986,26
ZOCLO 10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE CERAMICA DE 10 CM	M2	130,10	632,47	82.284,35
1,36 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	ML	105,40	132,49	13.964,45
TRABAJOS EN BAÑO	M2	366,50	59,32	21.740,78
DESM1 DESMONTAR JUEGO DE SANITARIOS	LOTE	1,00	11.206,51	11.206,51
INST SANIT INSTALACION DE SANITARIOS	LOTE	1,00	500,00	500,00
SUM SANIT SUMINISTRO DE SANITARIO	LOTE	1,00	1.100,00	1.100,00
SUM LAV SUMINISTRO DE LAVABO, INC. MEZCLADORA	PZ	1,00	850,00	850,00
SUM MING SUMINISTRO DE MINGITORIO	PZ	1,00	1.200,00	1.200,00
TEMP*9 RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	PZ	1,00	1.150,00	1.150,00
	M2	3,45	65,07	224,49

CERAM CANVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	3,45	632,47	2.182,02
PUERT 1	DESMONTAR PUERTA EXISTENTE E INSTALAR PUERTA NUEVA DE MADERA SALIDA AL AUDITORIO	LOTE	1,00	4.000,00	4.000,00
TEMP*9	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	M2	2,70	65,07	175,69
CERAM CANVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	2,70	632,47	1.707,67
PUERT 2	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 36*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1	9.386,58	9.386,58
CER AUD 1	QUITAR CERAMICAS EXISTENTES	PZ	30	80,00	2.400,00
CER AUD 2	COLOCACION DE CERAMICAS	PZ	30	80,00	2.400,00
RET TAP	AREA DE ESCALERAS	LOTE	1,00	42.995,97	42.995,97
TERM MUR	RETIRO DE PAPEL TAPIZ EN FIJO Y MUROS	LOTE	1,00	2.000,00	2.000,00
MOD BAR	TERMINACION DE MUROS CON CON APLANADO DE YESO	M2	82,40	45,00	3.708,00
PUERT 3	MODIFICACION DE BARANDAL	LOTE	1,00	3.800,00	3.800,00
PUERT 4	SUMINISTRO DE PUERTAS CON REJILLAS INFERIOR	PZ	2,00	4.550,00	9.100,00
SUM CERAM 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINADA PARA EXTERIOR	PZ	1,00	4.000,00	4.000,00
1,36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN ESCALERAS	LOTE	1,00	9500,00	9500,00
VENT ESC 1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	M2	82,40	59,32	4887,97
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2.00.X 1.00 DE VIDRIO DE 6MM ACCESO	PZ	1,00	6.000,00	6.000,00
SUM BAR 1			1,00	62.255,72	62.255,72
SUM MICR 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL PARA DISCAPACITADOS	LOTE	1,00	6.000,00	6.000,00
SUM MICR 2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROPERFORADO EN COLOR DORADO	LOTE	1,00	5.530,00	5.530,00
SUM CORT 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROPERFORADO EN COLOR ROJO	LOTE	1,00	4.841,72	4.841,72
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE ACERO METALICA	LOTE	1,00	45.884,00	45.884,00
AD 1	OFICINAS COLINDANTES		1,00	7.678,00	7.678,00
AD 2	CAMBIO DE GIRO DE PUERTA (inc cambio de marco, recorte de vidrio y colocacion d	LOTE	1,00	2.438,00	2.438,00
AD 3	SUMINISTRO DE PAPEL ARENADO EN PUERTAS	LOTE	2,00	1.310,00	2.620,00
	SUMINISTRO Y COLOCAION DE PAPEL ARENADO EN VENTANAS	LOTE	2,00	1.310,00	2.620,00
	CANCELARIA		1,00	193.071,17	193.071,17
	SALA DE JUNTAS		1,00	21.043,41	21.043,41
TEMP*13	FIJO CLARO DE 98*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	6.119,95	6.119,95
TEMP*14	FIJO CLARO DE 79*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	6.272,96	6.272,96
TEMP*38	PUERTA DE 80*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	8.650,50	8.650,50
	CUBICULO 5		1,00	21.420,50	21.420,50
TEMP*37	FIJO CLARO DE 283*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	12.770,00	12.770,00
TEMP*38	PUERTA DE 90*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	8.650,50	8.650,50
	CUBICULO 4		1,00	16.094,58	16.094,58
TEMP*15	VENTANA DE 90*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	5.708,00	5.708,00
TEMP*16	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 36*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	10.386,58	10.386,58
	CUBICULO 3		1,00	\$ 10.380,69	\$ 10.380,69
TEMP*17	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 36*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	10.380,69	10.380,69
	PASILLO		1,00	\$ 19.031,39	\$ 19.031,39
TEMP*18	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 51*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	10.380,69	10.380,69
TEMP*38	PUERTA DE 80*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	8.650,70	8.650,70
	CUBICULO 2		1,00	\$ 15.477,10	\$ 15.477,10
TEMP*22	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 165*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	15.477,10	15.477,10
	CUBICULO 1		1,00	\$ 15.477,10	\$ 15.477,10
TEMP*23	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 165*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	15.477,10	15.477,10
	RECEPCION		1,00	\$ 74.146,40	\$ 74.146,40
TEMP*20	VENTANA CORREDIZA DE 1.75*0.40 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIOS CLAROS DE 6MM	PZ	2,00	1.983,20	3.966,40
TEMP*36	VENTANAL FIJO DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 mm 490*220 INCLUYE PUERTA D	PZ	1,00	57.080,00	57.080,00
AD ARE 1	SUMINISTRO DE PAPEL ARENADO EN PUERTAS	PZ	3,00	1.310,00	3.930,00
AD ARE 2	SUMINISTRO Y COLOCAION DE PAPEL ARENADO EN VENTANAS	PZ	7,00	1.310,00	9.170,00
	ELECTRICIDAD		1,00	\$ 130.838,55	\$ 130.838,55
SAL TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE	PZ	29,00	537,44	15.585,76

SAL ILLUM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION	PZ	33,00	537,44	17.735,52
LAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA GENERAL ELECTRIC INTERIOR SUSP LED60W100-240V400K5400LM	PZ	6	2.631,79	15.790,74
LAMP SJUNT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EN SALA DE JUNTAS CONSTRUUIT	PZ	1	2.631,79	2.631,79
SPOT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT INTERIOR	PZ	26	1.028,84	26.749,84
TEMP*29	SUMINISTRO DE SALIDA PARA MINISPLIT	PZ	11,00	2.436,39	26.800,29
TEMP*30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA	PZ	1,00	12.772,31	12.772,31
TEMP*30A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINISPLITS EN AREA DE AZOTEA	PZ	1,00	12.772,31	12.772,31
	VOZ Y DATOS		1,00	\$ 6.638,52	\$ 6.638,52
SAL VOZ Y DAT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELEFONIA	PZ	13,00	427,98	5.563,74
SAL TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE	PZ	2,00	537,44	1.074,88
	CCTV		1,00	\$ 2.550,27	\$ 2.550,27
TEMP*40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CCTV	PZ	3,00	850,09	2.550,27
	CLIMAS		1,00	\$ 213.296,54	\$ 213.296,54
TEMP*31	INSTALACION DE MINISPLIT EXISTENTE	PZ	2,00	6.497,04	12.994,08
TEMP*33	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TON	PZ	1,00	27.071,00	27.071,00
TEMP*32	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON	PZ	8,00	21.297,68	170.381,46
DEM 1	DEMOLICION DE PISO Y SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA CONSENSADOS	LOTE	1,00	2.850,00	2.850,00
	CARPINTERIA		1,00	\$ 70.620,00	\$ 70.620,00
TEMP*34	FABRICACION DE MUEBLE PARA RECEPCION DE MADERA DE MDF ACABADO MELANIMADO, MURO Y PLAFON DE MDF, FIJO DE ALUMINIO DE 2" CON VIDRIO DE 6MM	LOTE	1,00	70.620,00	70.620,00
	CONSTRUCCION EXTERIOR		1,00	\$ 358.321,04	\$ 358.321,04
	ALBAÑILERIAS		1,00	\$ 35.223,97	\$ 35.223,97
ALB 2	CASTILLOS DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTR	ML	9,00	420,78	3.787,02
1,28	DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 cms. CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CERRAMIENTO EN DESPLANTE DE MUROS DE BLOCK	ML	6,00	326,85	1.961,10
MURO DE 6	MURO DE BLOCK DE 6" CON VAR. NO. 3 @ 80 CM CON CONCRETO DE 150 KG/C	M2	15,90	493,60	7.848,24
1,23	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR	M3	6,99	441,60	3.086,78
061018	Firme de 10 cm, de espesor, de concreto f'c= 200 kg/cm2 acabado llana metalica, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye materiales, acerros, preparacion de la superficie, nivelacion, cimbrado colado, Mano de obra, equipo y herramienta.	M2	46,59	306,05	14.258,87
TEMP*25	MODIFICACION DE BAJADA PLUVIAL	LOTE	1,00	2.446,96	2.446,96
REG 1	REGISTRO SANITARIO EN RAMPA DE ACCESO	PZA	1,00	1.835,00	1.835,00
	ACABADOS		1,00	\$ 306.346,26	\$ 306.346,26
1.33-1	APLANADO A BASE ENJARRE ACABADO FIJO	M2	27,30	178,78	4.880,69
CANTERA 40*1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA DE 40*40 COLOR PIÑON	M2	27,30	737,32	20.128,84
TEMP*24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL	M2	64,62	1.606,02	103.781,01
PUERT 5	PUERTA DE SERVICIO PARA CUARTO ELECTRICO	PZ	1,00	5550,00	5.550,00
REJ 1	REJAS GRANDES 1.2 *1.5 M	PZ	2,00	3240,00	6.480,00
REJ 2	REJAS PEQUEÑAS 3" .8M	PZ	1,00	650,00	650,00
MURO DURÓCK	MUROS DE DURÓCK 2 CARAS	M2	6,60	789,77	5.212,48
1,36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA	M2	132,00	59,32	7.830,24
TEMP*35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUCUBOND	LOTE	1,00	151833,00	151833,00
	LIMPIEZA		1,00	\$ 16.750,81	\$ 16.750,81
LIMP GRUESA	LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL RPOCESO DE LA OBRA	M2	130,10	43,26	5.628,13
RET ESCOMBRC	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA OBRA	VIAJES	6,00	1.853,78	11.122,68
	OFICINAS AREA DE CALDERA		1,00	249.638,09	\$ 249.638,09
	PRELIMINARES		1,00	55.266,93	55.266,93
	INTERIOR		1,00	28.029,02	28.029,02
1,21	TRAZO Y NIVELACION	M2	47,30	15,09	713,76
TEMP*3	DESMONTAR Y DESCONEXION DE SISTEMA ELECTRICO	LOTE	1,00	4.872,78	4.872,78
TEMP*12	QUITAR VENTANA	PZ	1,00	974,56	974,56
TEMP*19	DESMANTELIAMIENTO DE CALDERA	LOTE	1,00	12.977,13	12.977,13
TEMP*002	DEMOLICION DE MUROS DE MUROS DE TABLAROCA	M2	17,25	162,66	2.805,89
TEMP*27	RETIRO DE MINISPLIT	PZ	2,00	974,56	1.949,12

TEMP*4	DESMONTAR REJAS METALICAS	PZ	2,00	649,70	1.299,40
TEMP*6	DESMONTAR TECHUMBRE	PZ	1,00	2.436,39	2.436,39
	MUROS, DALAS Y CASTILLOS	PZ	1,00	27.237,91	27.237,91
	CASTILLO K2 DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE #14" @15 cms. CON CONCRETO FC 200 KG/CM2		10	307,85	3.078,50
cas K3		ML			
MURO DE 6	MURO DE BLOCK DE 15-20-40	M2	42	388,00	4.656,00
LOSA CARC	LOSA DE CONCRETO DE CONCRETO	M2	15,9	1.078,12	17.142,11
DALA CER 20-	DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 cms. CONCRETO f'c=210 kg/cm2	ML	7,5	314,84	2.361,30
1					
	CONSTRUCCION INTERIOR		1,00	194.371,16	194.371,16
	ACABADOS		1,00	82.428,97	82.428,97
OBRE MURO TA	SOBREMURO DE TABLAROCA DE HOJA BLANCA	M2	28,40	284,25	8.072,70
	FALSO PLAFON DE A BASE DE CANAL LISTON Y CANALETA DE CARGAS SOPORTADA DE LA ESTRUCTURA ESPACIADA @24"				
PLAFON H VERI		M2	29,00	278,07	8.064,03
MURO DUROCK	MUROS DE DUROCK 2 CARAS	M2	8,40	789,77	6.634,07
AISLANT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE R-11 DE FIBRA DE VIDRIO	M2	64,80	80,34	5.206,03
REN 1	RENIVELACION DE PISOS EXISTENTES	M2	47,00	160,00	7.050,00
CERAM CANVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	47,00	632,47	29.726,09
ZOCLO 10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE CERAMICA DE 10 CM	ML	77,00	132,49	10.201,73
1,36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA	M2	126,00	59,32	7.474,32
	CANCELERIA		1,00	20.656,36	20.656,36
TEMP*16	PUERTA DE 90*24 Y FIJO LATERAL DE 38*240 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	2,00	9.386,58	18.773,16
TEMP*20	VENTANA CORREDIZA DE 1*1 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIOS CLAROS D	PZ	1,00	1.883,20	1.883,20
	ELECTRICIDAD		1,00	16.002,16	16.002,16
SAL TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE	PZ	6,00	537,44	3.224,84
SAL ILUM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION	PZ	3,00	537,44	1.612,32
LAMP SIUNT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA CONSTRULITA RE8075BBCB	PZ	2,00	2.631,79	5.263,58
SPOT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT INTERIOR	PZ	1,00	1.028,84	1.028,84
TEMP*29	SUMINISTRO DE SALIDA PARA MINISPLIT,	PZ	2,00	2.436,39	4.872,78
	VOZ Y DATOS		1,00	2.567,88	2.567,88
SAL VOZ Y DAT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELEFONIA	PZ	6,00	427,88	2.567,88
	CLIMAS		1,00	42.595,37	42.595,37
TEMP*32	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON	PZ	2,00	21.297,68	42.595,37
	CONSTRUCCION EXTERIOR		1,00	22.512,89	22.512,89
IMP PAPEL	IMPERMEABILIZACION A BASE DE PAPEL MINERALIZADO	M2	15,00	188,32	2.824,80
133-1	APLANADO A BASE DE ENJARRE ACABDO FINO	M2	18,00	178,78	3.218,04
COL DUC 1	COLOCACION DE DUCTOS PARA VENTILACION DE CALDERA	LOTE	1,00	10.500,00	10.500,00
ESC MAR	ESCALERA MARINA	LOTE	1,00	5.970,05	5.970,05
	LIMPIEZA		1,00	7.607,54	7.607,54
LIMP GRUESA	LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL RPOCESO DE LA OBRA	M2	47,30	43,26	2.046,20
RET ESCOMBRC	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA OBRA	VIAJE	3,00	1.853,78	5.561,34

SUBTOTAL 1.638.367,83
IVA 16% 262.138,85
TOTAL PRESUPUESTO 1.900.506,68

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

CHIHUAHUA

ANEXO No. 1



Comision Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua.

Direccion:

Avenida Zarco, No. 2427, Colonia Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, Chih.

Telefono:

(614) 201-29-90 Al 95 con 6 Lineas.

(Lada sin Costo 01-800-201-1758)



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

C H I H U A H U A

ANEXO No. 2



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

Contratista:


Ing. José Luis Rodríguez Hernández.- Administrador único, Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V.

Residencia de Obra:

C. Felipe Fernando Dávila Rivas.- Residente de Obra por parte de la C.E.D.H.

C. Carlos Vargas Ortega.- Auxiliar de Residente de Obra por parte de la C.E.D.H

Este documento se anexa al Contrato de Obra Pública No. CEDH 01A/2020, suscrito el 18 de Febrero del Ejercicio Fiscal 2020, relativo a: La Remodelación y Rehabilitación del Área de "Atención y Quejas, Área de Caldera y Bodega", de las Oficinas Centrales y sus accesorios, en la Ciudad de Chihuahua, Chih.



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RODRIGUEZ
HERNANDEZ
JOSE LUIS

FECHA DE NACIMIENTO
28/10/1979

SEXO H




DOMICILIO
C CAMPO DEL AGOSTADERO 5823
FRACC CORDILLERAS 31124
CHIHUAHUA, CHIH.

CLAVE DE ELECTOR RDHRLS79102809H400

CURP ROHL791028HCHDRS17 AÑO DE REGISTRO 1998 03

ESTADO 08 MUNICIPIO 019 SECCION 3206

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



IFE

DLP

[Signature]
COMISIONADO EJECUTIVO GENERAL
REGISTRADO FEDERAL DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1162155737<<3206059771044
7910281H2412311MEX<03<<10678<3
RODRIGUEZ<HERNANDEZ<<JOSE<LUIS



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

C H I H U A H U A

ANEXO No. 3



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS
 LADA SIN COSTO 01-800-201-1758
 E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx
 www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

PRESUPUESTO DE REMODELACION DE OFICINAS DE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE ESTA CIUDAD CHIHUAHUA.


CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
PRESUPUESTO REMODELACION CEDH		1.00		
PRELIMINARES		1.00		
INTERIOR		1.00		
1.21 TRAZO Y NIVELACION	M2	130.10		
TEMP*1 DEMOLICION DE MUROS DE MUROS DE TABLAROCA	M2	34.28		
TEMP*3 DESMONTAR Y DESCONEXION DE SISTEMA ELECTRICO	LOTE	1.00		
TEMP*2 DESMONTAR CANCELERIA	LOTE	1.00		
TEMP*26 DEMOLICION DE PARED Y REPARACION DE HUECO PARA CALDERA	LOTE	1.00		
TEMP*27 RETIRO DE MINISPLIT	PZ	3.00		
TEMP*39 DEMOLICION DE PARED PARA HACER PUERTA, INLCUYE PERFILADO DE HUEC EXTERIOR	PZ	2.00		
TEMP*4 DESMONTAR REJAS METALICAS	PZ	9.00		
TEMP*5 DESMONTAR BARANDAL Y REJA DE ACCESO	PZ	1.00		
TEMP*6 DESMONTAR PORTON ELECTRICO	PZ	1.00		
TEMP*7 DEMOLICIONES EN FACHADA (tablaroca, molduras de pretil y ventanas)	LOTE	1.00		
TEMP*8 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO PARA HACER ACCESO A OFICINAS	M2	1.00		
TEMP*9 RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	M2	56.00		
TEMP*10 RETIRO DE ABULTADO LADRILLO DE FACHADA EN AREA DE COCHERA	M2	6.72		
TEMP*11 RETIRO DE FACHALETA DE LADRILLO PARA LA COLOCAION DE BARANDAL	ML	13.00		
TEMP*28 DEMOLICION Y REUBICACION DE ESCALONES PARA ACCESO A SUBESTACION CONSTRUCCION INTERIOR	M2	1.00		
ACABADOS		1.00		
OBRE MURO TA SOBREMURO DE TABLAROCA DE HOJA BLANCA	M2	90.20		
MURO TABL 2 CAR MURO DE TABLA ROCA DE DOS CARAS A BASE DE HOJA DE TABLAROCA DE 1/2" SUJETO ACANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL 25 COLOCADA VERTICALMENTE @ 24" (0.61M) LAS HOJAS DE TABLA ROCA DEBERAN UNIRSE UNAS A OTRAS DE MANERA NO QUEDEN FORZADAS EN LAS JUNTAS	M2	34.10		
PLAFON H VERI FALSO PLAFON DE A BASE DE CANAL LISTON Y CANALETA DE CARGAS SOPORTADA DE LA ESTRUCTURA ESPACIADA @24"	M2	130.10		
CAJ 1 CAJILLOS DE TABLAROCA A BASE DE HOJA DE TABLAROCA DE 1/2" SUJETO ACANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL 25	ML	32.27		
ANT 1 ANTEPECHO DE TABLAROCA EN PUERTA Y VENTANAS DE CANCELERIA	ML	6.51		
AISLANT SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE R11 DE FIBRA DE VIDRIO	M2	124.30		
CERAM CANVA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	130.10		
ZOCLO 10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE CERAMICA DE 10 CM	ML	105.40		
1.36 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRABAJOS EN BAÑO	M2	366.50		
DESM1 DESMONTAR JUEGO DE SANITARIOS	LOTE	1.00		
INST SANIT INSTALACION DE SANITARIOS	LOTE	1.00		
SUM SANIT SUMINISTRO DE SANITARIO	PZ	1.00		
SUM LAV SUMINISTRO DE LAVABO, INC MEZCLADORA	PZ	1.00		
SUM MING SUMINISTRO DE MINGITORIO,	PZ	1.00		
TEMP*9 RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	M2	3.45		
CERAM CANVA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	3.45		
PUERT 1 DESMONTAR PUERTA EXISTENTE E INSTALAR PUERTA NUEVA DE MADERA SALIDA AL AUDITORIO	LOTE	1.00		
TEMP*9 RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	M2	2.70		
CERAM CANVA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	2.70		

PUERT 2	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 36*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM		
CER AUD 1	QUITAR CERAMICAS EXISTENTES	PZ	1
CER AUD 2	COLOCACION DE CERAMICAS	PZ	30
	AREA DE ESCALERAS	PZ	30
RET TAP	RETIRO DE PAPEL TAPIZ EN PISO Y MUROS		1.00
TERM MUR	TERMINACION DE MUROS CON CON APLANADO DE YESO	LOTE	1.00
MOD BAR	MODIFICACION DE BARANDAL	M2	82.40
PUERT 3	SUMINISTRO DE PUERTAS CON REJILLAS INFERIOR	LOTE	1.00
PUERT 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINADA PARA EXTERIOR	PZ	2.00
SUM CERAM 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN ESCALERAS	PZ	1.00
1.36	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	LOTE	1.00
VENT ESC 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2.00 X 1.00 DE VIDRIO DE 6MM ACCESO	M2	82.40
		PZ	1.00
SUM BAR 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL PARA DISCAPACITADOS		1.00
SUM MICR 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROPERFORADO EN COLOR DORADO	LOTE	1.00
SUM MICR 2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROPERFORADO EN COLOR ROJO	LOTE	1.00
SUM CORT 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE ACERO METALICA	LOTE	1.00
	OFICINAS COLINDANTES		1.00
AD 1	CAMBIO DE GIRO DE PUERTA (inc cambio de marco, recorte de vidrio y colocacion d	LOTE	1.00
AD 2	SUMINISTRO DE PAPEL ARENADO EN PUERTAS	LOTE	2.00
AD 3	SUMINISTRO Y COLOCAION DE PAPEL ARENADO EN VENTANAS	LOTE	2.00
	CANCELARIA		1.00
	SALA DE JUNTAS		1.00
TEMP*13	FIJO CLARO DE 98*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00
TEMP*14	FIJO CLARO DE 79*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00
TEMP*38	PUERTA DE 80*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00
	CUBICULO 5		1.00
TEMP*37	FIJO CLARO DE 283X220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00
TEMP*38	PUERTA DE 80*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00
	CUBICULO 4		1.00
TEMP*15	VENTANA DE 90*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00
TEMP*16	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 36*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00
	CUBICULO 3		1.00
TEMP*17	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 36*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00
	PASILLO		1.00
TEMP*18	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 51*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00
TEMP*38	PUERTA DE 80*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00
	CUBICULO 2		1.00
TEMP*22	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 165*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00
	CUBICULO 1		1.00
TEMP*23	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 165*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00
	REECEPCION		1.00
TEMP*20	VENTANA CORREDIZA DE 1.75*0.40 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIOS CLAROS DE 6MM	PZ	2.00
TEMP*36	VENTANAL FIJO DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 mm 480*220 INLCUYE PUERTA DE	PZ	1.00
AD ARE 1	SUMINISTRO DE PAPEL ARENADO EN PUERTAS	PZ	3.00
AD ARE 2	SUMINISTRO Y COLOCAION DE PAPEL ARENADO EN VENTANAS	PZ	7.00
	ELECTRICIDAD		1.00
SAL TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE	PZ	29.00
SAL ILUM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION	PZ	33.00
LAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA GENERAL ELECTRIC INTERIOR SUSP LED60W100-240V400K5400LM	PZ	6
LAMP SJUNT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EN SALA DE JUNTAS CONSTRUITA	PZ	1
SPOT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT INTERIOR	PZ	26
TEMP*29	SUMINISTRO DE SALIDA PARA MINISPLIT	PZ	11.00
TEMP*30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA	PZ	1.00
TEMP*30A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINISPLITS EN AREA DE AZOTEA	PZ	1.00
	VOZ Y DATOS		1.00

SAL TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE CCTV	PZ	2.00
TEMP*40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CCTV CLIMAS	PZ	3.00
TEMP*31	INSTALACION DE MINISPLIT EXISTENTE	PZ	1.00
TEMP*33	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TON	PZ	2.00
TEMP*32	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON	PZ	1.00
DEM 1	DEMOLICION DE PISO Y SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA CONSENSADOS CARPINTERIA	LOTE	8.00
	FABRICACION DE MUEBLE PARA RECEPCION DE MADERA DE MDF ACABADO		1.00
TEMP*34	MELANIMADO, MURO Y PLAFON DE MDF, FIJO DE ALUMINIO DE 2" CON VIDRIO DE 6MM	LOTE	1.00
	CONSTRUCCION EXTERIOR		1.00
	ALBAÑILERIAS		1.00
ALB 2	CASTILLOS DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTR	ML	9.00
1.28	DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 cms. CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CERRAMIENTO EN DESPLANTE DE MUROS DE BLOCK	ML	6.00
MURO DE 6	MURO DE BLOCK DE 6" CON VAR. NO. 3@ 80 CM CON CONCRETO DE 150 KG/C	M2	15.90
1.23	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR	M3	6.99
061018	Firme de 10 cm, de espesor, de concreto f'c= 200 kg/cm2 acabado llana metalica, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye materiales, acerreos, preparacion de la superficie, nivelacion, cimbrado colado, Mano de obra, equipo y herramienta.	M2	46.59
TEMP*25	MODIFICACION DE BAJADA PLUVIAL	LOTE	1.00
REG 1	REGISTRO SANITARIO EN RAMPA DE ACCESO ACABADOS	PZA	1.00
1.33-1	APLANADO A BASE ENJARRE ACABADO FIJO	M2	1.00
CANTERA 40*10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA DE 40*40 COLOR PIÑON	M2	27.30
TEMP*24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL	M2	64.62
PUERT 5	PUERTA DE SERVICIO PARA CUARTO ELECTRICO	PZ	1.00
REJ 1	REJAS GRANDES 1.2 *1.5 M	PZ	2.00
REJ 2	REJAS PEQUEÑAS .3*.8M	PZ	1.00
MURO DUROCK	MUROS DE DUROCK 2 CARAS	M2	6.60
1.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA	M2	132.00
TEMP*35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUCUBOND LIMPIEZA	LOTE	1.00
LIMP GRUESA	LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL RPOCESO DE LA OBRA	M2	130.10
RET ESCOMBRC	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA OBRA	VIAJES	6.00
	OFICINAS AREA DE CALDERA		1.00
	PRELIMINARES		1.00
	INTERIOR		1.00
1.21	TRAZO Y NIVELACION	M2	47.30
TEMP*3	DESMONTAR Y DESCONEXION DE SISTEMA ELECTRICO	LOTE	1.00
TEMP*12	QUITAR VENTANA	PZ	1.00
TEMP*19	DESMANTELAMIENTO DE CALDERA	LOTE	1.00
TEMP*002	DEMOLICION DE MUROS DE MUROS DE TABLAROCA	M2	17.25
TEMP*27	RETIRO DE MINISPLIT	PZ	2.00
TEMP*4	DESMONTAR REJAS METALICAS	PZ	2.00
TEMP*6	DESMONTAR TECHUMBRE MUROS, DALAS Y CASTILLOS	PZ	1.00
cas K3	CASTILLO K2 DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 cms. CON CONCRETO FC 200 KG/CM2	ML	10
MURO DE 6	MURO DE BLOCK DE 15-20-40	M2	12
LOSA CARC	LOSA DE CONCRETO DE CONCRETO	M2	15.9
DALA CER 20-	DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 cms. CONCRETO f'c=210 kg/cm2	ML	7.5
1	CONSTRUCCION INTERIOR		1.00
	ACABADOS		1.00
DBRE MURO TA	SOBREMURO DE TABLAROCA DE HOJA BLANCA	M2	28.40
	FALSO PLAFON DE A BASE DE CANAL LISTON Y CANALETA DE CARGAS SOPORTADA DE LA ESTRUCTURA ESPACIADA @24"	M2	29.00
PLAFON H VERL			
MURO DUROCK	MUROS DE DUROCK 2 CARAS	M2	8.40
AISLANT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE R11 DE FIBRA DE VIDRIO	M2	64.80
REN 1	RENIVELACION DE PISOS EXISTENTES	M2	47.00

ZOCLO 10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE CERAMICA DE 10 CM	ML	77.00
1.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA	M2	126.00
	CANCELERIA		1.00
TEMP*16	PUERTA DE 90*24 Y FIJO LATERAL DE 36*240 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	2.00
TEMP*20	VENTANA CORREDIZA DE 1*1 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIOS CLAROS DE ELECTRICIDAD	PZ	1.00
			1.00
SAL TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE	PZ	6.00
SAL ILUM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION	PZ	3.00
LAMP SJUNT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA CONSTRULITA RE8075B8CB	PZ	2.00
SPOT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT INTERIOR	PZ	1.00
TEMP*29	SUMINISTRO DE SALIDA PARA MINISPLIT	PZ	2.00
	VOZ Y DATOS		1.00
SAL VOZ Y DAT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELEFONIA	PZ	6.00
	CLIMAS		1.00
TEMP*32	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON	PZ	2.00
	CONSTRUCCION EXTERIOR		1.00
IMP PAPEL	IMPERMEABILIZACION A BASE DE PAPEL MINERALIZADO	M2	15.00
1.33-1	APLANADO A BASE DE ENJARRE ACABDO FINO	M2	18.00
COL DUC 1	COLOCACION DE DUCTOS PARA VENTILACION DE CALDERA	LOTE	1.00
ESC MAR	ESCALERA MARINA	LOTE	1.00
	LIMPIEZA		1.00
LIMP GRUESA	LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL RPOCESO DE LA OBRA	M2	47.30
RET ESCOMBRC	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA OBRA	VIAJE	3.00

SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL PRESUPUESTO



C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

C H I H U A H U A

ANEXO No. 4



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

CHIHUAHUA CHIH. A 18 DE FEBRERO DE 2020

CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LA REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS, ÁREA DE CALDERA Y BODEGA", DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. ADJUDICADO DE MANERA DIRECTA, MEDIANTE ACUERDO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, EL LIC. NÉSTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA, A QUIEN EN LO SUCESIVO EN ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA COMISIÓN" Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL, "DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V." POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL C. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO EN ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", Y CONJUNTAMENTE "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1. "LA COMISIÓN" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:
 - 1.1 ES UN ORGANISMO PÚBLICO, DE CARÁCTER AUTÓNOMO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN ADELANTE "LA LEY".
 - 1.2 QUE A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ESTE CONTRATO, SU NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE DE "LA COMISIÓN" ESTÁ VIGENTE Y POR LO TANTO, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LXVI/NOMBR/0327/ 2019 II P.O.
 - 1.3 QUE EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** MEDIANTE ACUERDO DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN SU **SESION PRIMERA ORDINARIA**, DE FECHA **17 DE FEBRERO DE 2020** . PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LOS RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, SEGÚN LA PARTIDA PRESUPUESTAL, **6223 (RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN POR CONTRATO)** SEÑALADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE ESTA C.E.D.H.
2. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
 - 2.1 ES PERSONA MORAL, DE NACIONALIDAD MEXICANA, EN PLENO USO DE SUS FACULTADES, CON DOMICILIO EN: CALLE FRANCISCO PIMENTEL, #3108, COLONIA UNIVERSIDAD, C.P. 31203 CHIHUAHUA, CHIH.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

- 2.2 ES UNA PERSONA MORAL CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, DEDICADA A LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION DE INMUEBLES Y ACCESORIOS, PARA TAL EFECTO EXHIBE SU CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: DCC060124KS2.
- 2.3 DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA CORRECTA OPERACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, TALES COMO SERVICIO Y MANUALES TRANSPORTE Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO.
- 2.4 QUE CUENTA CON, Y EXHIBE, EL CERTIFICADO DE REGISTRO VIGENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO, PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
- 2.5 QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON "LA COMISIÓN", Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 102 DE LA LOPSM.
3. "LAS PARTES" CONJUNTAMENTE DECLARAN:
 - 3.1 QUE RESPECTIVAMENTE ACEPTAN LAS DECLARACIONES QUE VIERTEN EN ESTE CONTRATO Y SE RECONOCEN EN FORMA RECÍPROCA LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN Y CON QUE COMPARECEN A ESTE ACTO Y QUE ES SU DESEO CELEBRARLO Y OBLIGARSE, ACEPTANDO POR CONSIGUIENTE SOMETERSE A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA COMISIÓN" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ÉSTE A SU VEZ SE OBLIGA A SUMINISTRAR:

-LA REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS, AREA DE CALDERA Y BODEGA", DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.-

DESGLOSADO DE MANERA ESPECÍFICA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS COTIZADO, ADJUNTO AL PRESENTE CONTRATO QUE UNA VEZ FIRMADO POR AMBAS PARTES FORMARA PARTE DEL CUERPO DEL PRESENTE ESCRITO.

SEGUNDA.- PRECIO.- EL IMPORTE A PAGAR SE HARA POR ESTIMACION PRESENTADA SEGÚN EL AVANCE Y CRONOGRAMA DE OBRA, ESPECIFICANDOSE EL DESGLOSE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS COTIZADO, DANDO UN GRAN TOTAL DE \$1'900,506.64 PESOS M.N. (UN MILLÓN, NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 64/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EL CUAL DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD.

TERCERA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- PARA QUE LA OBLIGACIÓN DEL PAGO SE HAGA EXIGIBLE, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, MISMA QUE AMPARE LAS PARTES ESPECIFICADAS EN EL ANEXO.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

ECONOMICO 01 TERMINADAS, DE LA OBRA Y/O SERVICIOS ENTREGADOS, EN LOS TÉRMINOS Y FORMA ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO, A ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA COMISIÓN", ASÍ MISMO LOS COMPROBANTES FISCALES QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" DEBERÁN TENER DESGLOSADO EL I.V.A Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OTORGUEN A "LA COMISIÓN".

"LA COMISIÓN" PAGARÁ EL MONTO EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS), DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO, LA FECHA DE PAGO SE CORRERÁ EL MISMO NÚMERO DE DÍAS QUE DURE EL RETRASO. EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISIÓN, SITO EN AVE. ZARCO NO. 2427, COL. ZARCO C.P. 31020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DE LUNES A VIERNES DE 9:30 AM A 13:30 PM, EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTEN REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE NO ATENDER DICHA DISPOSICIÓN, "LA COMISIÓN" POSPONDRA A "EL CONTRATISTA" LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANE DICHA OMISIÓN.

"EL CONTRATISTA" PARA LA RECEPCIÓN DEL PAGO DEBERÁ PRESENTAR FOTOCOPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (INE, PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL) DE QUIEN RECIBE EL PAGO.

CUARTA.- VIGENCIA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, A ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA COMISION", OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SEGÚN EL AVANCE Y CRONOGRAMA DE OBRA.

QUINTA.- LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SE EXCEPTUA AL CONTRATISTA DE OTORGAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN VIRTUD DE LA NATURALEZA DE LA OPERACIÓN. **NO SE OTORGARA ANTICIPO EN EL PRESENTE CONTRATO,** POR LO QUE NO SERA NECESARIO EMITIR GARANTÍA EN FAVOR DE "LA COMISION" POR EL CONCEPTO DE ANTICIPO.

SEXTA.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO ANTE "LA COMISIÓN" A SUSCRIBIR CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS EN LA CALIDAD DE LA OBRA Y/O SERVICIOS Y AL REEMPLAZO DE LOS MISMOS POR OTROS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES SEÑALADAS EN EL ANEXO ECONOMICO 01, SIN NINGÚN COSTO PARA LA COMISION, ASÍ COMO DEL SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, ASÍ MISMO EXIME A "LA COMISION" DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, PENAL, CIVIL, O MERCANTIL, CON RESPECTO A LA OBRA Y/O SERVICIOS, EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A:

- A. A ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA, Y EN SU TOTALIDAD, LA OBRA Y/O SERVICIOS, Y ACCESORIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, MANTENER LA CALIDAD DE LOS MISMOS OFERTADOS Y EFECTUAR EN FORMA INMEDIATA LA REPARACION DE AQUELLOS QUE RESULTEN CON DEFECTOS O FALLAS, DE ACUERDO A LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DEL ANEXO ECONOMICO 01.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

- B. SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO. DE HACERLO EL CONTRATO QUE SUSCRIBA NO SURTIRÁ EFECTO ALGUNO EN CONTRA DE "LA COMISIÓN".
- C. SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA COMISION".

OCTAVA.- RESCISIÓN.- "LA COMISIÓN" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, CUANDO "EL CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

- A) NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.
- B) NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.
- C) SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.

PARA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DEBERÁ AGOTAR PREVIAMENTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

- I. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA NOTIFICADO EL DICTAMEN EN DONDE SE FUNDE Y MOTIVE EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
- II. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, EL ENTE PÚBLICO CONTARÁ CON UN PLAZO DE CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER LA PERSONA CONTRATISTA.
- III. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN LA FRACCIÓN ANTERIOR.
- IV. EL ENTE PÚBLICO, PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, EL CUAL DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.
- V. UNA VEZ NOTIFICADO POR EL ENTE PÚBLICO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, ESTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

LA PERSONA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A DEVOLVER AL ENTE PÚBLICO, EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS ENTES PÚBLICOS PODRÁN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, O BIEN, SE HAYA LLEGADO A UN ACUERDO ENTRE LAS PARTES.

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. "LA COMISIÓN", PODRÁ SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS RECURSOS QUE TENGA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", TERMINAR EL CONTRATO EN TODO O EN PARTE, MEDIANTE ESCRITO A "EL CONTRATISTA". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y/O SERVICIOS SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 0.3% DIARIO DEL MONTO TOTAL, O BIEN OPTAR POR LA RESCISIÓN.

NO SE APLICARÁN LAS PENAS AQUÍ SEÑALADAS, CUANDO EL ATRASO SEA POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PLENAMENTE JUSTIFICADO POR "EL CONTRATISTA", DEBIENDO PRESENTAR LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE POR ESCRITO, DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA LA ENTREGA Y ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTIME CONVENIENTE, "LA COMISIÓN" PODRÁ ACEPTAR O NO DICHA JUSTIFICACIÓN SEGÚN LO ESTIME CONVENIENTE.

DECIMA: AVISOS Y NOTIFICACIONES.- TODOS LOS AVISOS Y NOTIFICACIONES QUE "LAS PARTES" DEBAN DARSE EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO SE HARÁN POR ESCRITO, TALES AVISOS Y NOTIFICACIONES OBLIGARÁN A LOS CONTRATANTES CUANDO SEAN ENTREGADOS PERSONALMENTE O ENVIADOS POR MEDIOS QUE ASEGUREN LA RECEPCIÓN EFECTIVA DE LA NOTIFICACIÓN COMO PRUEBA DE LA MISMA, Y SEAN DEBIDAMENTE DIRIGIDOS A LA PARTE QUE CORRESPONDA A SU ÚLTIMO DOMICILIO MANIFESTADO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL CUAL HASTA EN TANTO NO EXISTA COMUNICACIÓN EN CONTRARIO, DEBERÁ ENTENDERSE QUE ES EL SIGUIENTE:

SI ES A "LA COMISIÓN": SITO CON DOMICILIO EN AVE. ZARCO NO. 2427, COL. ZARCO C.P. 31125, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

SI ES PARA "EL CONTRATISTA": CALLE FRANCISCO PIMENTEL, #3108, COLONIA UNIVERSIDAD, C.P. 31203 CHIHUAHUA, CHIH.

LOS AVISOS, NOTIFICACIONES O COMUNICACIONES PODRÁN SER ENTREGADOS O HECHOS A QUIEN SE DIRIJAN EN CUALQUIER LUGAR EN QUE EL DESTINATARIO O SU APODERADO O REPRESENTANTE CON FACULTADES SUFICIENTES SE ENCUENTRE, AUNQUE NO SEA EL DOMICILIO SEÑALADO EN ESTA CLÁUSULA, Y LOS AVISOS, NOTIFICACIONES O COMUNICACIONES ASÍ ENTREGADOS TENDRÁN EL MISMO VALOR Y EFICACIA QUE SI HUBIERAN SIDO ENTREGADOS EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "LAS PARTES" SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LAS LEYES APLICABLES Y A LOS TRIBUNALES ESTATALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A LA COMPETENCIA QUE PUDIERA CORRESPONDERLES CON MOTIVO DE SUS DOMICILIOS PRESENTE O FUTUROS O POR LA UBICACIÓN DE SUS BIENES.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO,
LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, EL DÍA
18 DE FEBRERO DE 2020.

POR LA COMISION:

LIC. NÉSTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA
PRESIDENTE DE LA CEDH. CHIHUAHUA.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATISTA:

C. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

C H I H U A H U A

ANEXO No. 5



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

CHIHUAHUA CHIH. A 18 DE FEBRERO DE 2020

CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LA REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS, ÁREA DE CALDERA Y BODEGA", DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. ADJUDICADO DE MANERA DIRECTA, MEDIANTE ACUERDO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, EL LIC. NÉSTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA, A QUIEN EN LO SUCESIVO EN ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA COMISIÓN" Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL, "DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V." POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL C. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO EN ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", Y CONJUNTAMENTE "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1. "LA COMISIÓN" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:
 - 1.1 ES UN ORGANISMO PÚBLICO, DE CARÁCTER AUTÓNOMO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN ADELANTE "LA LEY".
 - 1.2 QUE A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ESTE CONTRATO, SU NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE DE "LA COMISIÓN" ESTÁ VIGENTE Y POR LO TANTO, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LXVI/NOMBR/0327/ 2019 II P.O.
 - 1.3 QUE EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA MEDIANTE ACUERDO DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN SU SESION PRIMERA ORDINARIA, DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020 . PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LOS RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, SEGÚN LA PARTIDA PRESUPUESTAL, 6223 (RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN POR CONTRATO) SEÑALADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE ESTA C.E.D.H.
2. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
 - 2.1 ES PERSONA MORAL, DE NACIONALIDAD MEXICANA, EN PLENO USO DE SUS FACULTADES, CON DOMICILIO EN: CALLE FRANCISCO PIMENTEL, #3108, COLONIA UNIVERSIDAD, C.P. 31203 CHIHUAHUA, CHIH.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

- 2.2 ES UNA PERSONA MORAL CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, DEDICADA A LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION DE INMUEBLES Y ACCESORIOS, PARA TAL EFECTO EXHIBE SU CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: **DCC060124KS2**.
- 2.3 DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA CORRECTA OPERACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, TALES COMO SERVICIO Y MANUALES TRANSPORTE Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO.
- 2.4 QUE CUENTA CON, Y EXHIBE, EL CERTIFICADO DE REGISTRO VIGENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO, PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
- 2.5 QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON "LA COMISIÓN", Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 102 DE LA LOPSM.
3. "LAS PARTES" CONJUNTAMENTE DECLARAN:
 - 3.1 QUE RESPECTIVAMENTE ACEPTAN LAS DECLARACIONES QUE VIERTEN EN ESTE CONTRATO Y SE RECONOCEN EN FORMA RECÍPROCA LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN Y CON QUE COMPARECEN A ESTE ACTO Y QUE ES SU DESEO CELEBRARLO Y OBLIGARSE, ACEPTANDO POR CONSIGUIENTE SOMETERSE A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA COMISIÓN" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ÉSTE A SU VEZ SE OBLIGA A SUMINISTRAR:

-LA REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS, AREA DE CALDERA Y BODEGA", DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.-

DESGLOSADO DE MANERA ESPECÍFICA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS COTIZADO, ADJUNTO AL PRESENTE CONTRATO QUE UNA VEZ FIRMADO POR AMBAS PARTES FORMARA PARTE DEL CUERPO DEL PRESENTE ESCRITO.

SEGUNDA.- PRECIO.- EL IMPORTE A PAGAR SE HARA POR ESTIMACION PRESENTADA SEGÚN EL AVANCE Y CRONOGRAMA DE OBRA, ESPECIFICANDOSE EL DESGLOSE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS COTIZADO, DANDO UN GRAN TOTAL DE **\$1'900,506.64 PESOS M.N. (UN MILLÓN, NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 64/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO**, EL CUAL DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD.

TERCERA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- PARA QUE LA OBLIGACIÓN DEL PAGO SE HAGA EXIGIBLE, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, MISMA QUE AMPARE LAS PARTES ESPECIFICADAS EN EL ANEXO.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

ECONOMICO 01 TERMINADAS, DE LA OBRA Y/O SERVICIOS ENTREGADOS, EN LOS TÉRMINOS Y FORMA ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO, A ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA COMISIÓN", ASÍ MISMO LOS COMPROBANTES FISCALES QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" DEBERÁN TENER DESGLOSADO EL I.V.A Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OTORGUEN A "LA COMISIÓN".

"LA COMISIÓN" PAGARÁ EL MONTO EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS), DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO, LA FECHA DE PAGO SE CORRERÁ EL MISMO NÚMERO DE DÍAS QUE DURE EL RETRASO. EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISIÓN, SITO EN AVE. ZARCO NO. 2427, COL. ZARCO C.P. 31020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DE LUNES A VIERNES DE 9:30 AM A 13:30 PM, EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTEN REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE NO ATENDER DICHA DISPOSICIÓN, "LA COMISIÓN" POSPONDRA A "EL CONTRATISTA" LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANE DICHA OMISIÓN.

"EL CONTRATISTA" PARA LA RECEPCIÓN DEL PAGO DEBERÁ PRESENTAR FOTOCOPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (INE, PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL) DE QUIEN RECIBE EL PAGO.

CUARTA.- VIGENCIA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, A ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA COMISION", OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SEGÚN EL AVANCE Y CRONOGRAMA DE OBRA.

QUINTA.- LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SE EXCEPTUA AL CONTRATISTA DE OTORGAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN VIRTUD DE LA NATURALEZA DE LA OPERACIÓN. **NO SE OTORGARA ANTICIPO EN EL PRESENTE CONTRATO,** POR LO QUE NO SERA NECESARIO EMITIR GARANTÍA EN FAVOR DE "LA COMISION" POR EL CONCEPTO DE ANTICIPO.

SEXTA.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO ANTE "LA COMISIÓN" A SUSCRIBIR CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS EN LA CALIDAD DE LA OBRA Y/O SERVICIOS Y AL REEMPLAZO DE LOS MISMOS POR OTROS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES SEÑALADAS EN EL ANEXO ECONOMICO 01, SIN NINGÚN COSTO PARA LA COMISION, ASÍ COMO DEL SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, ASÍ MISMO EXIME A "LA COMISION" DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, PENAL, CIVIL, O MERCANTIL, CON RESPECTO A LA OBRA Y/O SERVICIOS, EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A:

- A. A ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA, Y EN SU TOTALIDAD, LA OBRA Y/O SERVICIOS, Y ACCESORIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, MANTENER LA CALIDAD DE LOS MISMOS OFERTADOS, Y EFECTUAR EN FORMA INMEDIATA LA REPARACION DE AQUELLOS QUE RESULTEN CON DEFECTOS O FALLAS, DE ACUERDO A LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DEL ANEXO ECONOMICO 01.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

- B. SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO. DE HACERLO EL CONTRATO QUE SUSCRIBA NO SURTIRÁ EFECTO ALGUNO EN CONTRA DE "LA COMISIÓN".
- C. SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA COMISION".

OCTAVA.- RESCISIÓN.- "LA COMISIÓN" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, CUANDO "EL CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

- A) NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.
- B) NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.
- C) SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.

PARA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DEBERÁ AGOTAR PREVIAMENTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

- I. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA NOTIFICADO EL DICTAMEN EN DONDE SE FUNDE Y MOTIVE EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
- II. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, EL ENTE PÚBLICO CONTARÁ CON UN PLAZO DE CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER LA PERSONA CONTRATISTA.
- III. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN LA FRACCIÓN ANTERIOR.
- IV. EL ENTE PÚBLICO, PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, EL CUAL DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.
- V. UNA VEZ NOTIFICADO POR EL ENTE PÚBLICO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, ESTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

LA PERSONA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A DEVOLVER AL ENTE PÚBLICO, EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS ENTES PÚBLICOS PODRÁN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, O BIEN, SE HAYA LLEGADO A UN ACUERDO ENTRE LAS PARTES.

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. "LA COMISIÓN", PODRÁ SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS RECURSOS QUE TENGA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", TERMINAR EL CONTRATO EN TODO O EN PARTE, MEDIANTE ESCRITO A "EL CONTRATISTA". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y/O SERVICIOS SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 0.3% DIARIO DEL MONTO TOTAL, O BIEN OPTAR POR LA RESCISIÓN.

NO SE APLICARÁN LAS PENAS AQUÍ SEÑALADAS, CUANDO EL ATRASO SEA POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PLENAMENTE JUSTIFICADO POR "EL CONTRATISTA", DEBIENDO PRESENTAR LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE POR ESCRITO, DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA LA ENTREGA Y ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTIME CONVENIENTE, "LA COMISIÓN" PODRÁ ACEPTAR O NO DICHA JUSTIFICACIÓN SEGÚN LO ESTIME CONVENIENTE.

DECIMA: AVISOS Y NOTIFICACIONES.- TODOS LOS AVISOS Y NOTIFICACIONES QUE "LAS PARTES" DEBAN DARSE EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO SE HARÁN POR ESCRITO, TALES AVISOS Y NOTIFICACIONES OBLIGARÁN A LOS CONTRATANTES CUANDO SEAN ENTREGADOS PERSONALMENTE O ENVIADOS POR MEDIOS QUE ASEGUREN LA RECEPCIÓN EFECTIVA DE LA NOTIFICACIÓN COMO PRUEBA DE LA MISMA, Y SEAN DEBIDAMENTE DIRIGIDOS A LA PARTE QUE CORRESPONDA A SU ÚLTIMO DOMICILIO MANIFESTADO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL CUAL HASTA EN TANTO NO EXISTA COMUNICACIÓN EN CONTRARIO, DEBERÁ ENTENDERSE QUE ES EL SIGUIENTE:

SI ES A "LA COMISIÓN": SITO CON DOMICILIO EN AVE. ZARCO NO. 2427, COL. ZARCO C.P. 31125, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

SI ES PARA "EL CONTRATISTA": CALLE FRANCISCO PIMENTEL, #3108, COLONIA UNIVERSIDAD, C.P. 31203 CHIHUAHUA, CHIH.

LOS AVISOS, NOTIFICACIONES O COMUNICACIONES PODRÁN SER ENTREGADOS O HECHOS A QUIEN SE DIRIJAN EN CUALQUIER LUGAR EN QUE EL DESTINATARIO O SU APODERADO O REPRESENTANTE CON FACULTADES SUFICIENTES SE ENCUENTRE, AUNQUE NO SEA EL DOMICILIO SEÑALADO EN ESTA CLÁUSULA, Y LOS AVISOS, NOTIFICACIONES O COMUNICACIONES ASÍ ENTREGADOS TENDRÁN EL MISMO VALOR Y EFICACIA QUE SI HUBIERAN SIDO ENTREGADOS EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "LAS PARTES" SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LAS LEYES APLICABLES Y A LOS TRIBUNALES ESTATALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A LA COMPETENCIA QUE PUDIERA CORRESPONDERLES CON MOTIVO DE SUS DOMICILIOS PRESENTE O FUTUROS O POR LA UBICACIÓN DE SUS BIENES.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020.

POR LA COMISION:

LIC. NÉSTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA
PRESIDENTE DE LA CEDH. CHIHUAHUA.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATISTA:

C. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

C H I H U A H U A

ANEXO No. 6



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 25/ago./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2113-000854 a la 2113-000854)

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ago./2020

hora de Impresión 10:56 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
2113-000854												
P00529	11/03/2020			DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV			DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	\$0.00	\$1,900,506.64	\$1,900,506.64	\$0.00	
C00462	11/03/2020	2880		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	2880		GD Folio: 52 (2880 - Obra Pública : REM/OFN/AS/PRINC - REMODELACION OFICII	\$0.00	\$217,857.28	\$217,857.28	\$217,857.28	
P00531	18/03/2020			DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV			GP Folio: 49 (PAGO F/2880 - Obra Pública : REM/OFN/AS/PRINC - REMODELACION OFICII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00463	18/03/2020	2881		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	2881		GD Folio: 53 (2881 - Obra Pública : REM/OFN/AS/PRINC - REMODELACION OFICII	\$0.00	\$326,391.78	\$326,391.78	\$326,391.78	
P00537	26/03/2020			DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV			GP Folio: 50 (F/2881 - Obra Pública : REM/OFN/AS/PRINC - REMODELACION OFICII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00466	27/03/2020	2890		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	2890		GD Folio: 54 (2890 - Obra Pública : REM/OFN/AS/PRINC - REMODELACION OFICII	\$0.00	\$210,222.32	\$210,222.32	\$210,222.32	
P00562	08/04/2020			DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV			GP Folio: 51 (F/2890 - Obra Pública : REM/OFN/AS/PRINC - REMODELACION OFICII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00486	08/04/2020	2908		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	2908		GD Folio: 57 (2908 - Obra Pública : REM/OFN/AS/PRINC - REMODELACION OFICII	\$0.00	\$256,542.48	\$256,542.48	\$256,542.48	
P00672	04/05/2020			DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV			GP Folio: 54 (F/2908 ESTIMACION 4 - Obra Pública : REM/OFN/AS/PRINC - REMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00574	04/05/2020	2930		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	2930		GD Folio: 67 (2930 - Obra Pública : REM/OFN/AS/PRINC - REMODELACION OFICII	\$0.00	\$447,256.04	\$447,256.04	\$447,256.04	
P00772	01/06/2020			DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV			GP Folio: 64 (2930 - Obra Pública : REM/OFN/AS/PRINC - REMODELACION OFICII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
P00773	01/06/2020	2971		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	2971		GD Folio: 83 (2971 - Obra Pública : REM/OFN/AS/PRINC - REMODELACION OFICII	\$0.00	\$294,027.53	\$294,027.53	\$294,027.53	
C00677	03/06/2020	2971		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	2971		GD Folio: 84 (2971 - Obra Pública : REM/OFN/AS/PRINC - REMODELACION OFICII	\$0.00	\$148,209.21	\$148,209.21	\$442,236.74	
				DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV			GP Folio: 80 (2971 - Obra Pública : REM/OFN/AS/PRINC - REMODELACION OFICII	\$442,236.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Total :

0.00 1,900,506.64 1,900,506.64 0.00



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

C H I H U A H U A

ANEXO No. 7

30 DE JUNIO DEL 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y ÁREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS

I. LUGAR, FECHA Y HORA DONDE SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 30 DE JUNIO DEL 2020 EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS UBICADA EN LA AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO, JARDINES DEL SANTUARIO.

LA PRESENTE REUNIÓN TIENE COMO OBJETO, RECIBIR POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ENTREGAR POR PARTE DE EL CONTRATISTA, LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA SEÑALADA Y DE ACUERDO CON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO ORIGINAL PARA "LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y ÁREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS".

ESTE PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN INICIA MEDIANTE EL AVISO DE TERMINACIÓN REALIZADO POR LA EMPRESA EN FECHA 22 DE JUNIO DE 2020 DE MANERA VERBAL, SOLICITANDO LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y A PARTIR DE ÉSTA, SE LLEVA A CABO LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LA OBRA, DEL RECORRIDO DE REVISIÓN NO SE DESPRENDEN OBSERVACIONES EN CUANTO A LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83, 84 Y 85 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y RESERVÁNDOSE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR VICIOS OCULTOS; MAL FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES, Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, QUE NO FUERAN DETECTADOS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON PARA ESTE ACTO, ASÍ COMO, EN SU CASO, PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO O CUALQUIER OTRO ADEUDO A DETERMINAR A EL CONTRATISTA. ASIMISMO, EN ESTE DÍA SE LLEVÓ A CABO LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPO QUE SE SUMINISTRARON.

II. NOMBRE DEL RESPONSABLE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y DE LA SUPERVISOR Y DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EL C. CP. RAFAEL VALENZUELA LICON

EL CONTRATISTA GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONSTRUCTORA

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.

EL ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

LA SUPERVISIÓN DE OBRA

EL C. ARQ. CARLOS OLIVAS SALCEDO




EL RESIDENTE DE OBRA

EL C. ARQ. CARLOS VARGAS ORTEGA

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

LA DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA DETALLADA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO ORIGINAL, ASÍ COMO EN EL FINIQUITO O, POR LO QUE EN EL PRESENTE INSTRUMENTO SE MENCIONAN, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, COMO PARTE DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- EQUIPOS (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA).
- REFRIGERACIÓN.
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
- OBRA CIVIL.
- CANCELERÍAS.
- EQUIPO SANITARIO.



IV. IMPORTE CONTRACTUAL.

IMPORTE: \$ 1, 900, 506.64 IVA INCLUIDO

V. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON.


PLAZO DE EJECUCIÓN: 125 DÍAS NATURALES

PLAZO ORIGINAL: 26 DE FEBRERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020



FECHA REAL TÉRMINO: 20 DE JUNIO DE 2020

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA INSTALACIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

SIN NADA MÁS QUE TRATAR Y SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2020 LO FIRMAN DE CONFORMIDAD TODAS LAS PERSONAS QUE EN ELLAS INTERVINIERON Y PREVIA LECTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO ESTANDO DE ACUERDO CON SU CONTENIDO.




Carlos Vargas



ENTREGA DE LOS TRABAJOS POR EL CONTRATISTA

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.



EL ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



EL C. CP. RAFAEL VALENZUELA LICON

SUPERVISIÓN DE OBRA




ARQ. CARLOS OLIVAS SALCEDO



RESIDENTE DE OBRA



ARQ. CARLOS VARGAS ORTEGA



diseños y construcciones civiles s.a. de c.v.

Comisión Estatal de
los Derechos Humanos
Chihuahua

ARCHIVO

11 FEB 2020
Recibido

**PRESUPUESTO DE REMODELACION DE OFICINAS DE COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS DE ESTA CIUDAD CHIHUAHUA.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
PRESUPUESTO REMODELACION CEDH		1,00	60.269,58	1.388.729,73
PRELIMINARES		1,00	58.645,32	58.645,32
INTERIOR		1,00	30.761,57	30.761,57
1,21 TRAZO Y NIVELACION	M2	130,10	19,50	2.536,95
TEMP*1 DEMOLICION DE MUROS DE MUROS DE TABLAROCA	M2	34,28	175,66	6.021,62
TEMP*3 DESMONTAR Y DESCONEXION DE SISTEMA ELECTRICO	LOTE	1,00	6.034,35	6.034,35
TEMP*2 DESMONTAR CANCELERIA	LOTE	1,00	5.260,65	5.260,65
TEMP*26 DEMOLICION DE PARED Y REPARACION DE HUECO PARA CALDERA	LOTE	1,00	4.735,80	4.735,80
TEMP*27 RETIRO DE MINISPLIT	PZ	3,00	974,56	2.923,68
TEMP*39 DEMOLICION DE PARED PARA HACER PUERTA. INCLUYE PERFILADO DE HUECO EXTERIOR	PZ	2,00	1.624,26	3.248,52
TEMP*4 DESMONTAR REJAS METALICAS	PZ	9,00	749,70	6.747,30
TEMP*5 DESMONTAR BARANDAL Y REJA DE ACCESO	PZ	1,00	2.923,67	2.923,67
TEMP*6 DESMONTAR PORTON ELECTRICO	PZ	1,00	2.536,39	2.536,39
TEMP*7 DEMOLICIONES EN FACHADA (tablaroca, molduras de perfil y ventanas)	LOTE	1,00	4.160,65	4.160,65
TEMP*8 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO PARA HACER ACCESO A OFICINAS	M2	1,00	2.698,82	2.698,82
TEMP*9 RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	M2	55,00	65,07	3.643,92
TEMP*10 RETIRO DE ABULTADO LADRILLO DE FACHADA EN AREA DE COCHERA	M2	6,72	97,59	655,80
TEMP*11 RETIRO DE FACHAleta DE LADRILLO PARA LA COLOCAION DE BARANDAL	ML	13,00	97,59	1.268,67
TEMP*28 DEMOLICION Y REDUBICACION DE ESCALONES PARA ACCESO A SUBESTACIO	M2	1,00	3.248,52	3.248,52
CONSTRUCCION INTERIOR		1,00	971.763,37	971.763,37
ACABADOS		1,00	214.542,08	214.542,08
OBRE MURO TA SOBREMURO DE TABLAROCA DE HOJA BLANCA	M2	90,20	284,25	25.639,35
MURO TABL 2 CAR MURO DE TABLA ROCA DE DOS CARAS A BASE DE HOJA DE TABLAROCA DE 1/2" SUJETO ACANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL 25 COLOCADA VERTICALMENTE @ 24" (0.61M). LAS HOJAS DE TABLA ROCA DEBERAN UNIRSE UNAS A OTRAS DE MANERA NO QUEDEN FORZADAS EN LAS JUNTAS	M2	34,10	383,11	13.064,05
PLAFON H VERC FALSO PLAFON DE A BASE DE CANAL LISTON Y CANALETA DE CARGAS SOPORTADA DE LA ESTRUCTURA ESPACIADA @ 24"	M2	130,10	278,07	36.176,91
CAJ 1 CAJILLOS DE TABLAROCA A BASE DE HOJA DE TABLAROCA DE 1/2" SUJETO ACANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL 25	ML	32,27	284,24	9.172,42
ANT 1 ANTEPECHO DE TABLAROCA EN PUERTA Y VENTANAS DE CANCELERIA	ML	6,51	386,10	2.513,51
AISLANT SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE R11 DE FIBRA DE VIDRIO	M2	124,30	80,34	9.986,26
CERAM CANVA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	130,10	632,47	82.284,35
ZOCLO 10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE CERAMICA DE 10 CM	ML	105,40	132,49	13.964,45
1,36 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	M2	366,50	59,32	21.740,78
TRABAJOS EN BAÑO		1,00	11.206,51	11.206,51
DESMI DESMONTAR JUEGO DE SANITARIOS	LOTE	1,00	500,00	500,00
INST SANIT INSTALACION DE SANITARIOS	LOTE	1,00	1.100,00	1.100,00
SUM SANIT SUMINISTRO DE SANITARIO	PZ	1,00	850,00	850,00
SUM LAV SUMINISTRO DE LAVABO, INC. MEZCLADORA	PZ	1,00	1.200,00	1.200,00
SUM MING SUMINISTRO DE MINGITORIO	PZ	1,00	1.150,00	1.150,00
TEMP*9 RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	M2	3,45	65,07	224,49

CERAM CANVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	3,45	632,47	2.192,02
PUERT 1	DESMONTAR PUERTA EXISTENTE E INSTALAR PUERTA NUEVA DE MADERA	LOTE	1,00	4.000,00	4.000,00
	SALIDA AL AUDITORIO		1,00	16.069,94	16.069,94
TEMP*9	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	M2	2,70	65,07	175,69
CERAM CANVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	2,70	632,47	1.707,67
PUERT 2	PUERTA DE 90*220 Y FJO LATERAL DE 36*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1	9.386,58	9.386,58
CER AUD 1	QUITAR CERAMICAS EXISTENTES	PZ	30	80,00	2.400,00
CER AUD 2	COLOCACION DE CERAMICAS	PZ	30	80,00	2.400,00
	AREA DE ESCALERAS		1,00	42.995,97	42.995,97
RET TAP	RETIRO DE PAPEL TAPIZ EN FISO Y MUROS	LOTE	1,00	2.000,00	2.000,00
TERM MUR	TERMINACION DE MUROS CON CON APLANADO DE YESO	M2	82,40	45,00	3.709,00
MOD BAR	MODIFICACION DE BARANDAL	LOTE	1,00	3.800,00	3.800,00
PUERT 3	SUMINISTRO DE PUERTAS CON REJILLAS INFERIOR	PZ	2,00	4.550,00	9.100,00
PUERT 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINADA PARA EXTERIOR	PZ	1,00	4.000,00	4.000,00
SUM CERAM 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN ESCALERAS	LOTE	1,00	9500,00	9500,00
1,35	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	M2	82,40	59,32	4897,97
VENT ESC 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2.00 X 1.00 DE VIDRIO DE 6MM ACCESO	PZ	1,00	6.000,00	6.000,00
SUM BAR 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL PARA DISCAPACITADOS	LOTE	1,00	62.255,72	62.255,72
SUM MICR 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROPERFORADO EN COLOR DORADO	LOTE	1,00	6.000,00	6.000,00
SUM MICR 2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROPERFORADO EN COLOR ROJO	LOTE	1,00	5.530,00	5.530,00
SUM CORT 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE ACERO METALICA	LOTE	1,00	4.841,72	4.841,72
	OFICINAS COLINDANTES		1,00	45.884,00	45.884,00
AD 1	CAMBIO DE GIRO DE PUERTA (no cambio de marco, recorte de vidrio y colocacion de	LOTE	1,00	7.678,00	7.678,00
AD 2	SUMINISTRO DE PAPEL ARENADO EN PUERTAS	LOTE	2,00	1.310,00	2.620,00
AD 3	SUMINISTRO Y COLOCAION DE PAPEL ARENADO EN VENTANAS	LOTE	2,00	1.310,00	2.620,00
	CANCELARIA		1,00	193.071,17	193.071,17
	SALA DE JUNTAS		1,00	21.043,41	21.043,41
TEMP*13	FJO CLARO DE 99*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	6.119,95	6.119,95
TEMP*14	FJO CLARO DE 79*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	6.272,96	6.272,96
TEMP*38	PUERTA DE 80*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM CUBICULO 5	PZ	1,00	8.650,50	8.650,50
TEMP*37	FJO CLARO DE 283*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	21.420,50	21.420,50
TEMP*38	PUERTA DE 80*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM CUBICULO 4	PZ	1,00	12.770,00	12.770,00
TEMP*15	VENTANA DE 90*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	16.094,58	16.094,58
TEMP*16	PUERTA DE 90*220 Y FJO LATERAL DE 36*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM CUBICULO 3	PZ	1,00	5.708,00	5.708,00
TEMP*17	PUERTA DE 90*220 Y FJO LATERAL DE 36*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	10.386,58	10.386,58
				\$ 10.380,69	\$ 10.380,69
TEMP*18	PASILLO		1,00	10.380,69	10.380,69
TEMP*38	PUERTA DE 90*220 Y FJO LATERAL DE 51*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	\$ 19.031,39	\$ 19.031,39
TEMP*38	PUERTA DE 80*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM CUBICULO 2	PZ	1,00	10.380,69	10.380,69
TEMP*22	PUERTA DE 90*220 Y FJO LATERAL DE 165*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM CUBICULO 1	PZ	1,00	8.650,70	8.650,70
TEMP*23	PUERTA DE 90*220 Y FJO LATERAL DE 165*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	\$ 15.477,10	\$ 15.477,10
				\$ 15.477,10	\$ 15.477,10
TEMP*20	RECEPCION		1,00	15.477,10	15.477,10
TEMP*36	VENTANA CORREDIZA DE 1.75*0.40 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIOS CLAROS DE 6MM	PZ	1,00	\$ 74.146,40	\$ 74.146,40
AD ARE 1	VENTANAL FJO DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 mm 490*220 INCLUYE PUERTA D	PZ	2,00	1.983,20	3.966,40
AD ARE 2	SUMINISTRO DE PAPEL ARENADO EN PUERTAS	PZ	1,00	57.080,00	57.080,00
	SUMINISTRO Y COLOCAION DE PAPEL ARENADO EN VENTANAS	PZ	3,00	1.310,00	3.930,00
	ELECTRICIDAD	PZ	7,00	1.310,00	9.170,00
SAL TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE	PZ	1,00	\$ 130.838,55	\$ 130.838,55
			29,00	537,44	15.585,76

SAL ILLUM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION	PZ	33,00	537,44	17.735,52
LAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA GENERAL ELECTRIC INTERIOR SUSP LED60W/100-240V/400K/5400LM	PZ	6	2.631,79	15.790,74
LAMP SJUNT SPOT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EN SALA DE JUNTAS CONSTRUCT.	PZ	1	2.631,79	2.631,79
TEMP*29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT INTERIOR	PZ	26	1.028,84	26.749,84
TEMP*30	SUMINISTRO DE SALIDA PARA MINISPLIT	PZ	11,00	2.436,39	26.800,29
TEMP*30A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA	PZ	1,00	12.772,31	12.772,31
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINISPLITS EN AREA DE AZOTEA	PZ	1,00	12.772,31	12.772,31
	VOZ Y DATOS		1,00	\$ 6.638,62	\$ 6.638,62
SAL VOZ Y DAT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELEFONIA	PZ	13,00	427,98	5.563,74
SAL TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE	PZ	2,00	537,44	1.074,88
	CCTV		1,00	\$ 2.550,27	\$ 2.550,27
TEMP*40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CCTV	PZ	3,00	850,09	2.550,27
	CLIMAS		1,00	\$ 213.296,54	\$ 213.296,54
TEMP*31	INSTALACION DE MINISPLIT EXISTENTE	PZ	2,00	6.497,04	12.994,08
TEMP*33	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TON	PZ	1,00	27.071,00	27.071,00
TEMP*32	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON	PZ	8,00	21.297,68	170.381,46
DEM 1	DEMOLICION DE PISO Y SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA CONDENSADOS	LOTE	1,00	2.850,00	2.850,00
	CARPINTERIA		1,00	\$ 70.620,00	\$ 70.620,00
TEMP*34	FABRICACION DE MUEBLE PARA RECEPCION DE MADERA DE MDF ACABADO MELANIMADO, MURO Y PLAFON DE MDF, RUJO DE ALUMINIO DE 2" CON VIDRIO DE 6MM	LOTE	1,00	70.620,00	70.620,00
	CONSTRUCCION EXTERIOR		1,00	\$ 358.321,04	\$ 358.321,04
	ALBAÑILERIAS		1,00	\$ 35.223,97	\$ 35.223,97
ALB 2	CASTILLOS DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTR	ML	9,00	420,78	3.787,02
1,28	DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 cms. CONCRETO f'c=210 kg/cm2. CERRAMIENTO EN DESPLANTE DE MUROS DE BLOCK	ML	6,00	326,85	1.961,10
MURO DE 6	MURO DE BLOCK DE 6" CON VAR. NO. 3 @ 80 CM CON CONCRETO DE 150 KG/C	M2	15,90	493,60	7.848,24
1,23	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR	M3	6,99	441,60	3.066,78
061018	Firma de 10 cm. de espesor, de concreto f'c= 200 kg/cm2 acabado lisa metalica, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye materiales, acerros, preparacion de la superficie, nivelacion, cimbrado colado. Mano de obra, equipo y herramienta.	M2	46,59	306,05	14.258,87
TEMP*25	MODIFICACION DE BAJADA PLUVIAL	LOTE	1,00	2.446,96	2.446,96
REG 1	REGISTRO SANITARIO EN RAMPA DE ACCESO	PZA	1,00	1.835,00	1.835,00
	ACABADOS		1,00	\$ 306.346,26	\$ 306.346,26
1,33-1	APLANADO A BASE ENJARRE ACABADO FIJO	M2	27,30	178,78	4.860,69
CANTERA 40*1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA DE 40*40 COLOR PIÑON	M2	27,30	737,32	20.128,84
TEMP*24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL	M2	64,62	1.606,02	103.781,01
PUERT 5	PUERTA DE SERVICIO PARA CUARTO ELECTRICO	PZ	1,00	5550,00	5.550,00
REJ 1	REJAS GRANDES 1.2 *1.5 M	PZ	2,00	3240,00	6.480,00
REJ 2	REJAS PEQUEÑAS 3' *2M	PZ	1,00	650,00	650,00
MURO DUROCK	MUROS DE DUROCK 2 CARAS	M2	6,60	789,77	5.212,48
1,36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA	M2	132,00	59,32	7.830,24
TEMP*35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUCUBOND	LOTE	1,00	151833,00	151833,00
	LIMPIEZA		1,00	\$ 16.750,81	\$ 16.750,81
LIMP GRUESA	LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL RPOCESO DE LA OBRA	M2	130,10	43,26	5.628,13
RET ESCOMBRC	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA OBRA	VIAJES	6,00	1.853,78	11.122,88
	OFICINAS AREA DE CALDERA		1,00	249.638,09	\$ 249.638,09
	PRELIMINARES		1,00	55.266,93	55.266,93
	INTERIOR		1,00	28.029,02	28.029,02
1,21	TRAZO Y NIVELACION	M2	47,30	15,09	713,76
TEMP*3	DESMONTAR Y DESCONEXION DE SISTEMA ELECTRICO	LOTE	1,00	4.872,78	4.872,78
TEMP*12	QUITAR VENTANA	PZ	1,00	974,56	974,56
TEMP*19	DESMANTELIAMIENTO DE CALDERA	LOTE	1,00	12.977,13	12.977,13
TEMP*002	DEMOLICION DE MUROS DE MUROS DE TABLAROCA	M2	17,25	162,66	2.805,89
TEMP*27	RETIRO DE MINISPLIT	PZ	2,00	974,56	1.949,12

TEMP*4	DESMONTAR REJAS METALICAS	PZ	2,00	649,70	1.299,40
TEMP*6	DESMONTAR TECHUMBRE	PZ	1,00	2.436,39	2.436,39
	MUROS, DALAS Y CASTILLOS		1,00	27.237,91	27.237,91
cas K3	CASTILLO K2 DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 cms. CON CONCRETO F'c 200 KG/CM2	ML	10	307,85	3.078,50
MURO DE 6	MURO DE BLOCK DE 15-20-40	M2	12	388,00	4.658,00
LOSA CARC	LOSA DE CONCRETO DE CONCRETO	M2	15,9	1.078,12	17.142,11
DALA CER 20-1	DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 cms. CONCRETO f'c=210 kg/cm2	ML	7,5	314,84	2.361,30
	CONSTRUCCION INTERIOR		1,00	194.371,16	194.371,16
	ACABADOS		1,00	82.428,97	82.428,97
OBRE MURO TA	SOBREMURO DE TABLAROCA DE HOJA BLANCA	M2	28,40	284,25	8.072,70
	FALSO PLAFON DE A BASE DE CANAL LISTON Y CANALETA DE CARGAS SOPORTADA DE LA ESTRUCTURA ESPACIADA @24"				
PLAFON H VERE		M2	29,00	278,07	8.084,03
MURO DUROCK	MUROS DE DUROCK 2 CARAS	M2	8,40	789,77	6.834,07
ASLANT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE R11 DE FIBRA DE VIDRIO	M2	64,80	80,34	5.208,03
REN 1	REVELACION DE PISOS EXISTENTES	M2	47,00	150,00	7.050,00
CERAM CANVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	47,00	632,47	29.728,09
ZOCLO 10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE CERAMICA DE 10 CM	ML	77,00	132,49	10.201,73
1.35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA	M2	126,00	59,32	7.474,32
	CANCELERIA		1,00	20.656,36	20.656,36
TEMP*16	PUERTA DE 90*24 Y FIJO LATERAL DE 36*240 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	2,00	9.386,58	18.773,16
TEMP*20	VENTANA CORREDIZA DE 1*1 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIOS CLAROS D	PZ	1,00	1.883,20	1.883,20
	ELECTRICIDAD		1,00	16.002,16	16.002,16
SALTOMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE	PZ	6,00	537,44	3.224,64
SAL ILLUM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION	PZ	3,00	537,44	1.612,32
LAMP SIJUNT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA CONSTRUJITA RE8075BBCB	PZ	2,00	2.631,79	5.263,58
SPOT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT INTERIOR	PZ	1,00	1.028,84	1.028,84
TEMP*29	SUMINISTRO DE SALIDA PARA MINISPLIT	PZ	2,00	2.438,39	4.876,78
	VOZ Y DATOS		1,00	2.567,88	2.567,88
SAL VOZ Y DAT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELEFONIA	PZ	6,00	427,98	2.567,88
	CLIMAS		1,00	42.595,37	42.595,37
TEMP*32	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON	PZ	2,00	21.297,68	42.595,37
	CONSTRUCCION EXTERIOR		1,00	22.512,89	22.512,89
IMP PAPEL	IMPERMEABILIZACION A BASE DE PAPEL MINERALIZADO	M2	15,00	188,32	2.824,80
1.33-1	APLANADO A BASE DE ENJARRE ACABO FINO	M2	18,00	178,78	3.218,04
COL DUC 1	COLOCACION DE DUCTOS PARA VENTILACION DE CALDERA	LOTE	1,00	10.500,00	10.500,00
ESC MAR	ESCALERA MARINA	LOTE	1,00	5.970,05	5.970,05
	LIMPIEZA		1,00	7.607,54	7.607,54
LIMP GRUESA	LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL RPOCESO DE LA OBRA	M2	47,30	43,28	2.046,20
RET ESCOMBRO	RETRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA OBRA	VIAJE	3,00	1.853,78	5.561,34

SUBTOTAL 1.638.367,83
IVA 16% 262.138,83
TOTAL PRESUPUESTO 1.900.506,66


ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

C H I H U A H U A

ANEXO No. 8



Chihuahua, Chih. A 30 de Junio del 2020.

Atn.- Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua.

Por medio del presente, “**las partes (Contratista y Director de Servicios Administrativos de la C.E.D.H.)**”, declaran la entrega, de los documentos generados durante la Obra Publica correspondiente al Contrato No. **CEDH 01A/2020**, de fecha 18 de Febrero del Ejercicio Fiscal 2020, relativo a: La Remodelación y Rehabilitación del Área de “Atención y Quejas, Área de Caldera y Bodega”, de las Oficinas Centrales y sus accesorios, en la Ciudad de Chihuahua, Chih. Como lo son:

- Planos Correspondientes a los Trabajos Ejecutados.
- Manuales e Instructivos de operación y mantenimientos correspondientes a los bienes instalados.
- Certificados de Garantía de Calidad y Funcionamiento de los bienes Instalados.
- Documentos de respaldo en digital (CD).

Lo anterior, se realiza en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, en la Dirección de Servicios Administrativos, quedando los documentos bajo resguardo de la misma.

Atentamente.-

**C.P. Rafael Valenzuela Licón.
Director de Servicios
Administrativos de la C.E.D.H.**

**Ing. José Luis Rodríguez Hernández.
Administrador Único de Diseños y
Construcciones Civiles S.A. de C.V.**



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

C H I H U A H U A


ANEXO No. 9



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

C H I H U A H U A

ANEXO No. 10



Chihuahua, Chih. A 30 de Junio del 2020.

C. Felipe Fernando Dávila Rivas.
Residente de Obra por La C.E.D.H.

Por medio del presente, me permito hacer entrega de los documentos generados por los trabajos ejecutados y descritos en el Contrato No. CEDH 01A/2020, a precios unitarios y tiempo determinado.

Dichos documentos, fueron entregados por un servidor al Residente de Obra de ese organismo (C.E.D.H.)

Sin otro Particular, quedamos a sus apreciables órdenes.

Atentamente.-


Ing. José Luis Rodríguez Hernández.
Administrador Único de Diseños y
Construcciones Civiles S.A. de C.V.



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

C H I H U A H U A

ANEXO No. 11



Chihuahua, Chih. A 30 de Junio del 2020.

**Atn.- Comisión Estatal de los Derechos
Humanos del Estado de Chihuahua.**


Por medio de la presente Bajo Protesta de Decir Verdad, **Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V.**, con Domicilio en Calle Francisco Pimentel, No. 3108, Col. Universidad, C.P. 31203, Chihuahua, Chih., Y RFC: **DCC060124KS2**. Se responsabiliza de los Defectos o Vicios Ocultos, por un monto equivalente al 10% del monto total ejercido en el Contrato de Obra Pública No. **CEDH 01A/2020**, suscrito el 18 de Febrero del Ejercicio Fiscal 2020, relativo a: La Remodelación y Rehabilitación del Área de "Atención y Quejas, Área de Caldera y Bodega", de las Oficinas Centrales y sus accesorios, en la Ciudad de Chihuahua, Chih.

Lo anterior en apego a lo estipulado en el Artículo 68°, Fracción IV y Artículo 85°, Primer Párrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

Sin otro Particular, quedamos a sus apreciables órdenes.

Atentamente.-

**Ing. José Luis Rodríguez Hernández.
Administrador Único de Diseños y
Construcciones Civiles S.A. de C.V.**



Usu: DianaTrevizo
 Rep rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00462 Del 11/03/2020

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2020
 02:00 p. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO F/2880 - Obra Pública : REM/OFNAS/PRINC - REMODELACION OFICINAS PRINCIPALES C.E.D.H. Contrato :. GP
 Folio: 49

Beneficiario: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110120-C0101-18-6223-2	Reconstrucción y remodelación por	\$217,857.28		GP Folio: 49
0002	8260-110120-C0101-18-6223-2	Reconstrucción y remodelación por		\$217,857.28	GP Folio: 49
0003	2113-000854	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES	\$217,857.28		GP Folio: 49
0004	1112-01-0001	BANAMEN 3513213 PPAL		\$217,857.28	GP Folio: 49
Sumas iguales =>			435,714.56	435,714.56	

C00462



BancaNet Empresarial

Miércoles 11 de Marzo de 2020, 10:27 AM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BANREGIO - 058150600168600110	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 217.857.28
	Fecha valor	11/03/2020
	Fecha de aplicación	Mismo Dia
	Número de referencia	110320
	Concepto del pago	EST No 1 TRAB DE REMODELACION RECEPCION
	Número de Autorización	054165
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

RFC: DCC060124KS2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31125
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 2880
Fecha: 6/3/2020 17:22:05

Datos del cliente:
Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5
Domicilio: Av. Zarco No. 2427, Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: 101 - Construcciones


Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad SAT, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 72102900, 1.00, E48, Servicio - PAGO DE ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION EN COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH., 187,808.00, 0.00, 002 - IVA - 30,049.28, 187,808.00

Observaciones

Importe con letra: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100

Subtotal: 187,808.00
Impuestos Trasladados: 30,049.28
Total: 217,857.28

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

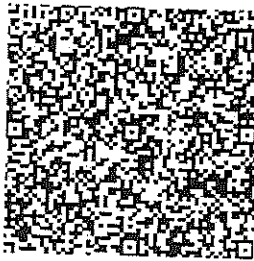

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408408629
Folio fiscal: CC3CEF8F-030C-4CDO-ABBB-F1F7C8C5FBF2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 6 2020 - 18:22:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
mnoih9US+TJJ9oAfpSsN4Z02PV5pQTIPe4ipWEOmMymHrh6xWhxMjfwgV/BqdOUVYzuE0r+FOYRU7L47FUOI
v2Wsjz1sWfgxjm0QLzp+IF5Dvh6vGXR7HnIKSRhdHllygFYCHQ+QTTz34rAgilLBOp55yWJ2IYAGsID5soyN8x
OZS6+Tvw/q9XfNrlF0Cjb+fx9zBLfQYdIA4+oah1RTfrMx5dvQDJh7bXmJ0DhIXIK9VKG/dvArRM7/tplkxkD
eGvKYjnsTsla4WASGUj38rN+170ItfL/Ou50BjplGOD/2Bf0g8F1k97HMXCuLWzaH6o/hE38C/PJWsFJvfQw==

Sello del SAT:
YEnWSJNo7r7WQnSySW2Qx/pUn9P/HWP0pFKWKK3u0LCeSPjBn926cwYSQghh4FRK2sWlIPggB6tPiy
GNrvhj4w2KTT7CX/+Zseeb1F9KDEns6o+oExLcGtP9yhiFQLQGQbUzrVsQJ3Xk5Xf/7ArjFJQGCo225T
D5EdJA/ovfhi5g/40IbhBzmCj+DuhRgcYAbQBUpleOwPlyjwo+at++2kdSdFLH4ZowTJELunplp5PF
QGh4Wj6KjEKCoihTR+Pz+OHXmRPYhw6yJwmZeK3aiHVTmA18BTzwaBtwM/UWQ3Dcwgtspx4RT3XeNoz
Ins10nIPa1GmOrOXmRAcIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|| 1.1 | CC3CEF8F-030C-4CDO-ABBB-F1F7C8C5FBF2 | 2020-03-06T18:22:07 | MAS0810247C0 | mnoi
wh9US+TJJ9oAfpSsN4Z02PV5pQTIPe4ipWEOmMymHrh6xWhxMjfwgV/BqdOUVYzuE0r+FOYRU7L47FU
Qiv2Wsjz1sWfgxjm0QLzp+IF5Dvh6vGXR7HnIKSRhdHllygFYCHQ+QTTz34rAgilLBOp55yWJ2IYAGsI
D5soyN8xOZS6+Tvw/q9XfNrlF0Cjb+fx9zBLfQYdIA4+oah1RTfrMx5dvQDJh7bXmJ0DhIXIK9VKG/d
vArRM7/tplkxDeGvKYjnsTsla4WASGUj38rN+170ItfL/Ou50BjplGOD/2Bf0g8F1k97HMXCuLWzaH6
o/hE38C/PJWsFJvfQw== | 00001000000404486074 |

Cta. dada de alta. 15:30 hrs
10/03/2020

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTROL DE ESTIMACIONES**

REMODELACION OFICINAS




DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.

OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y CUERPOS Y AREA DE CALDERIA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS
UBICACION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO
CONTRATISTA:	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.
ESTIMACION No.	1
PERIODO:	Del 26 al 10 de Marzo del Año 2020
FECHA FIDAJA:	sábado, 07 de marzo de 2020
No. DE CONTRATO:	S/N
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$ 1,638,367.83

CONCEPTO	GLOBAL A LA FECHA		PAGO ACUMULADO	POR EJERCER
	PAGO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
OBRA NORMAL:	\$	\$	\$	\$
MATERIALES:	\$	\$	\$	\$
CONTRATO FINAL:	\$	\$	\$	\$
OBRA EXCEDENTE:	\$	\$	\$	\$
OBRA EXTRAORDINARIA:	\$	\$	\$	\$
ESCALATORIA:	\$	\$	\$	\$
TOTAL:	\$	\$	\$	\$

ESTADO DE AVANCE		DATOS DEL ANTICIPO		RETENCIONES	
AVANCE PROGRAMADO:	11%	ANTICIPO OTORGADO	\$	IMPORTE RETENIDO ANTERIOR:	\$
AVANCE REAL:	11%	% DE I. V. A.:	0,00	ESTA RETENCION:	\$
AVANCE ESTA ESTIMACION:	11%	AVORTIZACION ACUMULADO ANTERIOR:	\$	RETENCION ACUMULADA:	\$
ESTADO DE CUENTA		ESTA AMORTIZACION	0,00		
IMPORTE PAGADO ANTERIOR:	\$	ANTICIPO OTORGADO:	\$		
IMPORTE ESTIMACION:	\$	ESTADO ACUMULADO:	\$		
IMPORTE ACUMULADO:	\$	ANTICIPO OTORGADO:	\$		
IMPORTE POR PAGAR:	\$	ANTICIPO OTORGADO (SALDO):	\$		

RESUMEN	
IMPORTE ESTA ESTIMACION:	\$ 187,808.00
IVA:	\$ 30,049.28
TOTAL A PAGAR:	\$ 217,857.28

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
 ARQ. CARLOS VARGAS ORTEGA RESIDENTE DE OBRA	 ARQ. CARLOS OLIVAS SALCEDO SUPERVISOR DE OBRA	 ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO			ESTIMACION	1
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	26/02/2020
	CONTRATO:	PARTIDA:	PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	INTERIOR	HOJA:	2	AL:	11/03/2020
	N/A			DE:	3	FECHA:	11/03/2020		

CONCEPTO

1,21	TRAZO Y NIVELACION
------	--------------------



Elaboró

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Autorizo

Carlos Ollivas Salcedo
Arq. Carlos Ollivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Vo. Bo.

Jose Eujis Rodriguez Hernandez


Ing. Jose Eujis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	INTERIOR	DE: 3
	N/A	PARTIDA:			
				HOJA: 3	DE: 3
				DEL: 26/02/2020	AL: 11/03/2020
					FECHA: 11/03/2020

CLAVE	CONCEPTO
-------	----------

1,21	TRAZO Y NIVELACION
------	--------------------

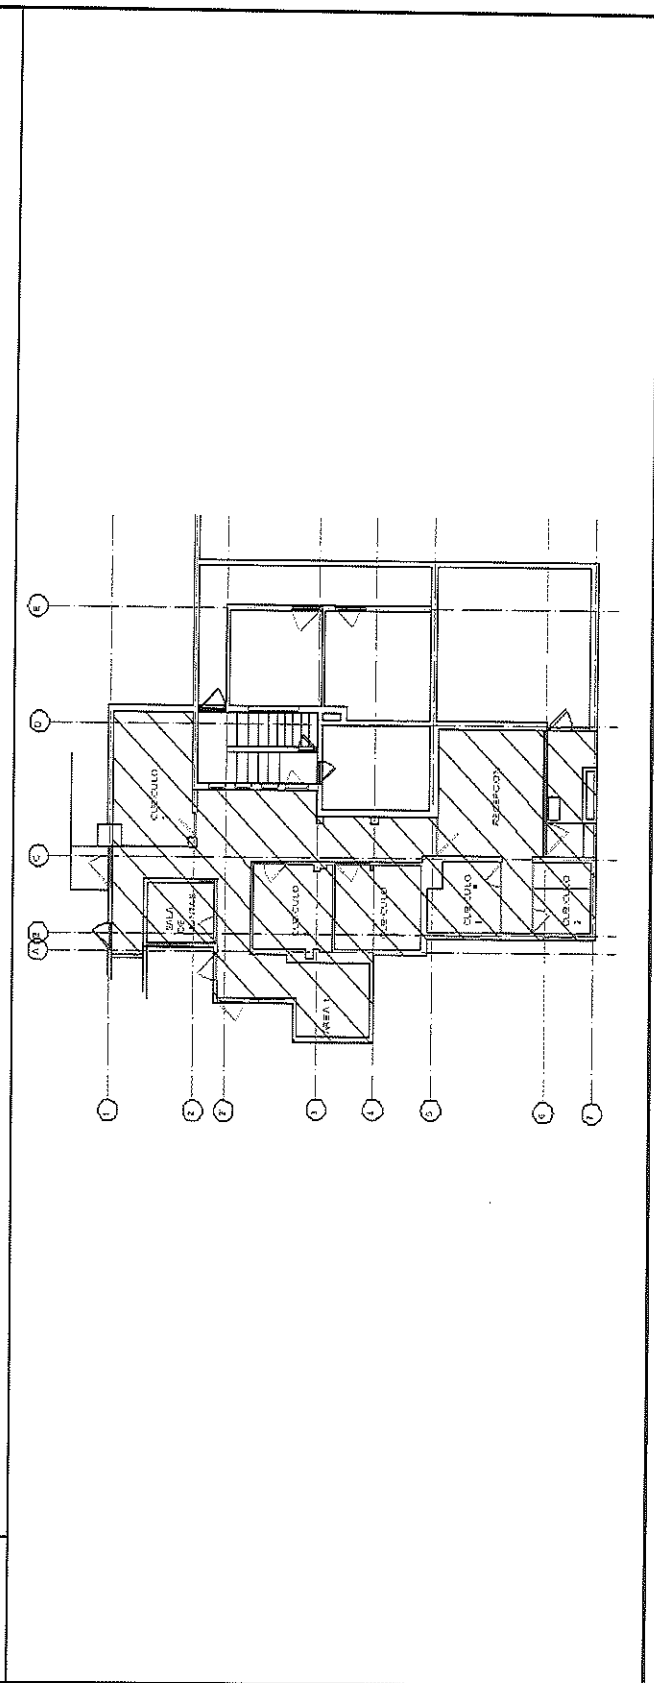

Elaboró

Carlos Vargas Orrego
Arq. Carlos Vargas Orrego
 Residente de Obra

Autorizo

Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Vs. Bo.


Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA




FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	1
	CONTRATO:	PARTIDA:	CHIHUAHUA	HOJA: 2	DEL: 26/02/2020
	N/A		SUBPARTIDA:	DE: 3	AL: 11/03/2020
		PRELIMINARES	INTERIOR		FECHA: 11/03/2020

GLAVE	CONCEPTO
-------	----------

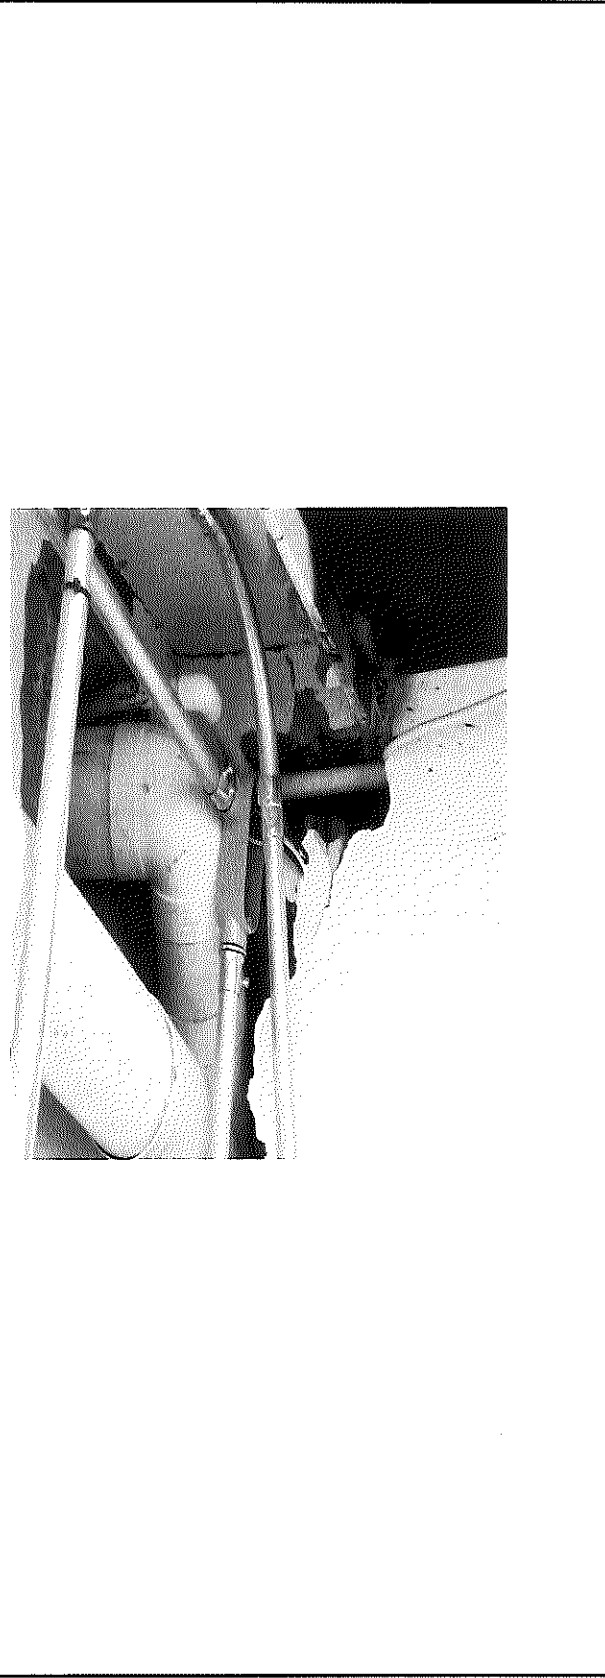TEMP*3	DESMONTAR Y DESCONEXION DE SISTEMA ELECTRICO
--------	--




Elaboró  Arq. Carlos Vargas Ortega Residente de Obra	Autorizo  Arq. Carlos Olivas Salcedo Supervisor de Obra	Vo. Bo.  Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA
--	--	--

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO			ESTIMACION	1
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE 'ATENCION Y QUEJAS' Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS ORIGINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	26/02/2020
	CONTRATO:		PARTIDA:	PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	INTERIOR	HOJA:	AL:	11/03/2020
	N/A				DE:	3		FECHA:	11/03/2020

CLAVE	CONCEPTO
-------	----------

TEMP'3	DES-MONTAR Y DES-CONEXION DE SISTEMA ELECTRICO
--------	--

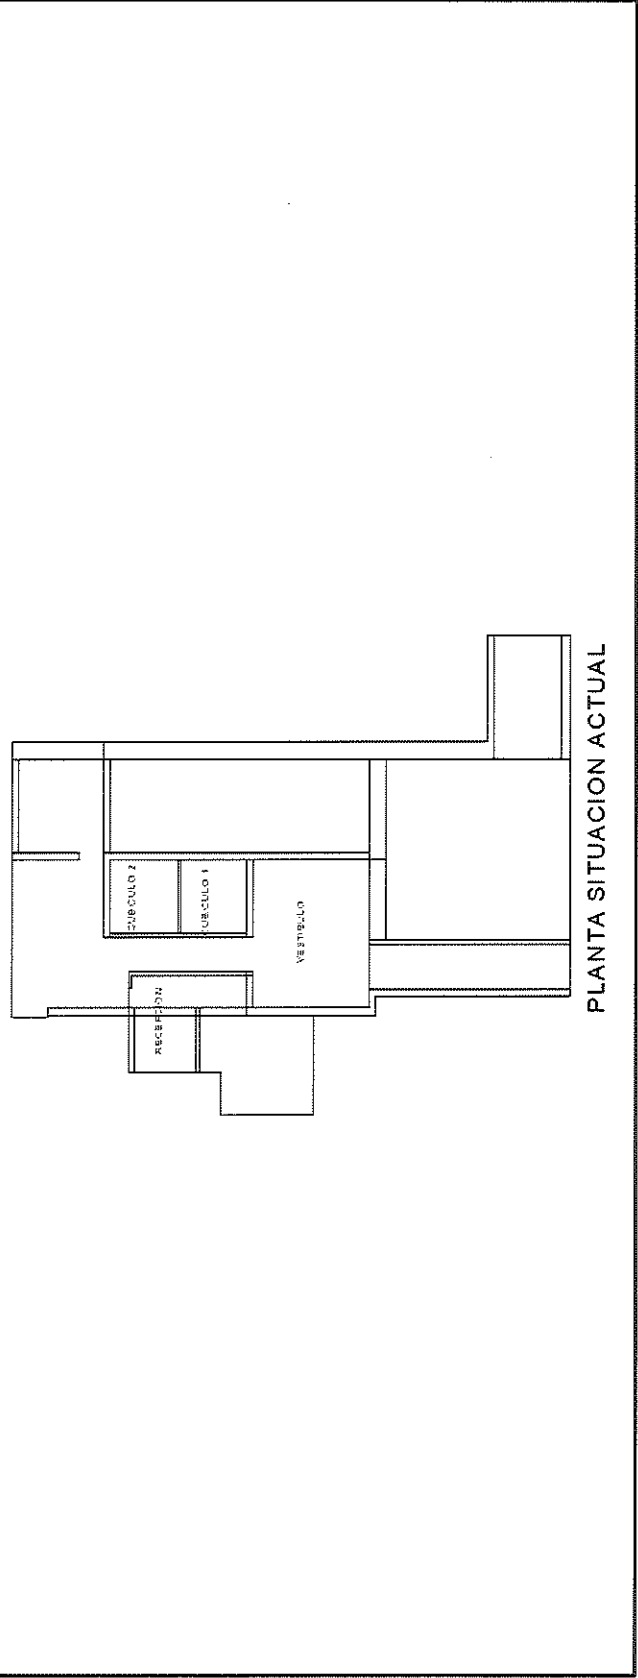

Elaboró

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Autorizo

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones/Civiles S.A de C.V. DICSA

Vo. Bo.

FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.		DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1		
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS		ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	26/02/2020	
	CONTRATO:	PARTIDA:	PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	INTERIOR	AL:	11/03/2020	FECHA:	11/03/2020
	N/A			HOJA: 2	DE: 3				
CLAVE	CONCEPTO								

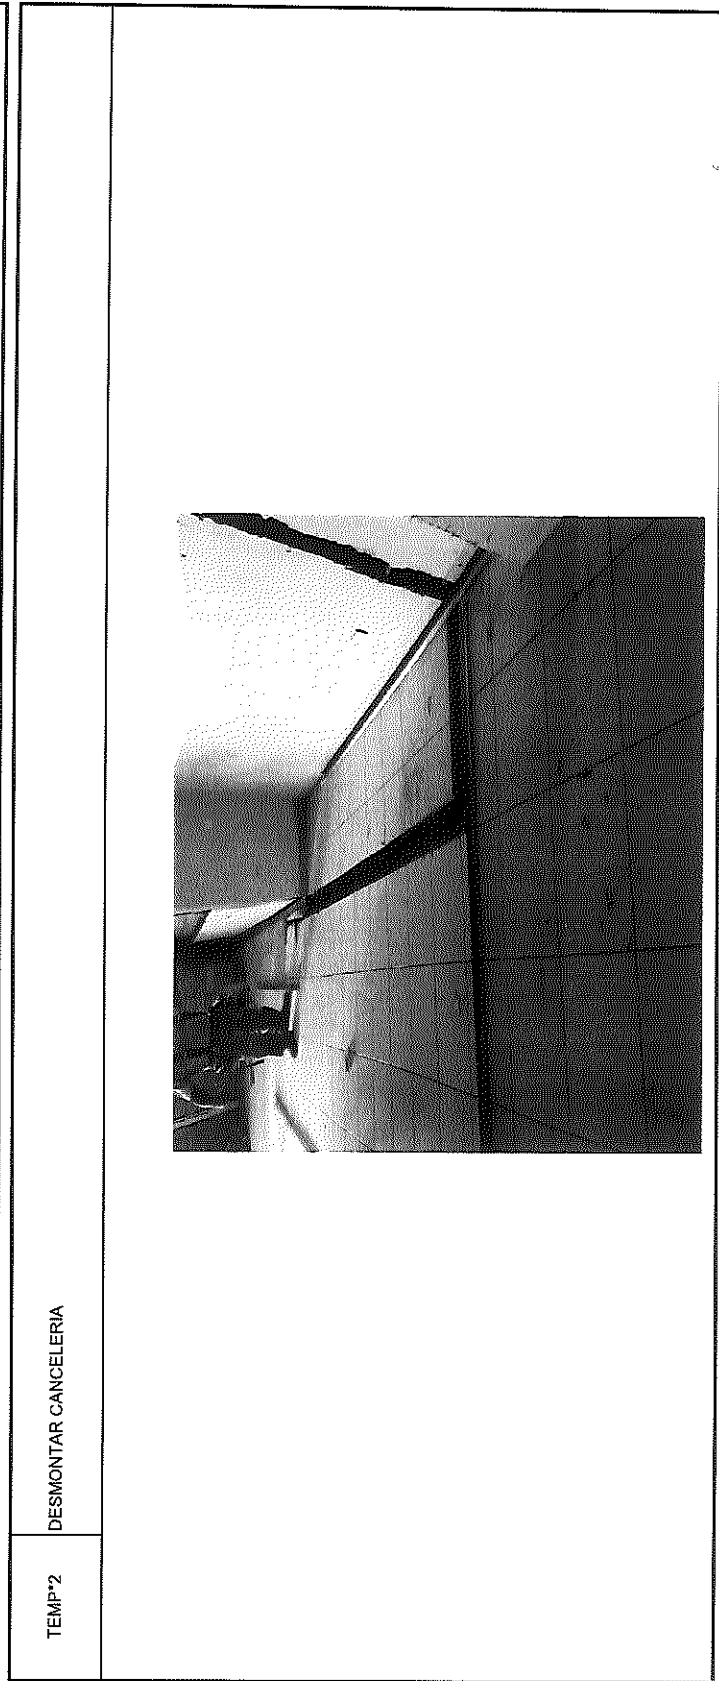

Elaboró

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Autorizo

Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Vo. Bo.


José Luis Rodríguez Hernández
Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO			ESTIMACION	1
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			CIUDAD:	CHIHUAHUA		MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
CONTRATO:				PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	INTERIOR	HOJA: 3	DEL: 26/02/2020	
N/A				PARTIDA:			AL: 11/03/2020	FECHA: 11/03/2020	

CLAVE	CONCEPTO
-------	----------

TEMP*2	DESMONTAR CANCELERIA
--------	----------------------

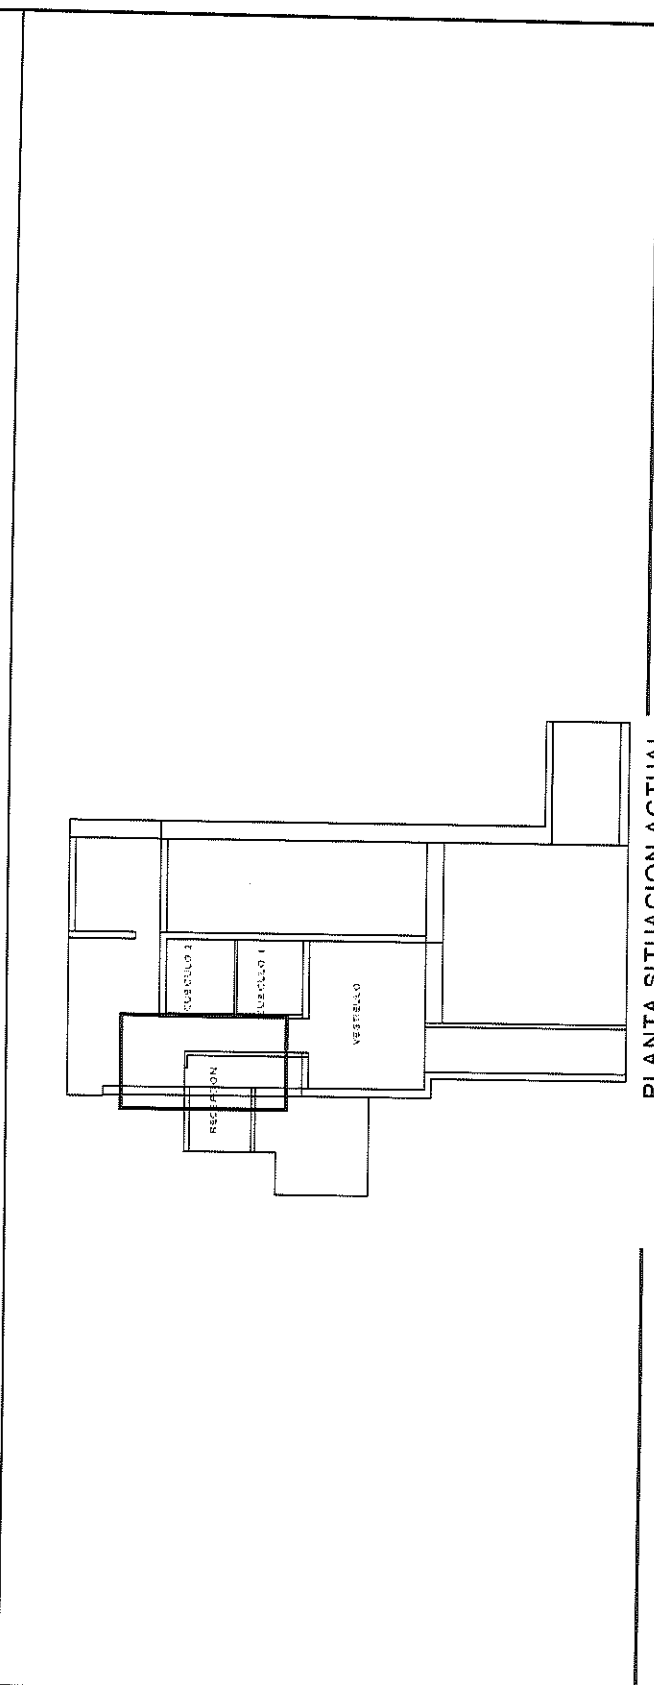

PLANTA SITUACION ACTUAL
Autorizo

Elaboró

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Vo. Bo.

[Signature]

Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra


Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEROS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/02/2020
CONTRATO:	N/A	PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	INTERIOR	HOJA: 2	AL: 11/03/2020
					DE: 3	FECHA: 11/03/2020

CONCERTO

TEMP-26	DEMOLICION DE PARED Y REPARACION DE HUECO PARA CALDERA
---------	--

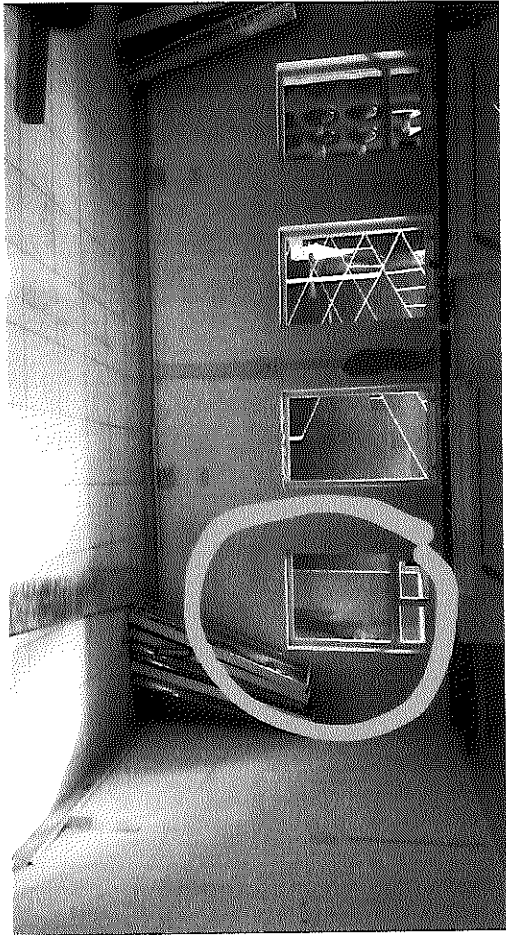

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños Y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	28/02/2020
			CONTRATO:		PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	INTERIOR
N/A	FECHA:	11/03/2020					
CONCEPTO							
CLAVE							

TEMP+28	DEMOLICION DE PARED Y REPARACION DE HUECO PARA CALDERA
---------	--

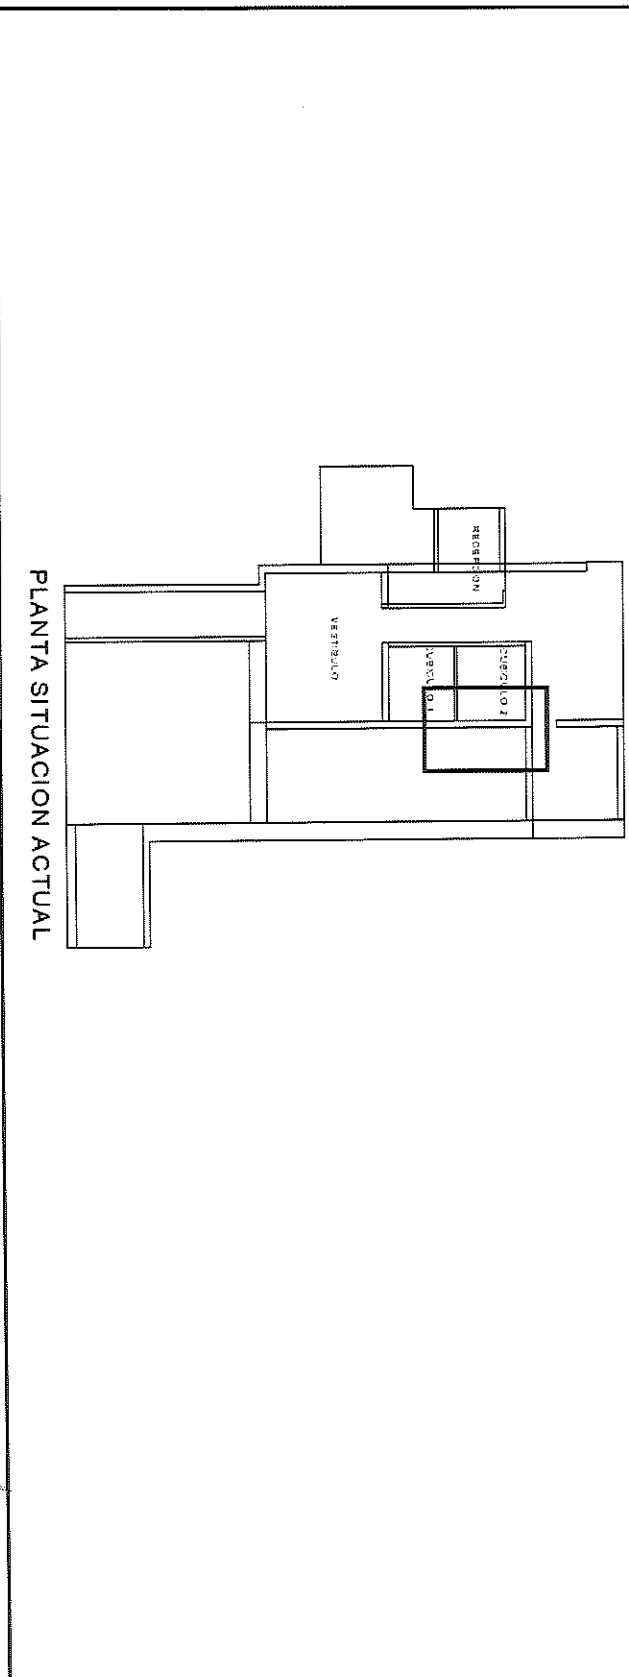

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernández
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/02/2020
CONTRATO:	N/A	PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	EXTERIOR	HOJA: 2	AL: 11/03/2020
					DE: 3	FECHA: 11/03/2020
CLAVE	CONCEPTO					

TEMP*4	DES-MONTAR REJAS METALICAS
--------	----------------------------

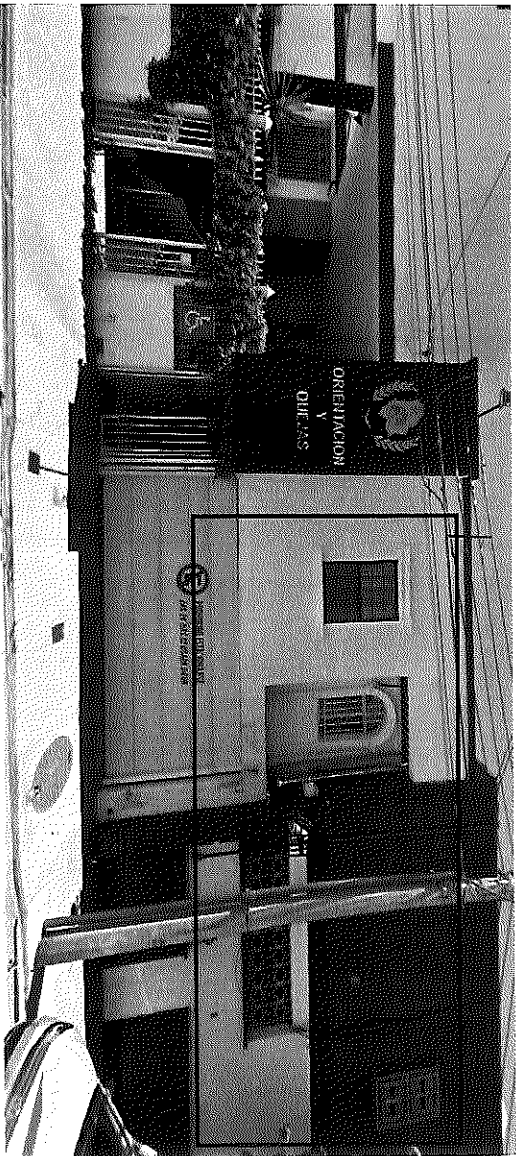

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra


[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 26/02/2020
CONTRATO:		PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	EXTERIOR	HOJA: 3	AL: 11/03/2020
	N/A				DE: 3	FECHA: 11/03/2020

CONCEPTO

TEMP*4	DESMONTAR RELAS METALICAS
--------	---------------------------

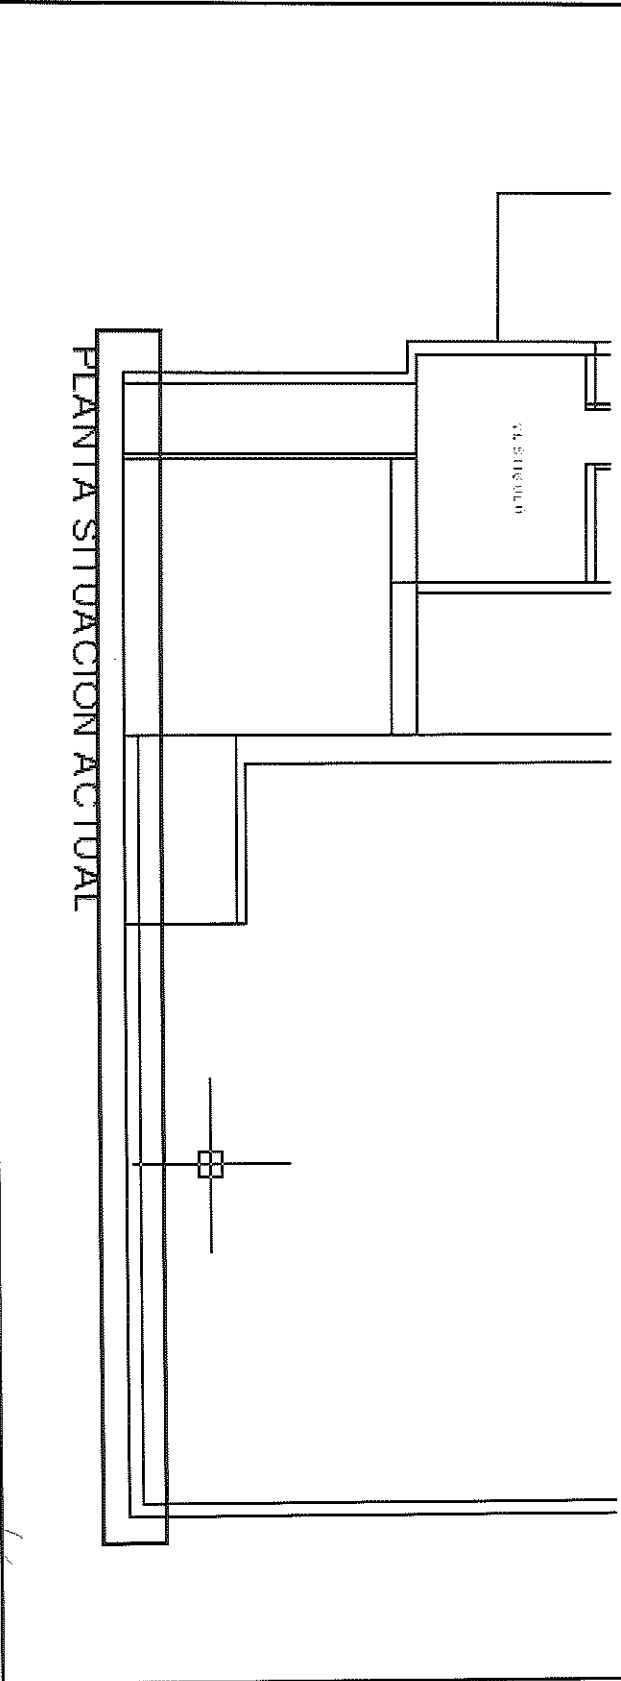

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo!

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra


Jose Luis Rodríguez Hernández
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	28/02/2020
						AL:	11/03/2020
CONTRATO:		PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	EXTERIOR	HOJA: 3	FECHA:	11/03/2020
N/A							

CONCRETO

CLAVE	
TEMP*6	DESMONTAR PORTON ELECTRICO

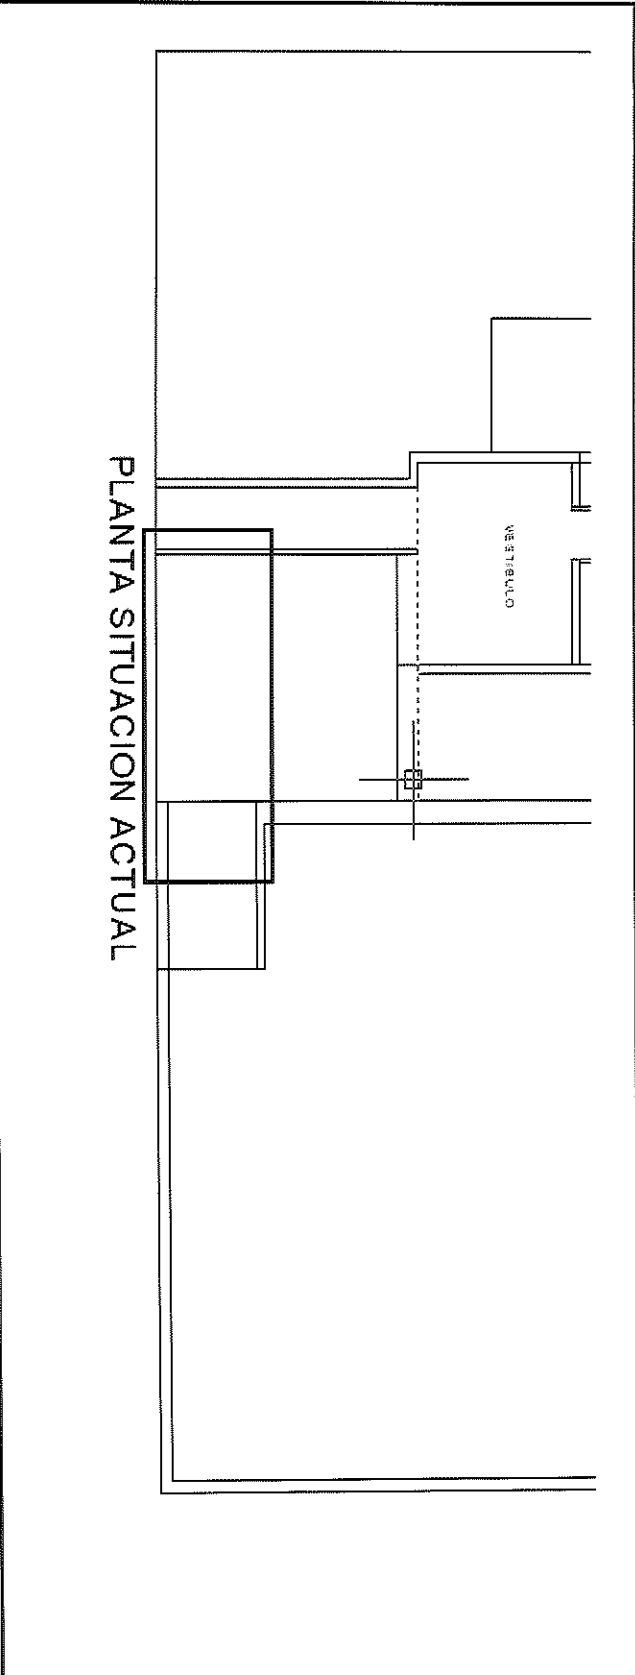

Elaboró

Carlos Vargas O.

Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Autorizo

Carlos Ollivas Salcedo

Arq. Carlos Ollivas Salcedo
Supervisor de Obra

Vo. Bo.


Jose Luis Rodriguez Hernandez

Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	1
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	EXTERIOR	DE: 2 AL: 3
CLAVE	CONCEPTO				

TEMP*6	DESMONTAR PORTON ELECTRICO
--------	----------------------------

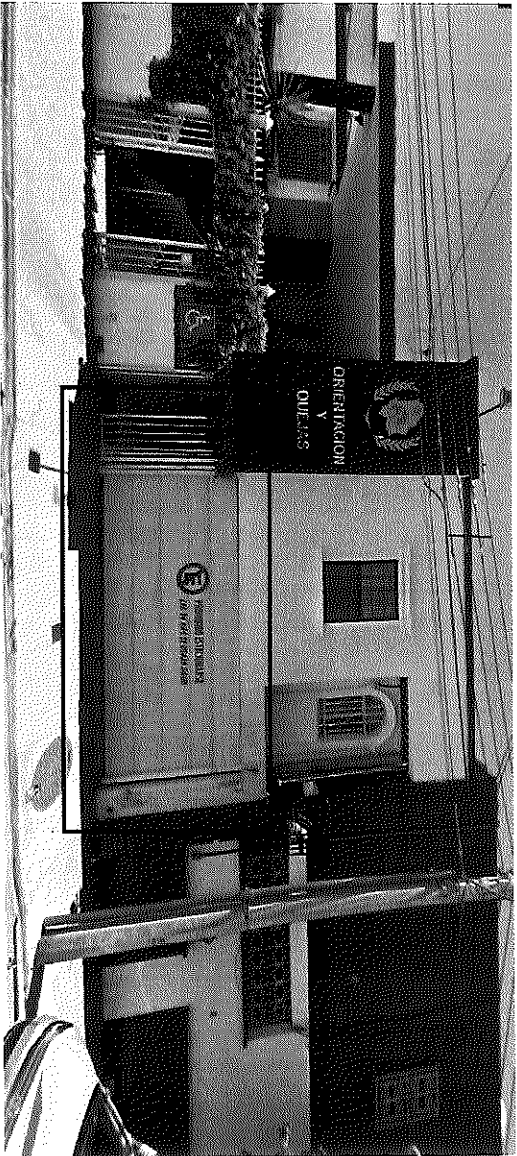

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra


[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 26/02/2020
	CONTRATO:	PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	EXTERIOR	HOLA: 2	AL: 11/03/2020
	N/A				DE: 3	FECHA: 11/03/2020
CLAVE	CONCEPTO					

TEMP*7	DEMOLICION DE FACHADA (tableroa, molduras de prell y ventanas)
--------	--

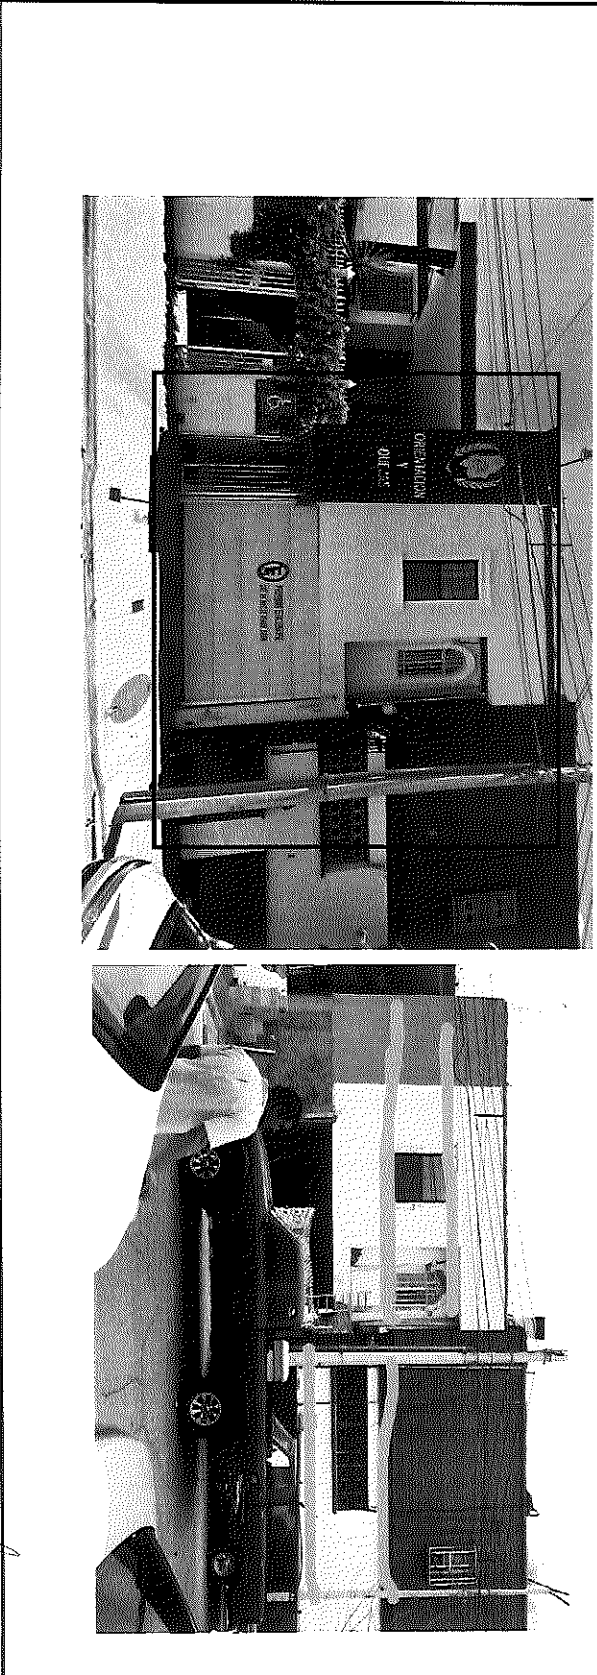

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra


Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/02/2020
CONTRATO:		PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	EXTERIOR	HOJA: 3	AL: 11/03/2020
	N/A	PARTIDA:			DE: 3	FECHA: 11/03/2020

CONCEPTO

TEMP*7	DEMOLICION DE FACHADA (tablero, molduras de prefi y ventanas)
--------	---

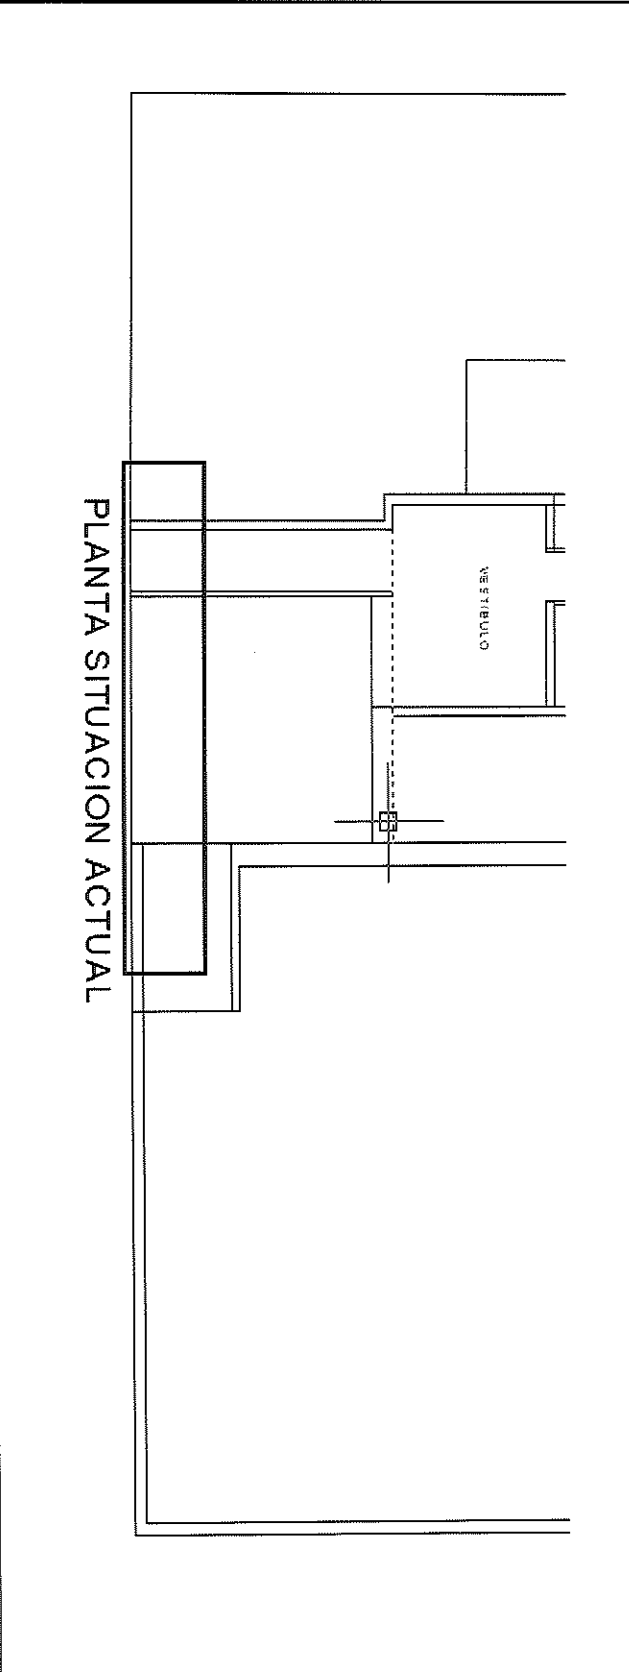

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.		DIRECCION:	AVE ZARCO N° 2427 COL. ZARCO		ESTIMACION	1		
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS		ESTUDIO:	CHIHUAHUA	MUN. CP. O.	CHIHUAHUA	DEL:	28/02/2020	
	CONTRATO:		PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	INTERIOR	HOLAS:	2	AL:	11/03/2020
		N/A				DEL:	1	FECHA:	11/03/2020
CLAVE	CONCRETO								

TEMP*1	DEMOLICION DE MUROS DE TABLARCOCA
--------	-----------------------------------

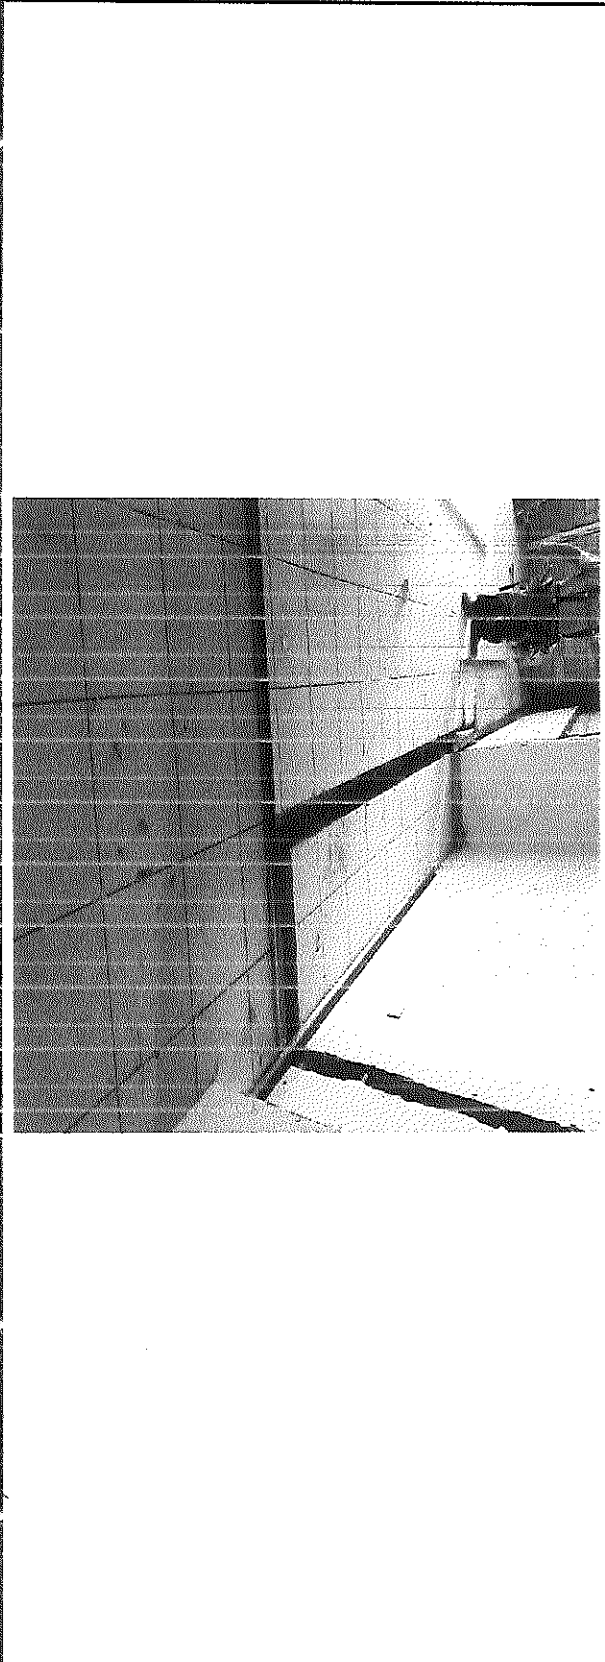

Elaboró

Autorizo

Va. Bo.

Carlos Vargas Ortega
 Ing. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Olivares Salcedo
 Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Herandez
 Ing. Jose Luis Rodriguez Herandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	1
CONTRATO:	N/A	PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	CHIHUAHUA	DEL: 26/02/2020
				EXTERIOR	AL: 11/03/2020
					FECHA: 11/03/2020
CLAVE	CONCEPTO				
TEMP*8	DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO PARA HACER ACCESO A OFICINAS				



Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.


Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		PRELIMINARES		SUBPARTIDA:	
N/A		EXTERIOR		DEI: 3	
PARTIDA:		SUBPARTIDA:		FECHA:	
N/A		N/A		11/09/2020	
CONCEPTO					
TEMP*8 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO PARA HACER ACCESO A OFICINAS					

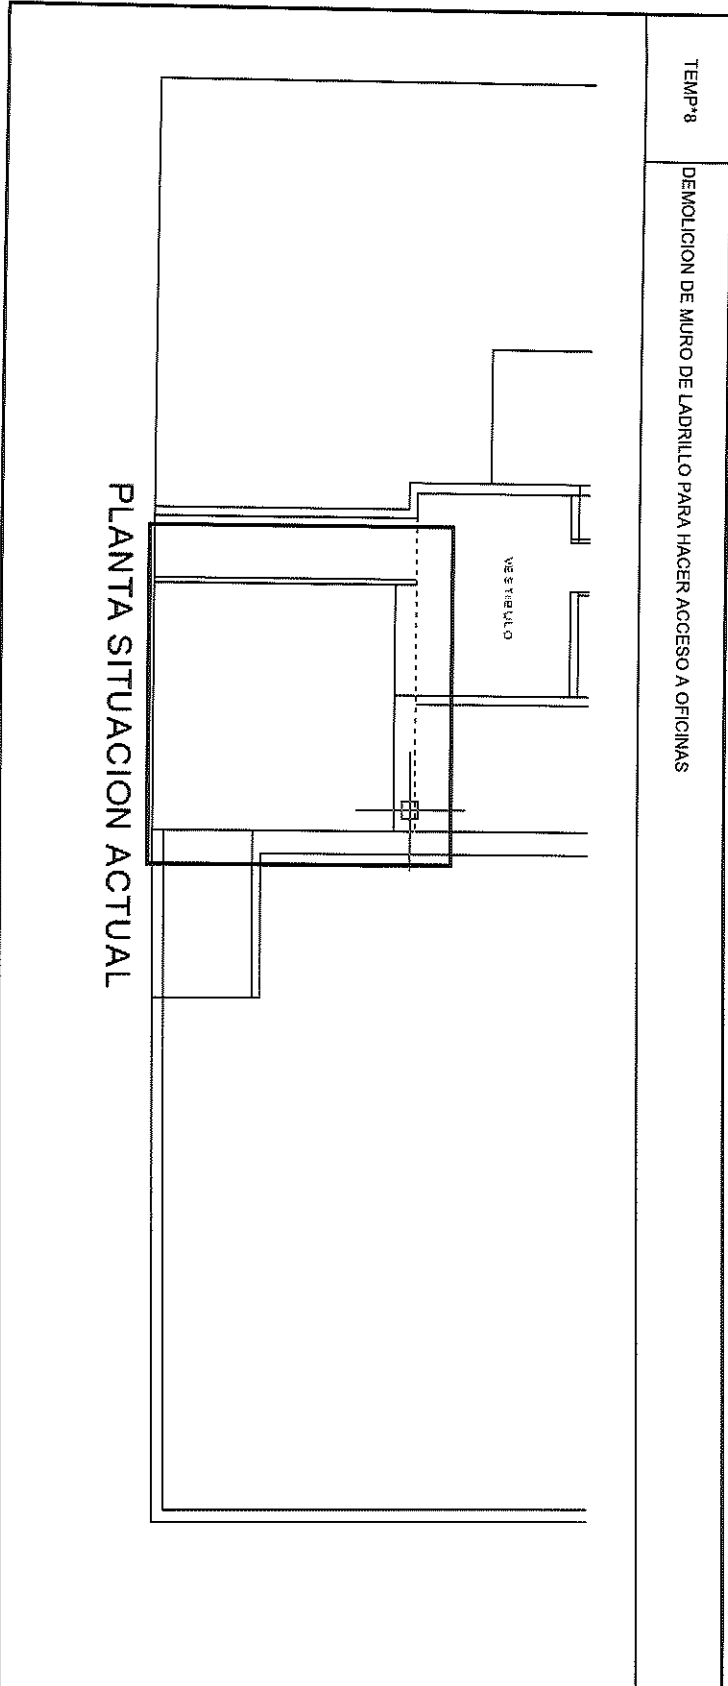

Elaboró

Autorizo

Va. Bo.


Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Otilias Salcedo
Arq. Carlos Otilias Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	EXTERIOR	DEL: 26/02/2020
CLAVE					AL: 11/03/2020
CONCEPTO					
TEMP*9	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE				

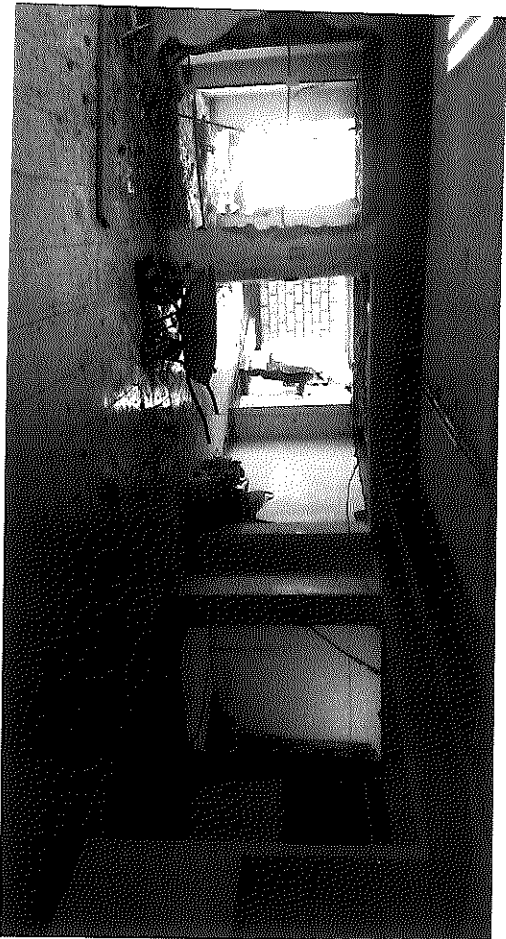

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas C.
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernández
 Diseños Y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1		
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	28/02/2020	
						AL:	11/03/2020	
CONTRATO:		PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	EXTERIOR	DE: 3	FECHA:		11/03/2020
N/A						PARTIDA:		CONCERTO

CLAVE	CONCERTO
TEMP*9	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE

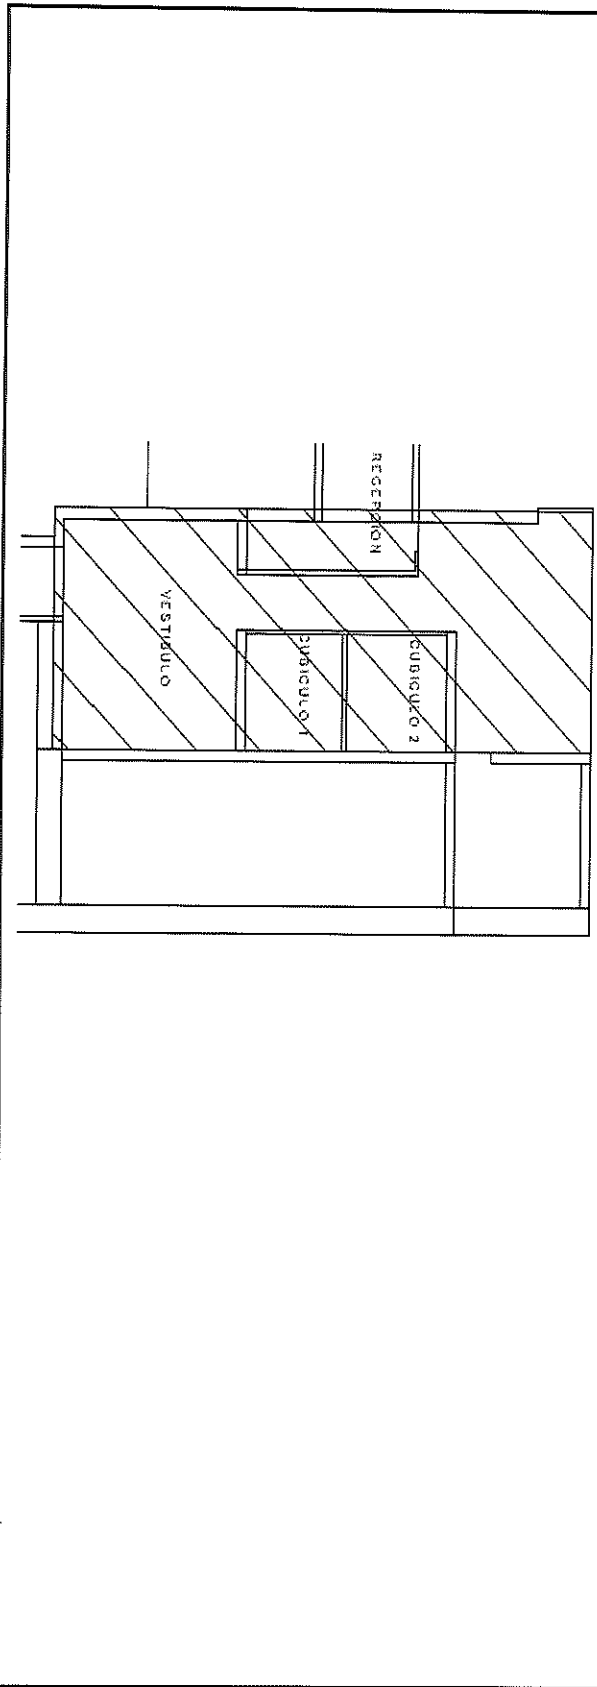

Elaboró

Autorizo

Va. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	1
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS ORIGINIAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	PARTIDA:		SUBPARTIDA:	
PRELIMINARES		EXTERIOR		HOJA: 2	DEL: 26/02/2020
				DE: 3	AL: 11/03/2020
				FECHA:	11/03/2020
CLAVE	CONCEPTO				

TEMP*11 RETIRO DE FACHALETA DE LADRILLO PARA COLOCACION DE BARANDAL

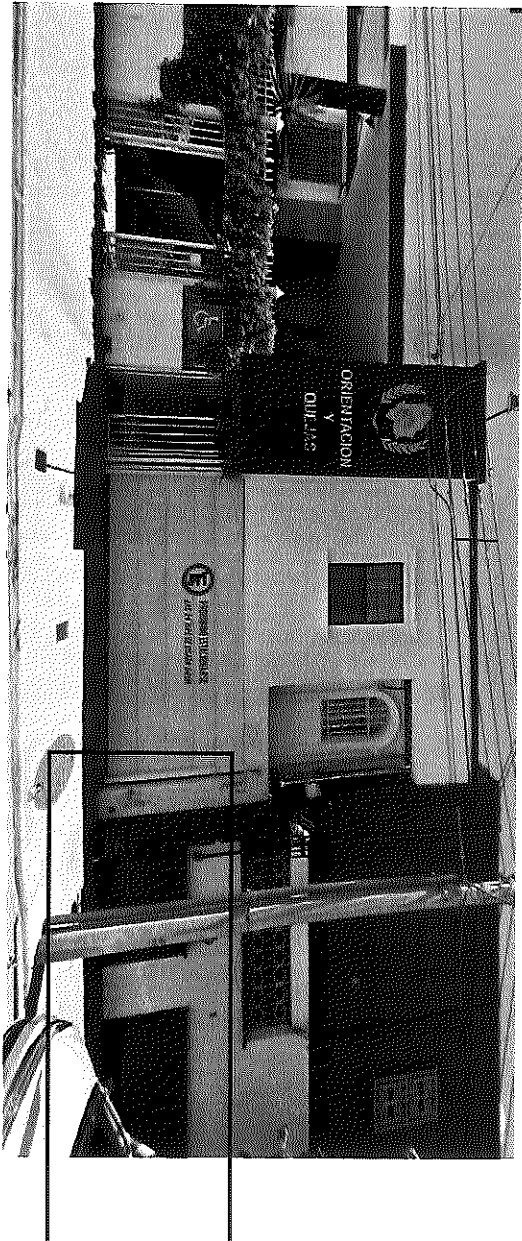

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/02/2020
CONTRATO:	N/A	PREFEELIMINARES	SUBPARTIDA:	EXTERIOR	HOJA: 3	AL: 11/03/2020
CLAVE	CONCRETO					

TEMP*10	RETIRO DE ABULTADO LADRILLO DE FACHADA EN AREA DE COCHERA
---------	---

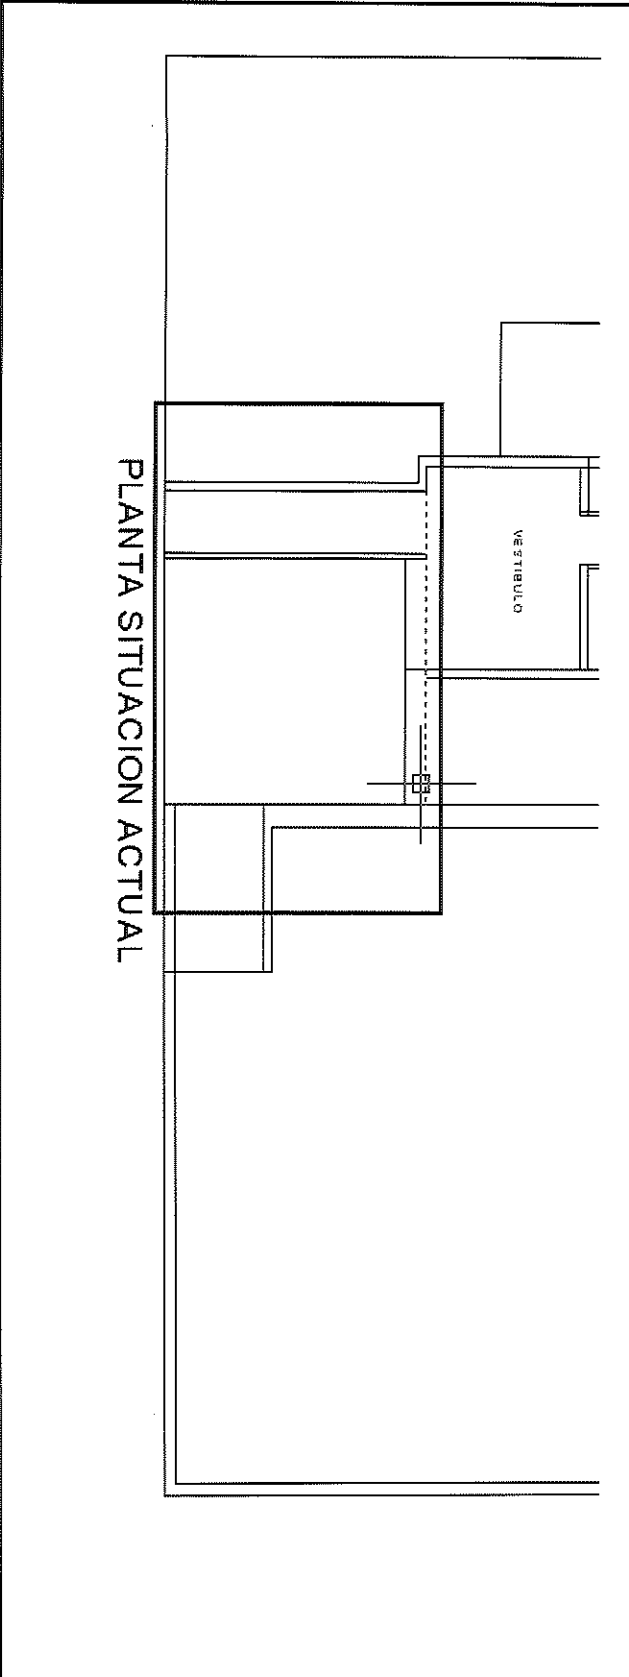

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.


Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salgado
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS ORIGINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 26/02/2020
CONTRATO:	N/A	PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	EXTERIOR	HOJA: 2	AL: 14/03/2020
CLAVE	CONCEPTO					
TEMP*11	RETIRO DE FACHALETA DE LADRILLO PARA COLOCACION DE BARANDAL					

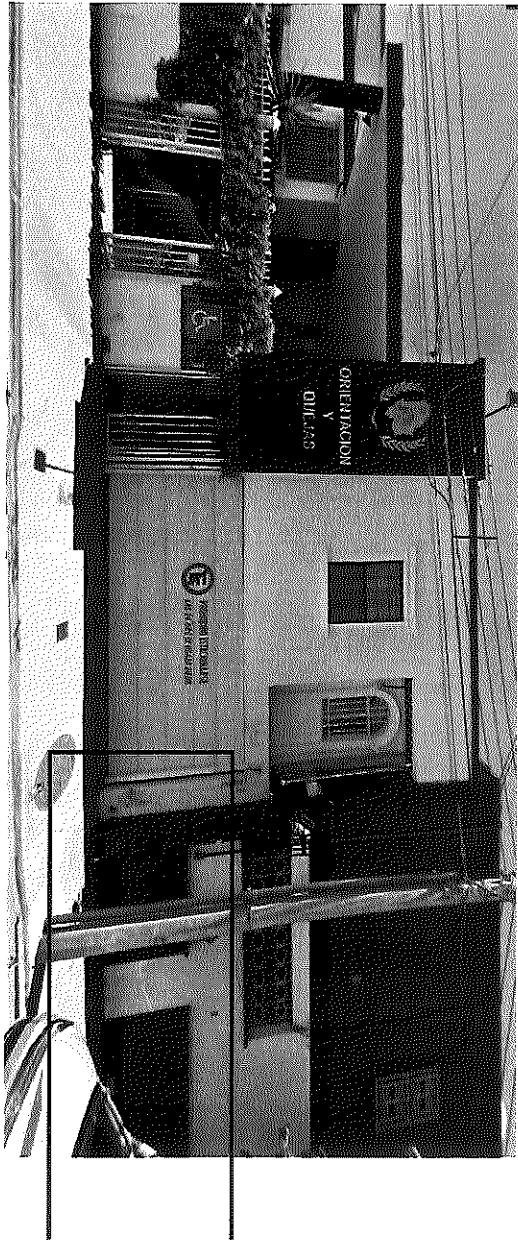

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/02/2020
CONTRATO:		PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	EXTERIOR	HOJA: 3	AL: 11/03/2020
PARTIDA:				DE: 3	FECHA:	11/03/2020
CONCRETO						
CLAVE						

TEMP*11	RETIRO DE FACHALETA DE LADRILLO PARA COLOCACION DE BARANDAL
---------	---

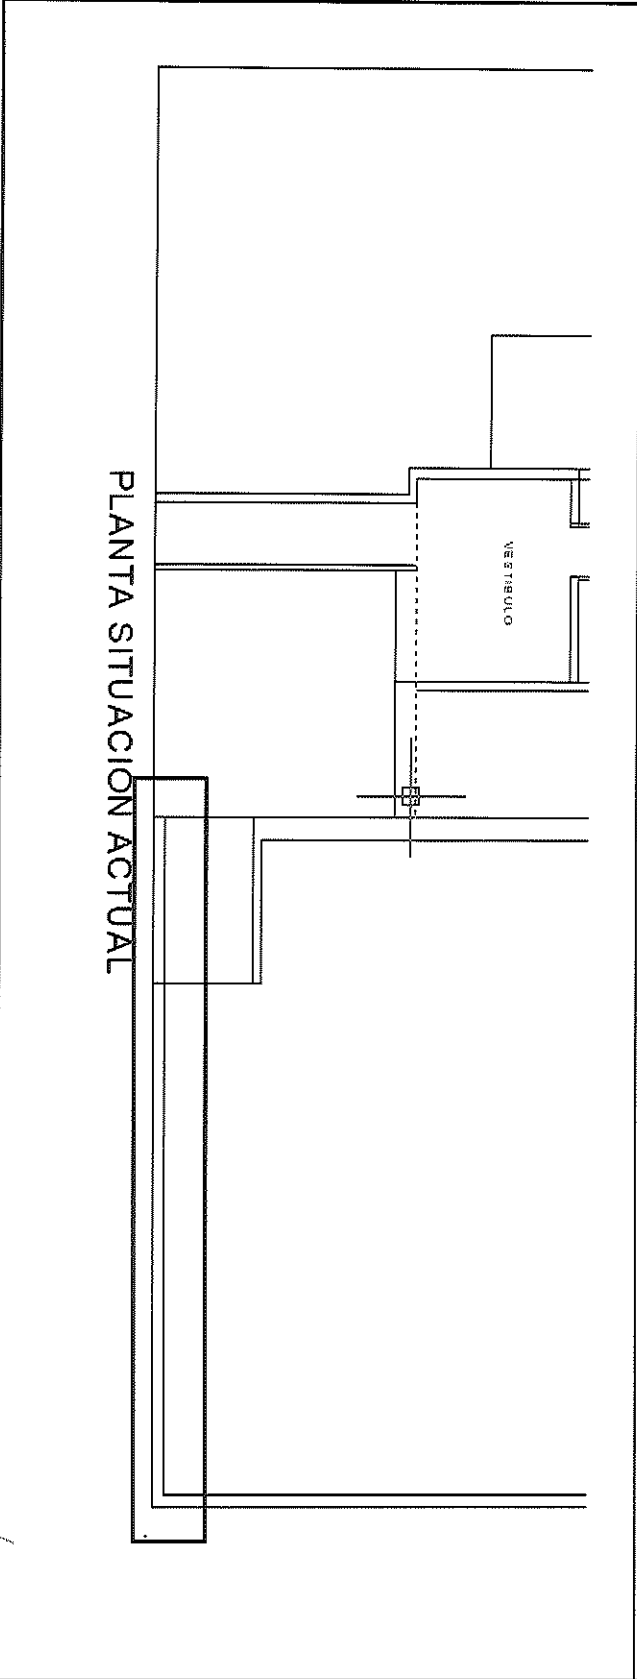

Elaboró

Autorizo

Va. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra


Jose Luis Rodríguez Hernández
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO			ESTIMACION	1
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			ESTADO:	CHIHUAHUA			DEL:	26/02/2020
				MUNICIPIO:	CHIHUAHUA			AL:	11/03/2020
CONTRATO:		PARTIDA:	CONSTRUCCION EXTERIOR		SUBPARTIDA:	ALBALILLERIAS		HOJA: 2	FECHA:
N/A			EXTERIOR					DE: 3	11/03/2020
CONCEPTO									

CLAVE	CONCRETO
-------	----------

ALB 2	CASTILLOS DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 cms. (MURO DE 3M)
-------	--



Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra


[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/02/2020
CONTRATO:						AL: 11/03/2020
						FECHA: 11/03/2020
	PARTIDA:	CONSTRUCCION EXTERIOR	SUBPARTIDA:	ALBALERIAS	DE: 3	

CLAVE	CONCEPTO					
-------	----------	--	--	--	--	--

ALB 2	CASTILLOS DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 cms. (MURO DE 3M)					
-------	--	--	--	--	--	--

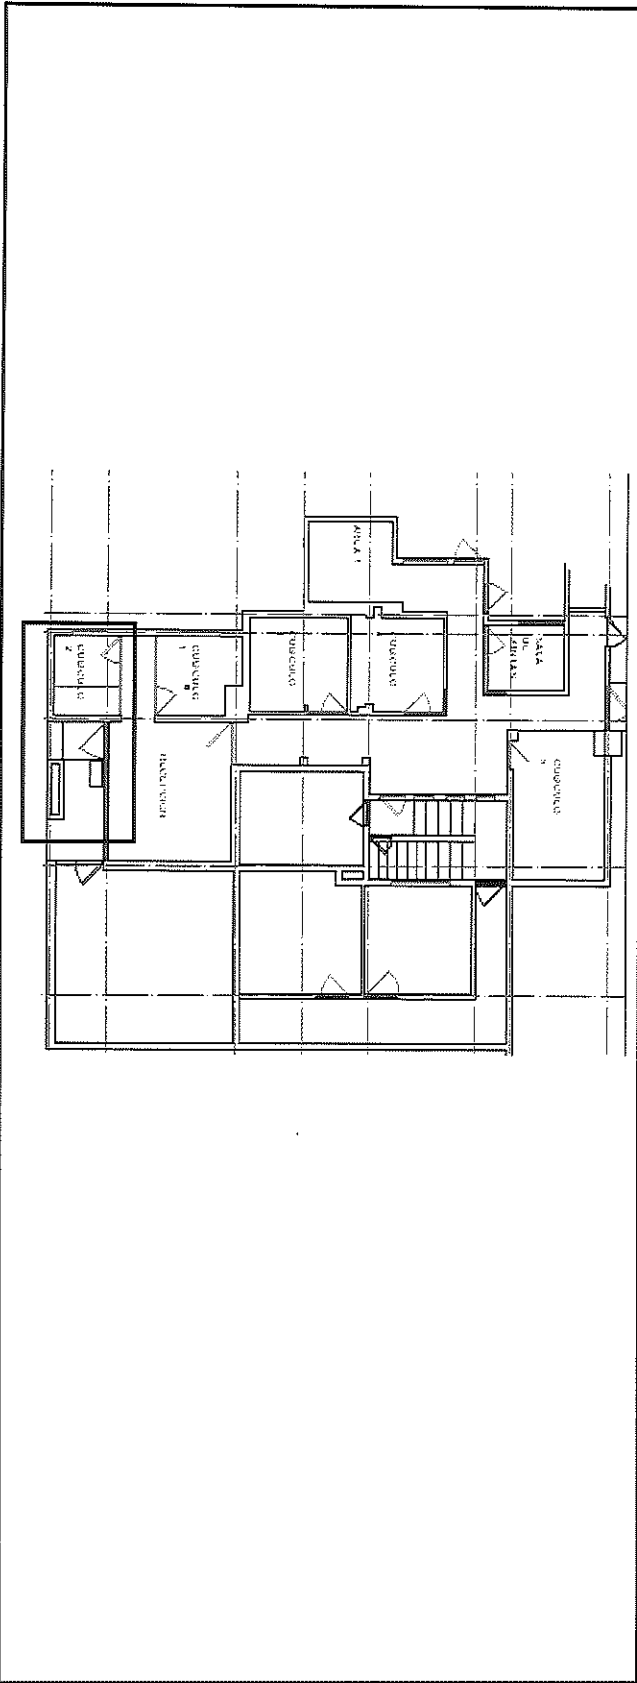

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega

Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BOBEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	28/02/2020
	CONTRATO:					AL:	11/03/2020
	N/A	PARTIDA:		ALBAILLERI AS		DE:	3
						FECHA:	11/03/2020
CONCEPTO							
CLAVE							

1.28 DADA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 cms. CONCRETO f_c=210 kg/cm² CERRAMIENTO EN DESPLANTE DE MUROS DE BLOCK



Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	28/02/2020
						HOJA: 3	11/03/2020
CONTRATO:		CONSTRUCCION EXTERIOR	SUBPARTIDA:	ALBANELERIAS	DE: 3	FECHA:	11/03/2020
N/A							
CONCRETO							

CLAVE	CONCRETO
1,28	DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 15X15 cms. ARMADOS CON 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 cms. CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CERRAMIENTO EN DESPLANTE DE MUIROS DE BLOCK

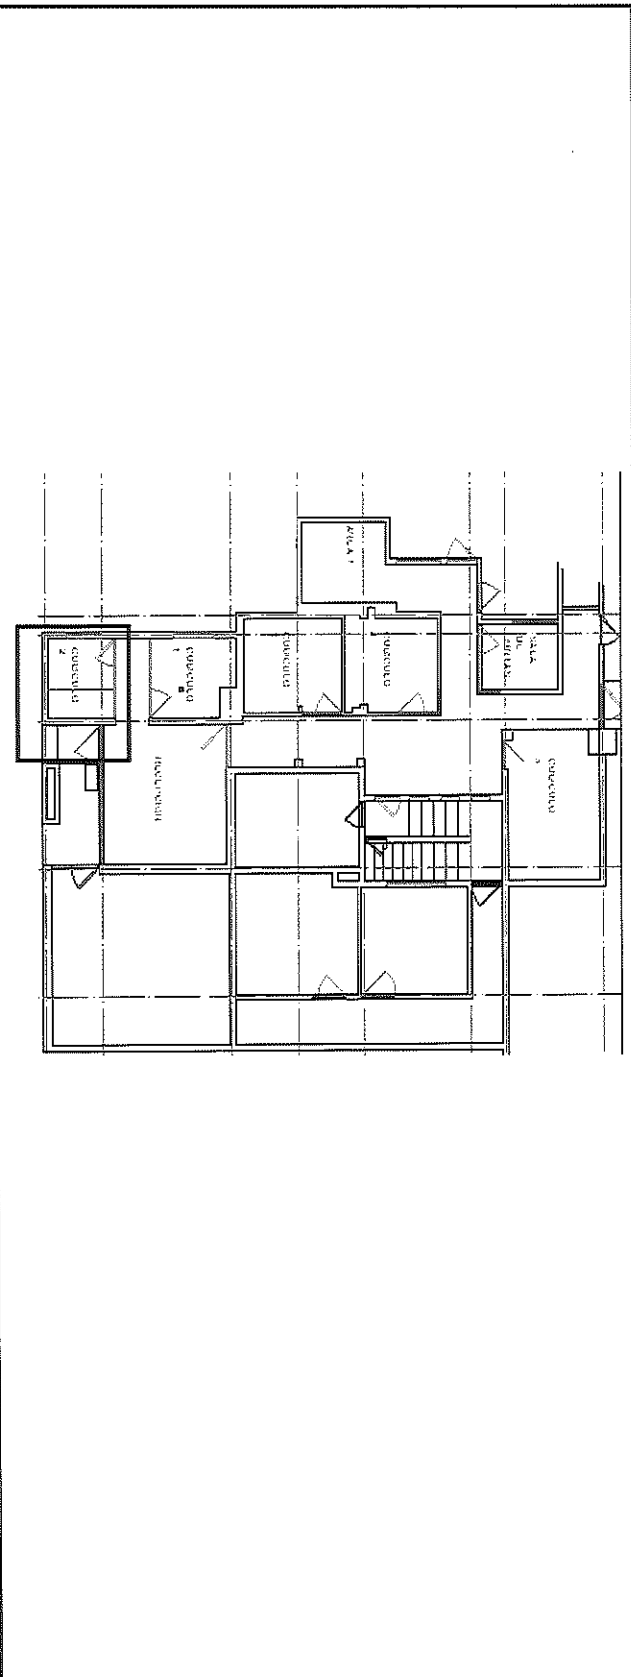

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega


Carlos Olivares Salgado
Arq. Carlos Olivares Salgado

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	26/02/2020
						AL:	11/03/2020
	CONTRATO:					AL:	11/03/2020
	N/A	PARTIDA:		ALBAILERIAS		FECHA:	11/03/2020
CONCEPTO							

CLAVE	MURO DE BLOCK DE 6" CON VAR. NO. 3@ 80 CM CON CONCRETO DE 150 KG/CM2
-------	--

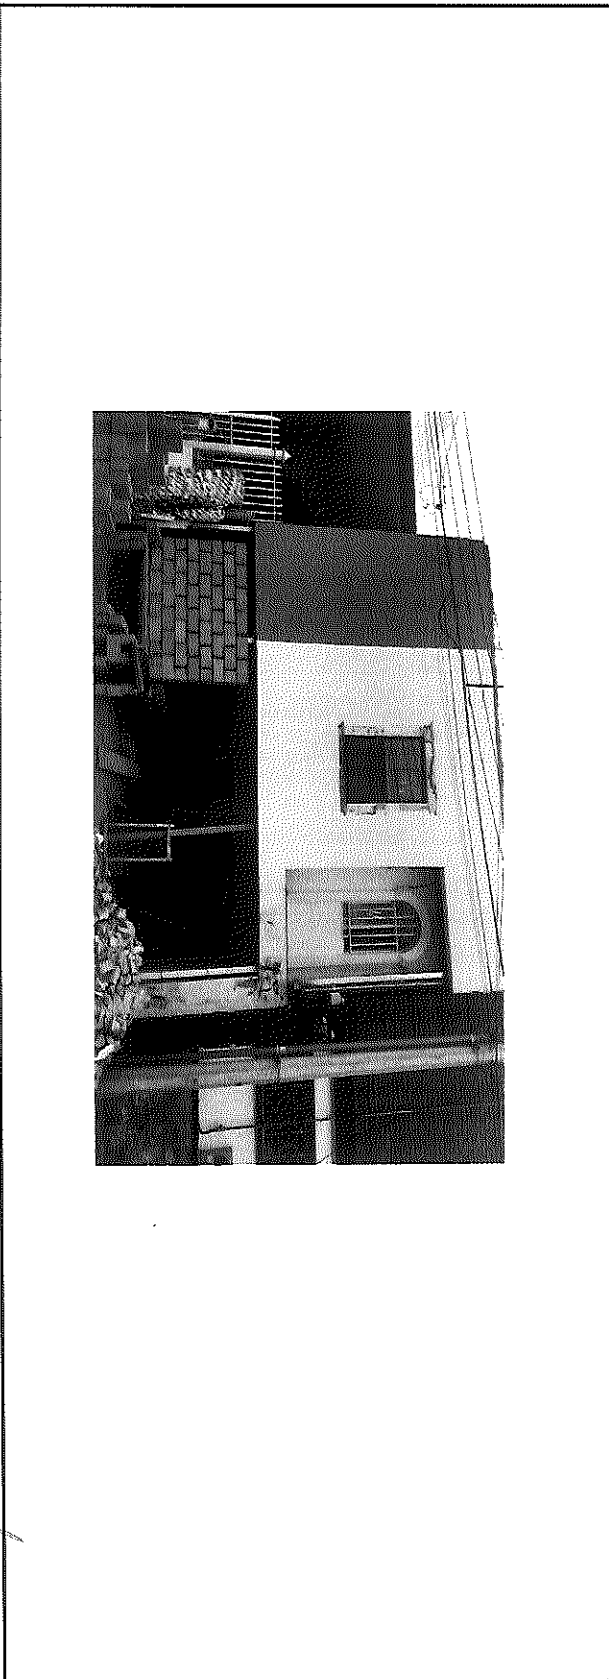


CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/02/2020
CONTRATO:				HOLA: 3		AL: 11/03/2020
	N/A	PARTIDA:	CONSTRUCCION EXTERIOR	SUBPARTIDA:	ALBANILERIAS	DE: 3
FECHA: 11/03/2020						

CLAVE	CONCRETO
-------	----------

MURO DE 6	MURO DE BLOCK DE 6" CON VAR. NO. 3@ 80 CM CON CONCRETO DE 150 KG/CM2
-----------	--

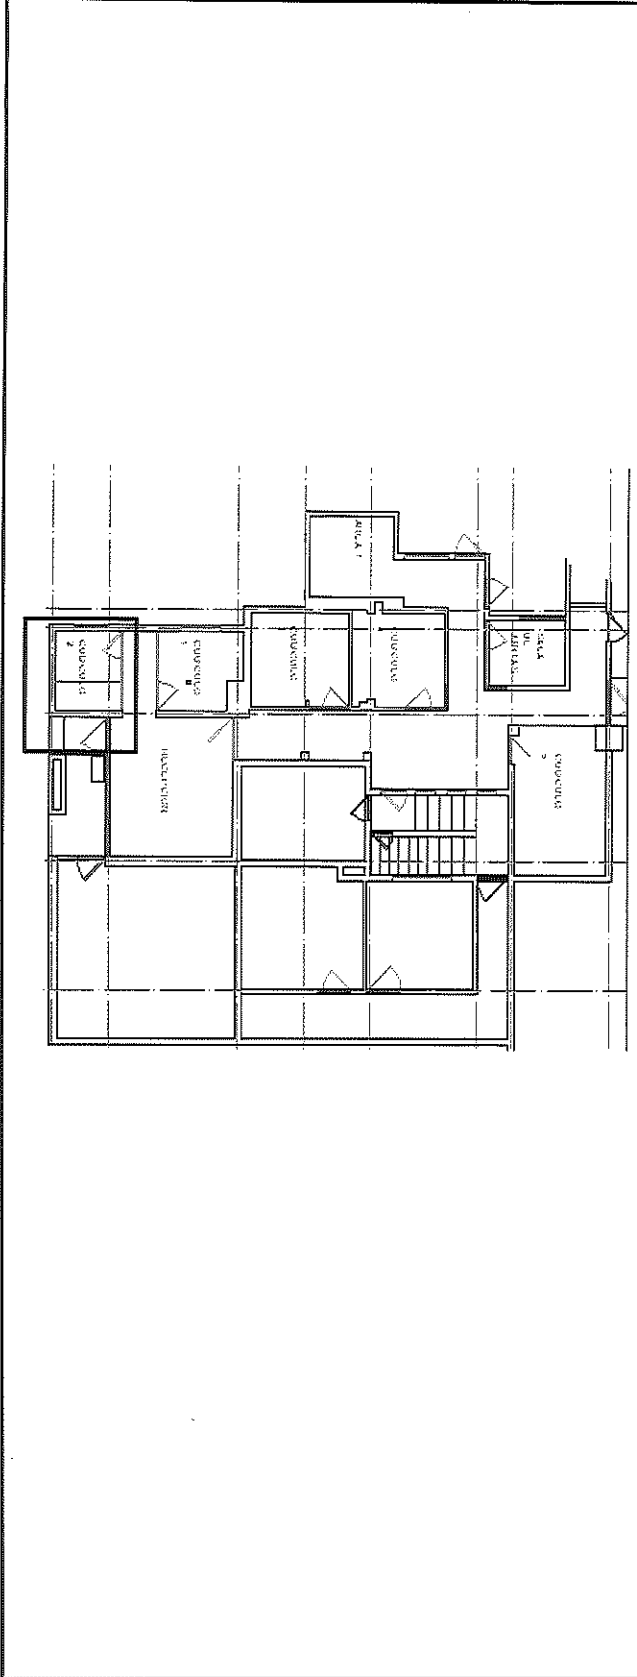

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega

[Signature]
Arq. Carlos Olivares Salcedo


[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/02/2020
CONTRATO:						AL: 11/03/2020
PARTIDA:		CONSTRUCCION EXTERIOR	SUBPARTIDA:	ALBALILERIAS	DE: 2	FECHA: 11/03/2020

CLAVE	CONCRETO
-------	----------

1,23	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR
------	---

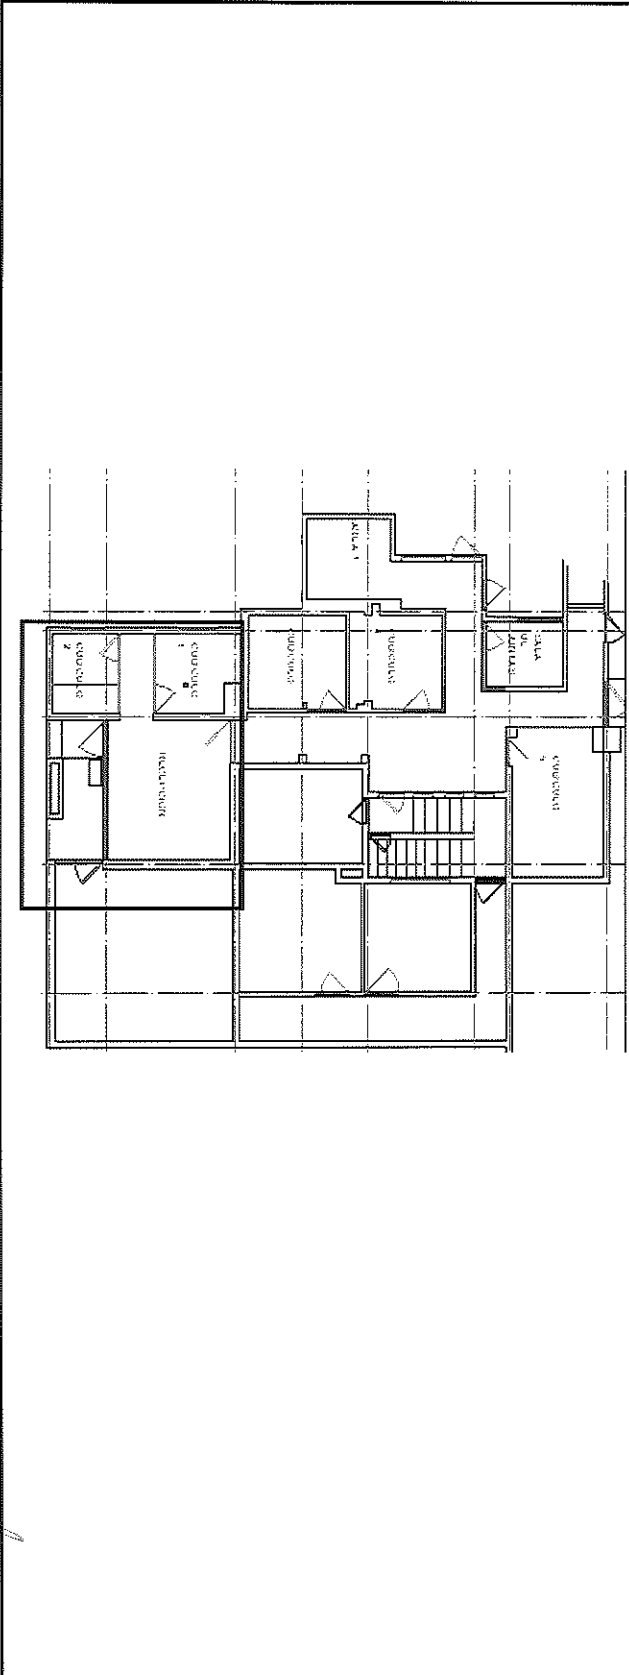

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega


Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo

Jose Luis Rodríguez Hernández
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	1
	CONTRATO:	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 26/02/2020
	N/A			AL: 05/03/2020
	PARTIDA:	CONSTRUCCION EXTERIOR	SUBPARTIDA:	ALBALERILERIAS
				DE: 2
CLAVE	CONCRETO			

061018 Firma de 10 cm. de espesor, de concreto f'c= 200 kg/cm² acabado llana metálica, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye materiales, aceros, preparacion de la superficie, nivelacion, cimbrado colado, Mano de obra, equipo y herramienta.

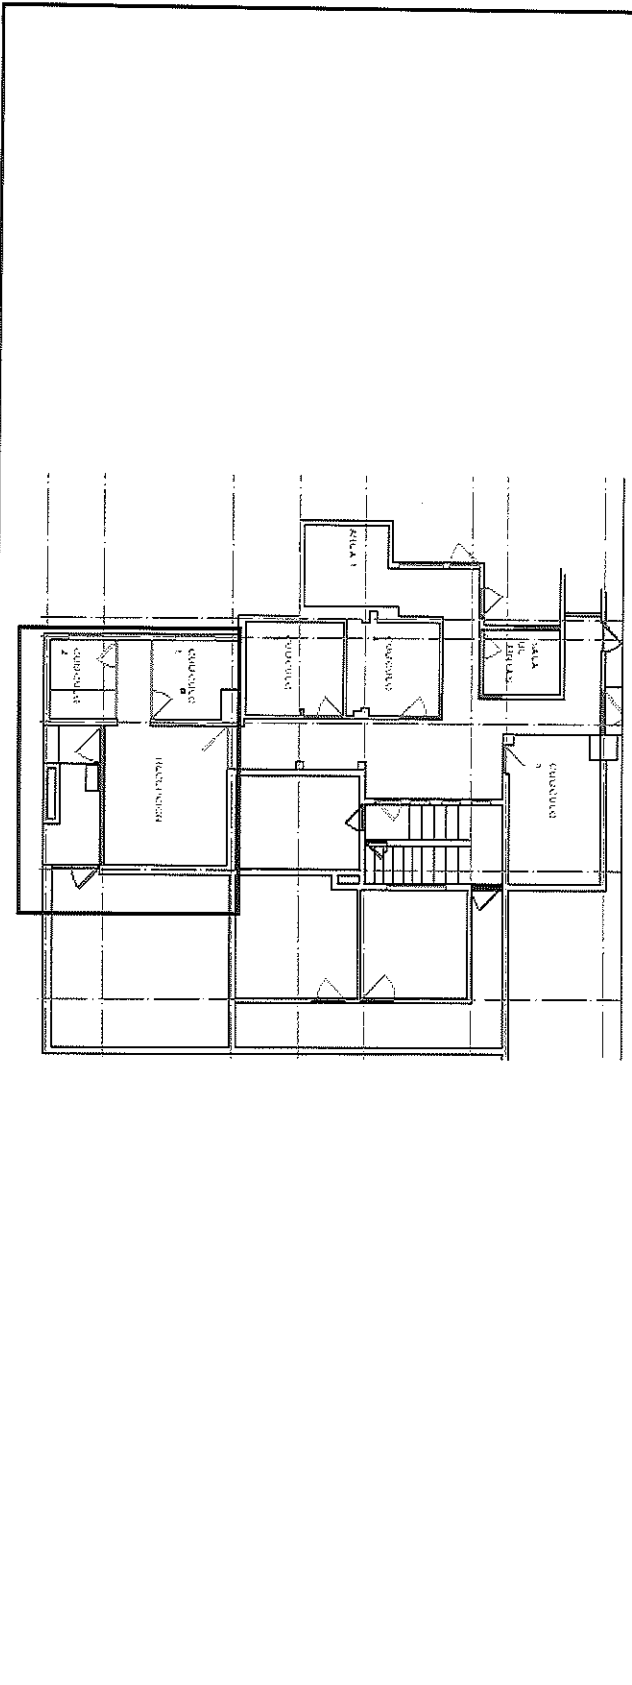

Elaboró

Autorizó

Va. Bo.


Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega


[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández


FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO		ESTIMACION	1	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	26/02/2020
	CONTRATO:			CONSTRUCCION				AL:	11/03/2020
		PARTIDA:		EXTERIOR	SUBPARTIDA:	ALBALILLERI AS		DE:	11/03/2020
								FECHA:	11/03/2020
CONCEPTO									
CLAVE									

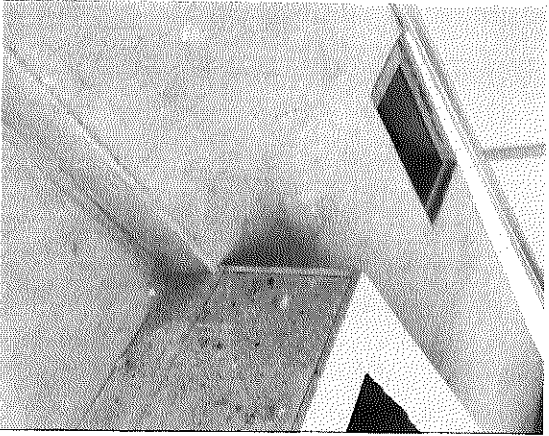REG 1	REGISTRO SANITARIO EN RAMPA DE ACCESO	
Elaboró	Autorizó	Vo. Bo.


Arq. Carlos Vargas Ortíz
 Residente de Obra


Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra



Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/02/2020
CONTRATO:						AL: 11/03/2020
	MIA	PARTIDA:	CONSTRUCCION EXTERIOR	SUBPARTIDA:	ALBALERIAS	FECHA: 11/03/2020
DE: 2						

CONCEPTO

REG 1	REGISTRO SANITARIO EN RAMPA DE ACCESO
-------	---------------------------------------

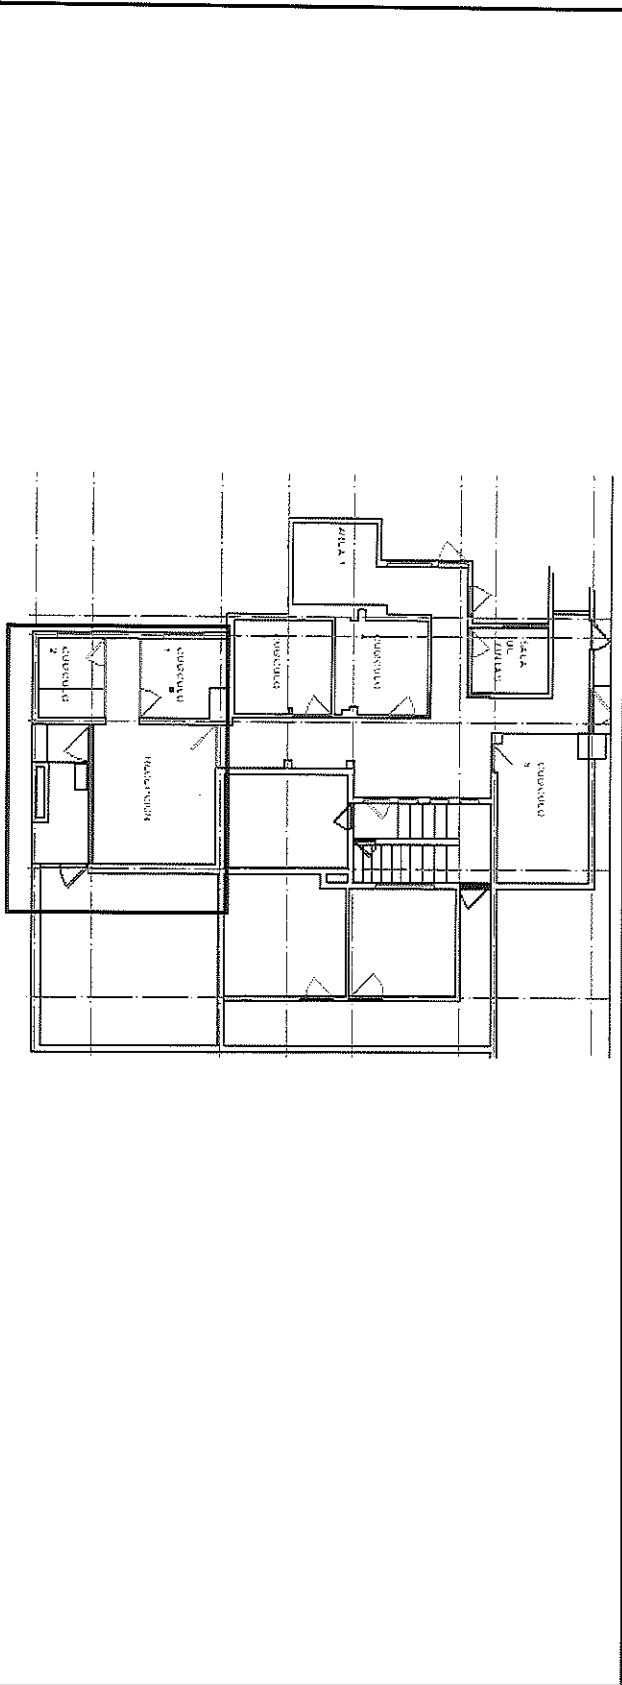

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas O.

Arq. Carlos Vargas Ortega

[Signature]

Arq. Carlos Olivas Salcedo

[Signature]


Ing. José Luis Rodríguez Hernández


FOTOGRAFIA


CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.		DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1
OBRA:	REMODELACION Y REMABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS		ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 26/02/2020
	CONTRATO:		CONSTRUCCION EXTERIOR	SUBPARTIDA:	ALBAILLERI AS	HOLA: 2	AL: 11/03/2020
	N/A	PARTIDA:				DE: 3	FECHA: 11/03/2020
CLAVE	CONCEPTO						

TEMP*35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUCUBOND
---------	--------------------------------------





Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra


Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	1
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/02/2020
CONTRATO:		CONSTRUCCION EXTERIOR	SUBPARTIDA:	ALBALERIAS	HOLA: 3	AL: 11/03/2020
CLAVE	N/A	PARTIDA:	CONCEPTO		DE: 3	FECHA: 11/03/2020
TEMP: 35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUCUBOND					

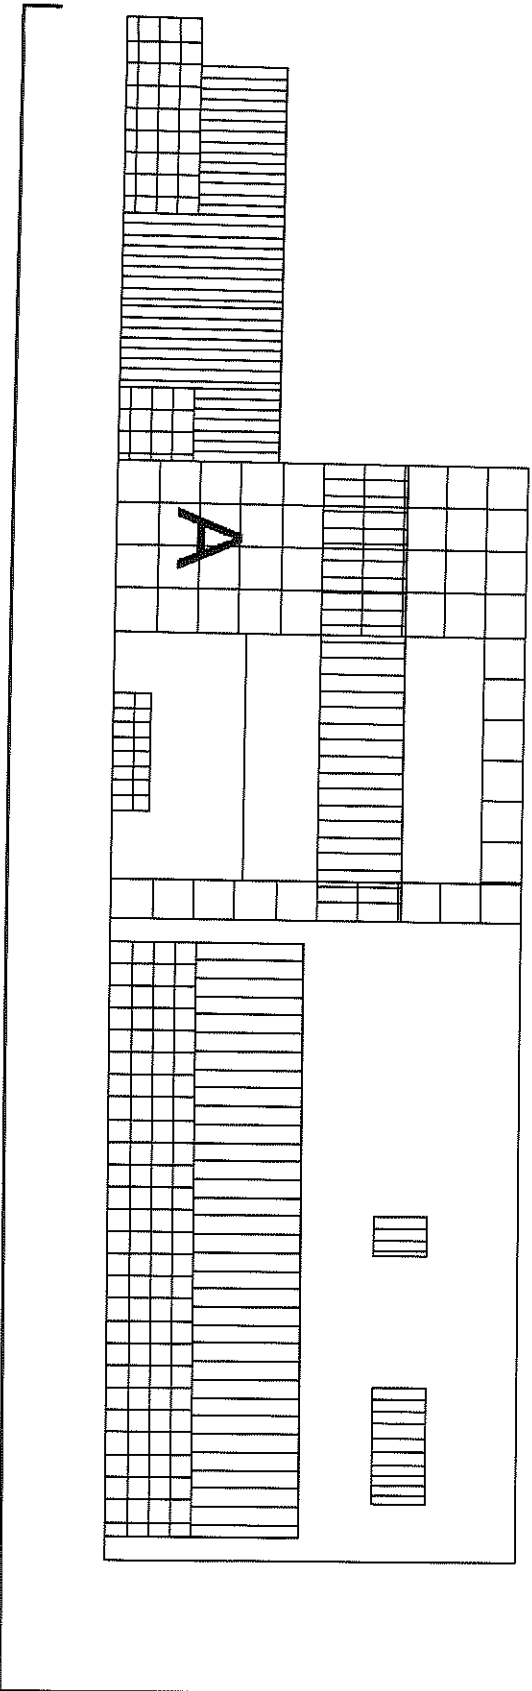

Elaboró


Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega

Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo

José Luis Rodríguez Hernández
Ing. José Luis Rodríguez Hernández



Usr: Diana Trevizo
 Rec: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00463 Del 18/03/2020

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2020 02:01 p. m.
 Página: 1

Concepto: F/2881 - Obra Pública : REM/OFNAS/PRINC - REMODELACION OFICINAS PRINCIPALES C.E.D.H. Contrato : 2. GP Folio: 50

Beneficiario: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110120-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por	\$326,391.78		GP Folio: 50
0002	8260-110120-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por		\$326,391.78	GP Folio: 50
0003	2113-000854	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES	\$326,391.78		GP Folio: 50
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$326,391.82	GP Folio: 50
0005	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO	\$0.04		GP Folio: 50
Sumas iguales =>			652,783.60	652,783.60	

000463



BancaNet Empresarial

Miércoles 18 de Marzo de 2020, 3:28 PM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BANREGIO - 058150600168600110	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 326,391.82
	Fecha valor	18/03/2020
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	2881
	Concepto del pago	ESTIMACION 2 REMODELACION FACHADA CEDH
	Número de Autorización	196464
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

RFC: DCC060124KS2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31125
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 2881
Fecha: 17/3/2020 14:52:19

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MPS
Domicilio: Av. Zarco No. 2427, Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: I01 - Construcciones


Table with 8 columns: Clave, Cantidad, Clave, Concepto / Descripción, Valor, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 72102900, 1.00, E48, Servicio - PAGO DE ESTIMACION No. 2 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION EN COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH., 281,372.26, 0.00, 002 - IVA - 45,019.56, 281,372.26

Observaciones

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 82/100

Summary table with 2 columns: Subtotal (281,372.26), Impuestos Traslados (45,019.56), Total (326,391.82)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

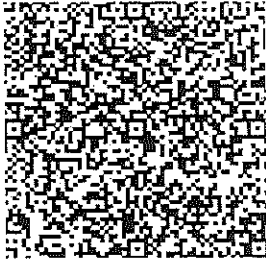

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408408629
Folio fiscal: EFA638BF-F8FF-48D3-98F3-1A0AA6A8BE68
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 17 2020 - 15:52:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

R7gS9QDe8kY56rCw9FaKmb5OrSKgXooej2WBbM5rocN98YwMdsfB6DwoVcVyxU64tp/i74/JtSAjYVRWmF5RI
dW7zQAGfPj/FvYxg7RCEa5pyPKzDdnCPoVckHfD+zzSAcZnthEsey7bUcBQJSqsr0TAK4I98Hfksk4007QWbx
eRnqG0lzA1zUlgURYhRSF92LEgCBA8FAA0XOM02CXOTOQteuK90NvlpbTbqqo0sFchVA0eS7IOTLnbJjINu/Aj
C70yF/zj28NQIRqa4X09u+XuSvcdyK3joG7mn0RqhIGXNYGE2dTftqVYT/xavw/mLF24VsjdB+LAWxzTA+/w==

Sello del SAT

L/LN+El4JpdF4AE0IXWcaeqV5B6oOU2/Rg9Lpd/o6VmSDI0ZxgeHWFG4BzkaFpAwXhqQ1a074Z+eUPfk
8I8bwk4+43i/PraEYxlclle6n8ZPIBhXaucJb5XoJBy8VvOG5WGyTb1kzPxiFKFWktLCb57ie/GiwDkv
epPw9J5LxFlF/kaLS4nZMpShQ+V8psya2IhrUshZUfrutLoeylz6CP8d2eXu5t2qINhkAWIfBpj9o05
3ap9gdXCxutSxj7J6QU6gs/+vE8Fh4HvVf9eIXUHMhsPyjvLVg+bgPjWgFEhnEjsNaZg+iYIKecKCYGOQ
qoAW6xe6b13mZw/eg9qF7g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EFA638BF-F8FF-48D3-98F3-1A0AA6A8BE68|2020-03-17T15:52:22|MAS0810247CO|R7gS
9QDe8kY56rCw9FaKmb5OrSKgXooej2WBbM5rocN98YwMdsfB6DwoVcVyxU64tp/i74/JtSAjYVRWmF5RI
RldW7zQAGfPj/FvYxg7RCEa5pyPKzDdnCPoVckHfD+zzSAcZnthEsey7bUcBQJSqsr0TAK4I98Hfksk
4007QWbx eRnqG0lzA1zUlgURYhRSF92LEgCBA8FAA0XOM02CXOTOQteuK90NvlpbTbqqo0sFchVA0eS7
IOTLnbJjINu/AjC70yF/zj28NQIRqa4X09u+XuSvcdyK3joG7mn0RqhIGXNYGE2dTftqVYT/xavw/mLF
24VsjdB+LAWxzTA+/w==|00001000000404486074|}

18/3/2020

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DCC060124KS2	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EFA638BF-F8FF-48D3-98F3-1A0AA6A8BE6B	2020-03-17T14:52:19	2020-03-17T15:52:22	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$326,391.82	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

Emisor (Beneficiario)
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV
RFC: DCC060124KS2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor (Ordenante del pago)
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
Domicilio: Av. Zarco No. 2427, Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua, México

Fecha Emisión: 17/3/2020
Lugar de Expedición: 31125
Tipo Comprobante: P Pago
Folio Fiscal (UUID): 3F57667A-57A2-4793-B82E-CE9AF0E44DAB
No. Serie Certificado SAT: 00001000000404486074
No. Certificado Emisor: 00001000000408408629
Clave de Confirmación:

DETALLE DEL PAGO

Información Banco Emisor - Receptor
RFC Emisor Cuenta Ordenante: BNM840515VB1
Nombre del Banco Ordenante:
Cuenta Ordenante: 002150093435132136

RFC Emisor Cuenta Beneficiario: BRM940216EQ6
Cuenta Beneficiario: 058150800168600110


Información del Pago
Fecha de Pago: 2020-03-11T12:00:00
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN - Peso Mexicano
SPEI Digital
Tipo Cadena Pago:
Cadena original del comprobante de pago:

Tipo de Cambio:
Monto: 217,857.28
No. Operación:

Sello de Pago:

DOCUMENTOS PAGADOS

ID Documento	Serie	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método de Pago	No. Parcialidad	Importe Saldo Anterior	Importe Pagado	Importe Saldo Insoluto
CC3CEF8F-030C-4CDD-ABBB-F1F7C8C5FBF2		2880	MXN		PPD	1	217,857.28	217,857.28	0.00

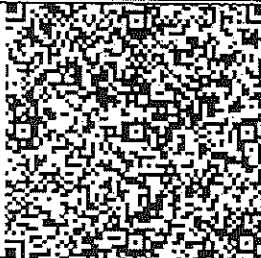

TIPO RELACIÓN: -
CFDI RELACIONADO:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido desde: AdminPAQ@

SELLO DIGITAL DEL SAT:

V8B/lhndKuDEhN8rYfn272twBI+/CFJjg0XoZfx0t7zmZs7QM71rdX1BikiudJ4CbWn8/wHwXvOrr2oksslZaeko4HIB7NaCJ43mMDcvcNkgLrS1X00Ypb91GsRWnYj0fF2ivq5wiyBuDepkdiAoCiziGNJQZXT8wMMHg+CQZ7/FAGZ2LnyKc2U7oj+Av4x8Snhxdlj4bpjBa9cGO8HnFybDarLLzNcBOQciM54QVYKT5q+xFvlnKtmzrcrl0g/APst+ghBJTqfV8xqpp1OxKZVLWgE1LhllFa06DOeXZ4Z4eWtbpM7Ehd+71KaTIJXUrf6g6kRDOa6URYb0A==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

fVVGwlKtqHqjpczYL1iKIFwp3/FCXX6K7LkoIO9j+VWQdeXENJkiG4gc5iekjVyTh9/sVxKRn/ZMOC+uugO+KNiIMGqenwr8OURq2ncsiBV2JPuh4MGd5e4BWR5SQpUjvYwS5EwMfYLUCqHXjXW08s2cUBGMUuRFswS1uK7CnlrFEiHnQEeuo5Vl81/MqXYe4a2wR+n9rJteQTPwO6xpVK3qsVrkf3Du5mCvd+Ep2UrK5uFE3CBETAUX/7ijAhu9vps/Er6Gymf7sMnt4CPWZSiEGbwObCNWdJqNngk7S8RvpRm1u5+4l5S/Sqb8H2BWWoqnsiX6G0RHR4PDIM7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3F57667A-57A2-4793-B82E-CE9AF0E44DAB|2020-03-11T12:00:00|MAS0810247C0|V8B/lhndKuDEhN8rYfn272twBI+/CFJjg0XoZfx0t7zmZs7QM71rdX1BikiudJ4CbWn8/wHwXvOrr2oksslZaeko4HIB7NaCJ43mMDcvcNkgLrS1X00Ypb91GsRWnYj0fF2ivq5wiyBuDepkdiAoCiziGNJQZXT8wMMHg+CQZ7/FAGZ2LnyKc2U7oj+Av4x8Snhxdlj4bpjBa9cGO8HnFybDarLLzNcBOQciM54QVYKT5q+xFvlnKtmzrcrl0g/APst+ghBJTqfV8xqpp1OxKZVLWgE1LhllFa06DOeXZ4Z4eWtbpM7Ehd+71KaTIJXUrf6g6kRDOa6URYb0A==|00001000000404486074||

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTROL DE ESTIMACIONES**

DISENO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.

REMODELACION OFICINAS

ESTIMACION No. **2**
 PERIODO: Del 11 al 25 de Marzo del Año 2020
 FECHA: lunes, 16 de marzo de 2020
 HOJA: UNC

GLOBAL A LA FECHA
 PAGO ANTERIOR \$ 187,808.00
 ESTA ESTIMACION \$ 281,372.26
 GLOBAL \$ 469,180.26

OBRA: REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS
 UBICACION: AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO
 CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.

CONCEPTO	CONTRATADO	GLOBAL A LA FECHA	ESTIMACION	POR EJERCER
OBRA NORMAL:	\$ 1,638,367.83	\$ 187,808.00	\$ 281,372.26	\$ 1,169,187.56
MATERIALES	\$	\$	\$	\$
CONTRATO FINAL	\$	\$	\$	\$
OBRA EXCELENTE	\$	\$	\$	\$
OBRA EXTRAORDINARIA:	\$	\$	\$	\$
ESCALATORIA:	\$	\$	\$	\$
TOTAL:	\$ 1,638,367.83	\$ 187,808.00	\$ 281,372.26	\$ 1,169,187.56

ESTADO DE AVANCE	DATOS DEL ANTICIPO	RETENCIONES
AVANCE PROGRAMADO: 28%	ANTICIPO OTORGADO \$ 0.00	IMPORTE RETENIDO ANTERIOR: \$ 0.00
AVANCE REAL: 17%	% DE I. V. A. 0.00	ESTA RETENCION: \$ 0.00
ESTADO DE CUENTA	AMORTIZACION ACUMULADO ANTERIOR: \$ 0.00	RETENCION ACUMULADA: \$ 0.00
IMPORTE PAGADO ANTERIOR: \$ 187,808.00	AMORTIZACION ACUMULADO: \$ 0.00	
IMPORTE ESTIMACION: \$ 281,372.26	POR AMORTIZAR (SALDO): \$ 0.00	
IMPORTE ACUMULADO: \$ 469,180.26		
IMPORTE POR PAGAR: \$ 1,169,187.56		

RESUMEN

IMPORTE ESTA ESTIMACION:	\$ 281,372.26
IVA:	\$ 45,019.56
TOTAL A PAGAR:	\$ 326,391.78

ELABORO: *Carlos Vargas Ortega*
 ARO. CARLOS VARGAS ORTEGA
 RESIDENTE DE OBRA

REVISO: *Arq. Carlos Olivas Salcedo*
 ARO. CARLOS OLIVAS SALCEDO
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO: *Jose Luis Rodriguez Hernandez*
 ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

Descripción	M2	124.30	60.34	998.26	62.15	82.16	0%	50%	50%	\$	\$	4,993.13	\$	4,993.13	\$	4,993.13
Suministro y colocación de estante RH de 1 litro de vidrio	M2	100.10	634.77	8204.35		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	82,284.35
Suministro y colocación de cerámica	M2	103.49	132.49	13664.45		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	13,664.45
Suministro y aplicación de pintura	M2	266.60	56.32	21402.78		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	21,740.78
TRABAJOS DE MÓDULOS																
Desmontar juego de sanitarios	LOTE	1.00	500.00	500.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	500.00
Instalación de sanitarios	LOTE	1.00	1100.00	1100.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	1,100.00
Suministro de sanitario	PZ	1.00	850.00	850.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	850.00
Suministro de lavabo, inc. mezcladora	PZ	1.00	1200.00	1200.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	1,200.00
Suministro de inodoro	PZ	1.00	1150.00	1150.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	1,150.00
Retiro de cerámica existente	M2	3.45	65.07	224.49		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	224.49
Suministro y colocación de cerámica	M2	3.45	634.47	2182.32		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	2,182.32
Desmontar puerta existente e instalar puerta nueva de madera	LOTE	1.00	4000.00	4000.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	4,000.00
SALIDA AUTÓMATO																
Retiro de cerámica existente	M2	2.70	65.07	175.69		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	175.69
Suministro y colocación de cerámica	M2	2.70	634.47	1707.87		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	1,707.87
Suministro de espejo y aluminio de 2' 6" con vidrio claro de 6mm	PZ	1.00	9355.58	9355.58		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	9,355.58
Quitado cerámicas existentes	PZ	30.00	60.00	2400.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	2,400.00
Colocación de cerámicas	PZ	30.00	60.00	2400.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	2,400.00
GRABAR ESCALERAS																
Retiro de papel tapiz en piso y muros	LOTE	1.00	2600.00	2600.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	2,600.00
Terminación de muros con aplomado de yeso	M2	82.40	45.00	3708.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	3,708.00
Modificación de barandal	LOTE	1.00	3800.00	3800.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	3,800.00
Suministro de puertas con rejas interior	PZ	2.00	4500.00	9000.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	9,000.00
Suministro y colocación de puerta laminada para exterior	PZ	1.00	4000.00	4000.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	4,000.00
Suministro y colocación de cerámica en escaleras	LOTE	1.00	9500.00	9500.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	9,500.00
Suministro y aplicación de pintura	M2	82.40	56.32	4647.87		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	4,647.87
Suministro y colocación de ventana de 2' 0" x 1' 0" de vidrio de 6mm	PZ	1.00	6000.00	6000.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	6,000.00
ACEROSO																
Suministro y colocación de barandal para discapacitados	LOTE	1.00	6000.00	6000.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	6,000.00
Suministro y colocación de microperforado en color dorado	LOTE	1.00	5300.00	5300.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	5,300.00
Suministro y colocación de microperforado en color rojo	LOTE	1.00	4841.72	4841.72		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	4,841.72
Suministro y colocación de cortina de acero metálica	LOTE	1.00	45881.00	45881.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	45,881.00
OP. CERAS CONHABITANTES																
Cambio de giro de puerta (por cambio de marca, recambio de vidrio y instalación de cerradura)	LOTE	1.00	2438.00	2438.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	2,438.00
Suministro de papel abarado en puertas	LOTE	2.00	1310.00	2620.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	2,620.00
Suministro y colocación de papel abarado en ventanas	LOTE	2.00	1310.00	2620.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	2,620.00
S. ARCELERIA																
SILA DE JUNTAS																
FIO CLARO DE 80' 220 EN ALUMINO DE 2' 02 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00	6119.95	6119.95		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	6,119.95
FIO CLARO DE 7' 220 EN ALUMINO DE 2' 02 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00	6272.96	6272.96		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	6,272.96
PUERTA DE 80' 220 EN ALUMINO DE 2' 02 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00	8650.50	8650.50		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	8,650.50
CUBICULO 5																
FIO DE 2' 02 X 220 EN ALUMINO DE 2' 02 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00	12770.00	12770.00		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	12,770.00
PUERTA DE 80' 220 EN ALUMINO DE 2' 02 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00	8650.50	8650.50		0.00	0%	0%	0%	\$	\$	-	\$	-	\$	8,650.50

M2	6,00	326,85	1961,10	5,00	6,00	100%	0%	100%	0%	100%	\$	1.961,10	\$	-	\$	1.961,10	\$	-	
M2	15,50	493,69	7649,21	15,50	15,50	100%	0%	100%	0%	100%	\$	7.848,24	\$	-	\$	7.848,24	\$	-	
M3	6,89	441,59	396,78	6,89	6,89	100%	0%	100%	0%	100%	\$	3.086,78	\$	-	\$	3.086,78	\$	-	
M2	48,59	395,05	14259,87	46,59	46,59	100%	0%	100%	0%	100%	\$	14.259,87	\$	-	\$	14.259,87	\$	-	
LOTE	1,00	2446,96	2446,95	1,00	1,00	100%	0%	100%	0%	100%	\$	2.446,96	\$	-	\$	2.446,96	\$	-	
PZA	1,00	1835,00	1035,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	0%	100%	\$	1.835,00	\$	-	\$	1.835,00	\$	-	
ACERADOS																			
M2	27,39	179,78	469,69		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.860,69	
M2	27,30	137,32	2078,64		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	20.128,64	
M2	64,62	1696,02	10370,10		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	103.701,01	
PZ	1,00	6550,00	5550,00		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.550,00	
PZ	2,00	3240,00	6480,00		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.480,00	
PZ	1,00	656,08	650,00		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	650,00	
M2	6,60	788,77	5272,46		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.272,46	
M2	132,00	95,32	7939,24		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.272,48	
LOTE	1,00	15183,50	15183,50	0,70	0,70	70%	0%	70%	0%	70%	\$	106.283,10	\$	-	\$	106.283,10	\$	45.546,90	
LIMPIEZA																			
M2	130,10	43,26	5598,13		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.628,13	
VIAJE	6,00	1853,78	11122,68		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	11.122,68	
OFERTAS AREA DE CALDERA																			
PRELIMINARES																			
MONTAJE																			
M2	47,30	16,09	715,76		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	713,76	
LOTE	1,00	4877,78	4877,78		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.872,78	
PZ	1,00	974,55	974,56		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	974,56	
LOTE	1,00	12977,13	12977,13		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12.977,13	
M2	17,25	162,65	2865,89		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.805,89	
PZ	2,00	974,55	1949,12		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.949,12	
PZ	2,00	649,70	1299,40		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.299,40	
PZ	1,00	2436,39	2436,39		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.436,39	
MUROS, BALAY Y CESTILLOS																			
M2	10,00	307,25	3076,59		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.076,59	
M2	12,00	389,09	4669,09		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.656,00	
M2	16,90	1078,12	17142,11		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17.142,11	
M2	7,50	314,84	2351,30		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.351,30	
CONSTRUCCION INTERIOR																			
ACABADOS																			
M2	28,40	284,25	8072,70		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8.072,70	
M2	20,00	278,07	6061,03		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8.064,03	

[Handwritten signature]

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MUROS DE DUROCK 2 CARAS	M2	664.07	783.77	520,540.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Administración y colocación de 60 unidades RTU de Roca de vidrio	M2	64.80	80.34	5,206.03	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
RENOVELACION DE PISOS EXISTENTES	M2	47.00	1,590.00	74,965.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GERANICA	M2	47.00	632.47	29,726.69	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE CERAMICA DE 10CM	ML	77.00	132.49	10,201.73	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SUMINISTRO Y ARTICULACION DE PARTURA	M2	193.00	69.32	13,378.76	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
COCINA												
PUERTA DE 80X130 Y ALUMINIO DE 38/240 EN ALUMINIO DE 2° GRADO CLARO DE 60X1	PZ	2.00	9,386.58	18,773.16	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
VENTANA CORRESPUNDA Y EN ALUMINIO DE 2° GRADO CLARO DE 60X1	PZ	1.00	1,883.20	1,883.20	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
VENTANAS CLAROS DE 60X1												
ELECTRIFICACION												
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TORACORRIENTE	PZ	8.00	537.44	4,299.52	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION	PZ	3.00	537.44	1,612.32	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EN SALA DE JUNTAS CONSTRUCTA RE80758CB	PZ	2.00	2,631.79	5,263.58	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT INTERIOR	PZ	1.00	1,028.84	1,028.84	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SUMINISTRO DE SALIDA PARA MINISPLIT	PZ	2.00	2,438.39	4,876.78	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
VOZ Y DATOS												
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELEFONIA	PZ	6.00	427.98	2,567.88	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PLANCHAS												
SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON	PZ	2.00	21,397.68	42,795.37	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CONSTRUCION EXTERIOR												
IMPERMEABILIZACION A BASE DE PAPEL IMPERMEABILIZADO	M2	15.00	155.32	2,329.80	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AFLANCADO A BASE ETAMPRE ACABADO FIJO	M2	10.00	178.78	1,787.80	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
COLOCACION DE DIGITOS PARA VENTILACION DE CALDERA	LOTE	1.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESCALERA (MIRINA)	LOTE	1.00	6,970.05	6,970.05	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LUPRETA												
LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA	M2	47.30	43.26	2,047.20	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
RETIRO DE ESCORRO PRODUCTO DE LA OBRA	VAJE	3.00	1,853.78	5,561.34	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL				1,638,387.83								
				187,508.02	11.45%	281,372.26	17.17%	469,180.78	28.64%	1,165,187.56	71.35%	

Enfoque

Carlos Vargas

Arq. Carlos Vargas Ortega
Residencial de Obra

Autógrafa

Arq. Carlos Vargas Ortega
Supervisor de Obra


Vc. Bo.

Ing. José Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Citrus S.A. de C.V. DICSA


\$ 1,638,387.83


FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO			ESTIMACION	2		
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			ESTADO:	CHIHUAHUA			DEL:	11/03/2020		
	CONTRATO:	N/A			PREELEMENTALES	SUBPARTIDA:			AL:	28/03/2020	
		PARTIDA:				INTERIOR	HOJA: 2			FECHA:	25/03/2020
							DE: 3				
CONCEPTO											
CLAVE											

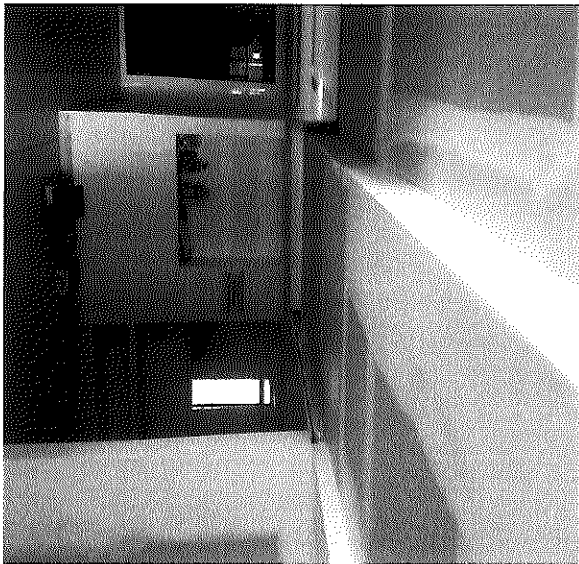TEMP*27	RETIRO DE MINISPLIT	
Elaboró	Autorizó	Vó. Bo.


Arg. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Arg. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra



Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	2
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 11/03/2020
CONTRATO:		PREFIINARES	SUBPARTIDA:	INTERIOR	HOJA: 3	AL: 25/03/2020
N/A				DE: 3	FECHA:	25/03/2020

CONCEPTO

TEMP°27	RETIRO DE MINISPLIT
---------	---------------------

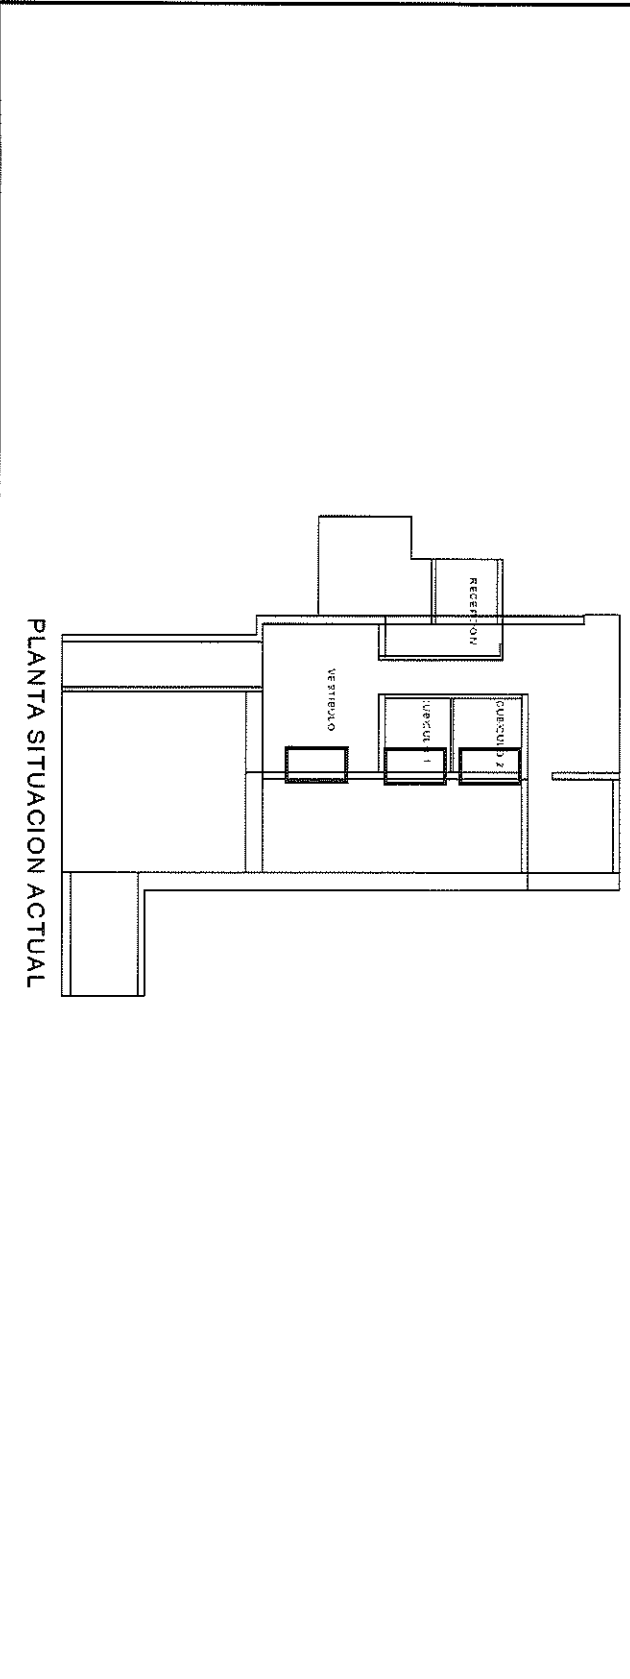

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	2
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	PARTIDA:		SUBPARTIDA:	
		PRELIMINARES		INTERIOR	
CONCEPTO					
CLAVE					
TEMP:39	DEMOLICION DE PARED PARA HACER PUERTA. INCLUYE PERFILADO DE HUECO				



Elaboró

Autorizo

V6. B6.

Carlos Vargas

Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Carlos Olivas

Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

Jose Luis Rodríguez Hernández


Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	2
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		PREFELIMINARES	SUBPARTIDA:	INTERIOR	DE: 3
N/A				HOJA: 3	AL:
				FECHA:	28/03/2020

CLAVE	CONCEPTO
-------	----------

TEMP*39	DEMOLICION DE PARED PARA HACER PUERTA, INCLUYE PERFLADO DE HUECO
---------	--

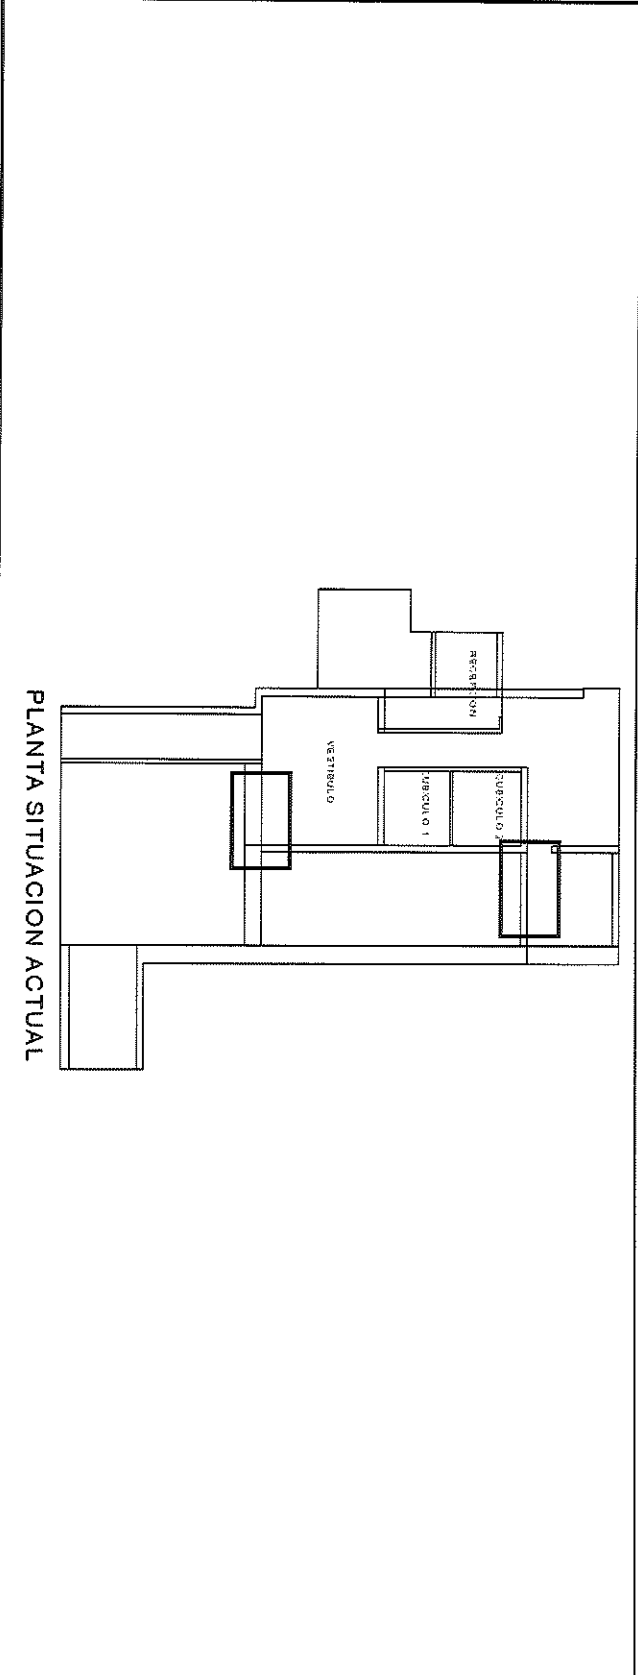

Elaboró

Autorizó

Vo. Ba.


Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	2
CONTRATO:	N/A	PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	EXTERIOR	DEL: 11/03/2020
CLAVE	CONCEPTO				
TEMP+5	DESMONTAR BARANDAL Y REJA EXTERIOR				

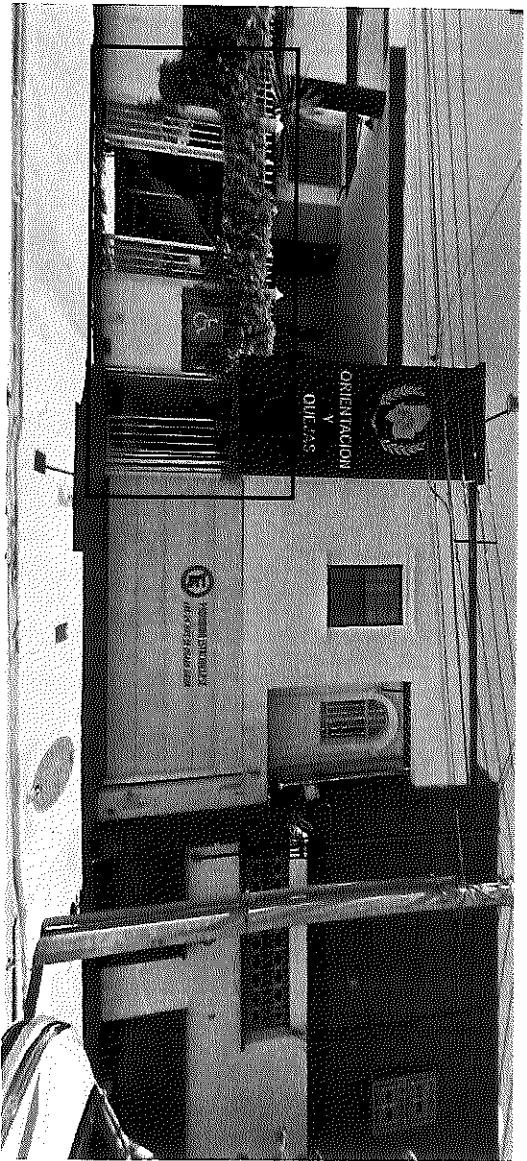

Elaboró

Autorizó

Va. Bo.


Carlos Vargas Ortega
Atq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Carlos Olivas Salcedo
Atq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
Diseños Y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	2
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 11/03/2020
CONTRATO:		PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	EXTERIOR	HOLA: 3	AL: 28/03/2020
PARTIDA:				DE: 3	FECHA:	28/03/2020
CONCEPTO						
CLAVE						
TEMP'S	DESMONTAR BARANDAL Y REJA EXTERIOR					

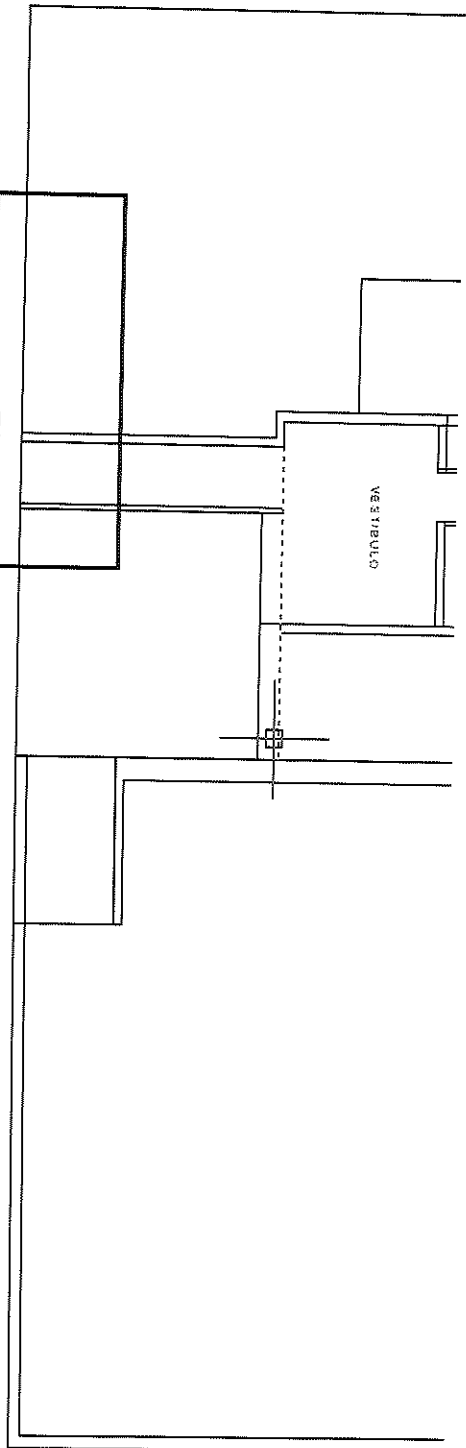

PLANTA SITUACION ACTUAL

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	2
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 11/03/2020
CONTRATO:		PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	EXTERIOR	HOJA: 3	AL: 28/03/2020
PARTIDA:				DE: 3	FECHA:	28/03/2020
CONCEPTO						
CLAVE						

TEMP*28	DEMOLICION Y REUBICACION DE ESCALONES PARA ACCESO A SUBESTACION
---------	---

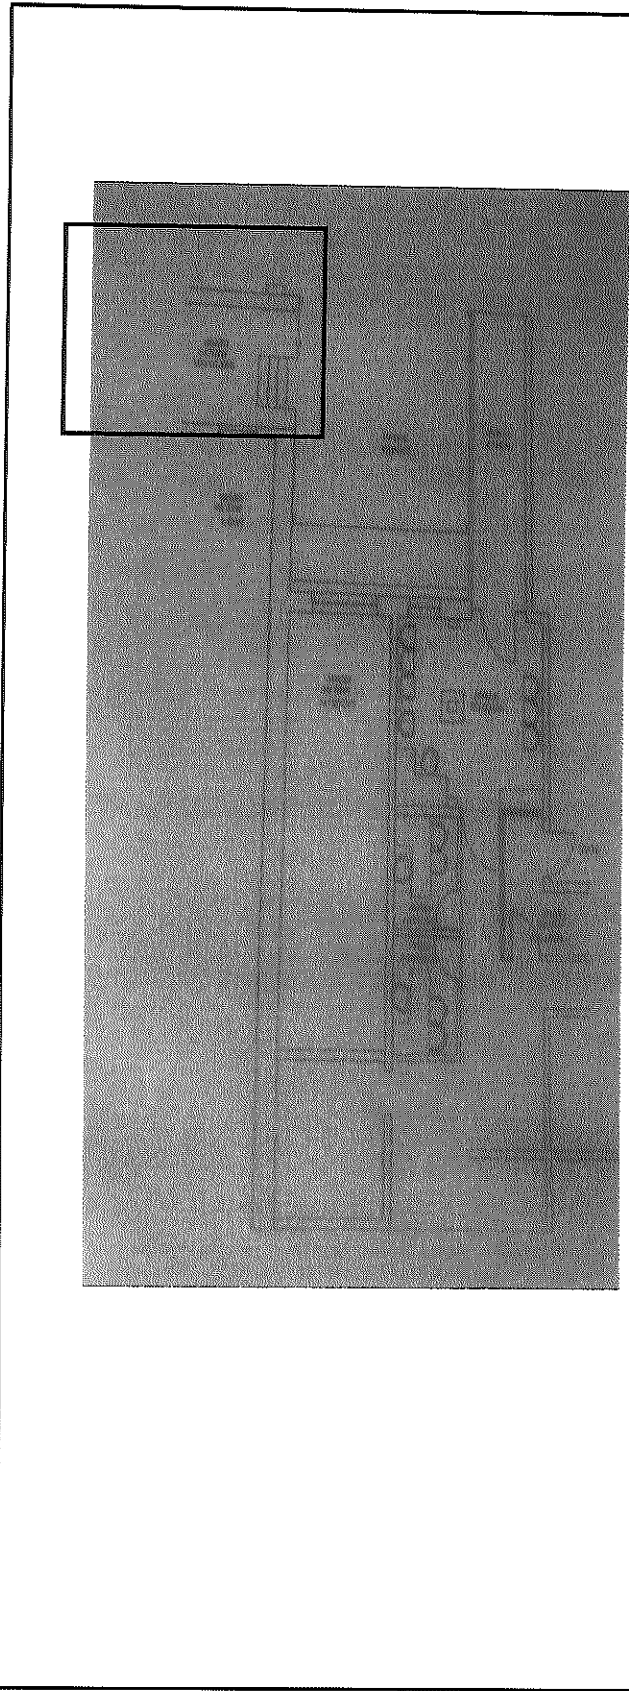

Elaboró

Autorizo

Yo, Bo.

Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	2
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	HOLLA: 2
CLAVE	CONCEPTO				
				DE: 3	AL: 25/03/2020
				FECHA:	25/03/2020

OBRE MURO TAB SOBREMURO DE TABLARCOCA DE HOJA BLANCA

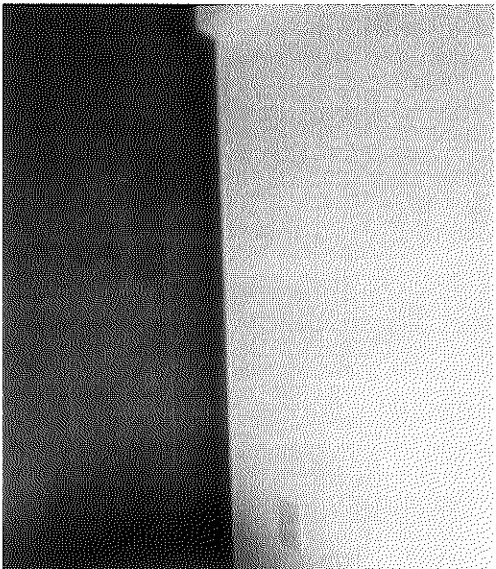

Elaboró

Autorizo

Va. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Art. Darío Olivas Salcedo
Art. Darío Olivas Salcedo
Supervisor de Obra


Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	2
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 11/03/2020
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	DE: 3	AL: 25/03/2020
PARTIDA:		FECHA: 25/03/2020				
N/A						

CLAVE	CONCEPTO
-------	----------

OBRE MURO TAB SOBREMURO DE TABLAROCA DE HOJA BLANCA	
---	--

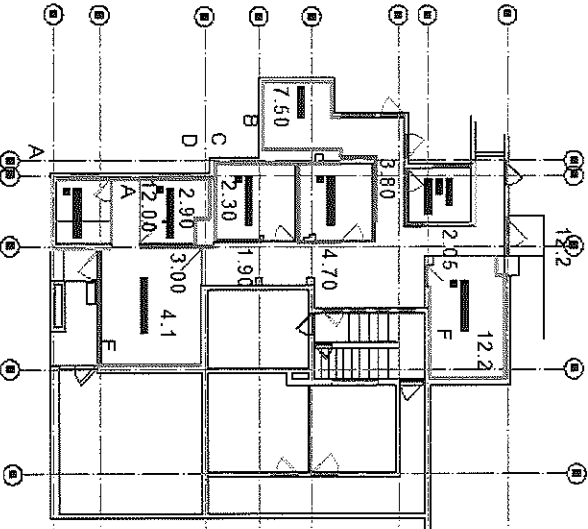

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas
Atq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
Atq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra


[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	2	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA		MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
			DEL:	11/03/2020			
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	HOLA: 3	AL:	25/03/2020
N/A						DE: 3	FECHA:

CLAVE	CONCEPTO
-------	----------

MURO TABL 2 CAL 24" 0.61M LAS HOJAS DE TABLAROCA DEBERAN UNIRSE UNAS A OTRAS DE MANERA QUE NO QUEDEN FORZADAS EN LAS JUNTAS

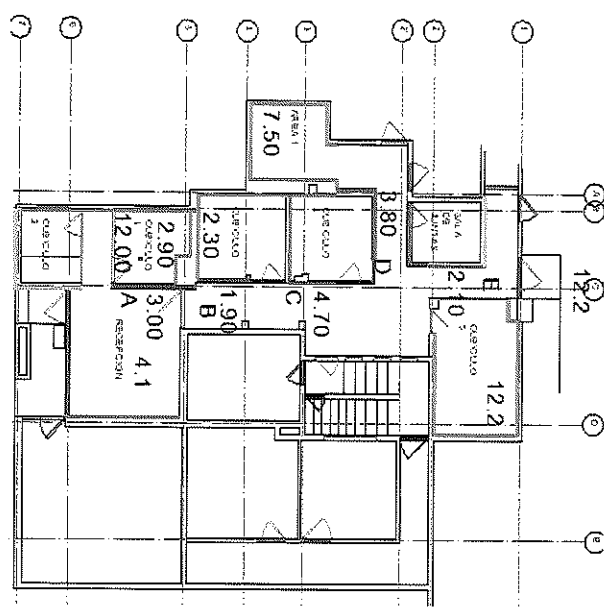

Elaboró

Autorizo

Va. Ba.

Carlos Vargas Ortega
Atq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivas Salcedo
Atq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodríguez Hernández
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR		ACABADOS	DE: 2
PARTIDA:		SUBPARTIDA:		FECHA:	25/03/2020
CLAVE		CONCEPTO			

CAJ 1 CAJILLOS DE TABLARROCA A BASE DE HOJA DE TABLARROCA DE 1/2" SUJETO ACANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL 25

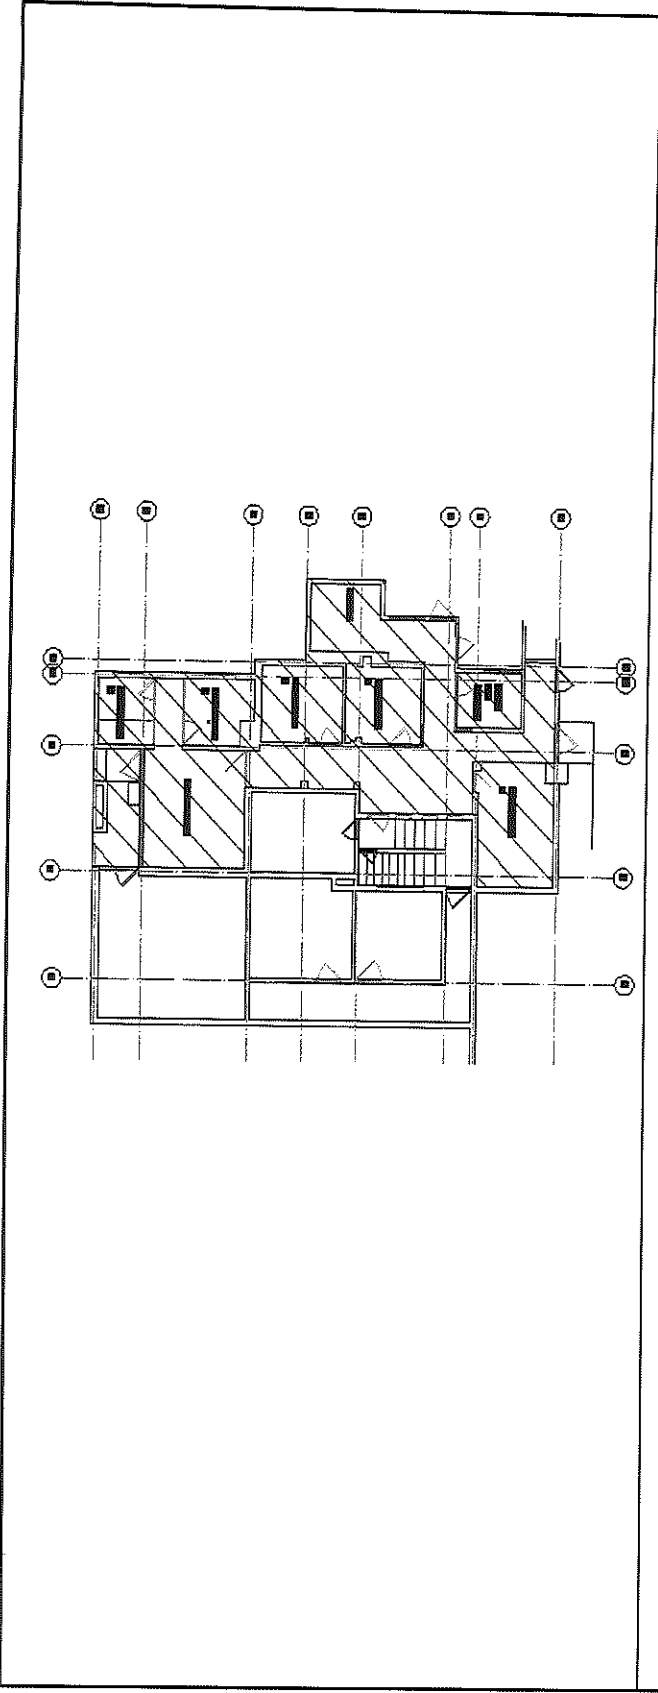

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.


Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodríguez Hernández
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	2
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
			ACABADOS	
CLAVE				
CONCEPTO				
ASLANT				



Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	2
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 11/03/2020
CONTRATO:		SUBPARTIDA:		ACABADOS	FECHA:	28/03/2020
PARTIDA:		CONSTRUCCION INTERIOR		DE: 3		
CLAVE		CONCRETO				

ASLANT SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE R11 DE FIBRA DE VIDRIO

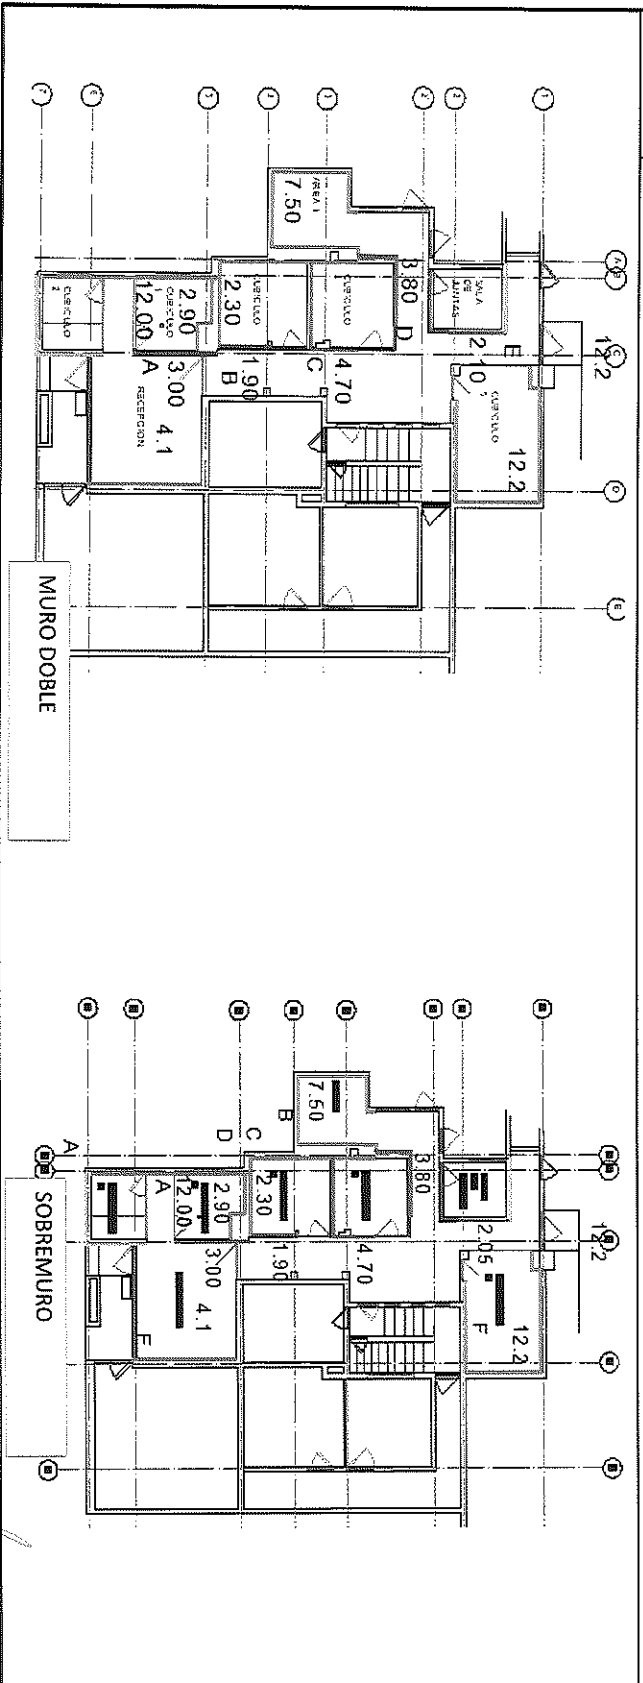

Elaboró

Autorizo

Vo. Bp.

Arg. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Arg. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra


Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	2	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA		MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
							DEL:
CONTRATO:		ELECTRICIDAD	SUBPARTIDA:	HOLA: 2		AL:	25/03/2020
N/A				DE: 2		FECHA:	25/03/2020

CONCEPTO

TEMP*29	SUMINISTRO DE SALIDA PARA MINISPLIT
---------	-------------------------------------

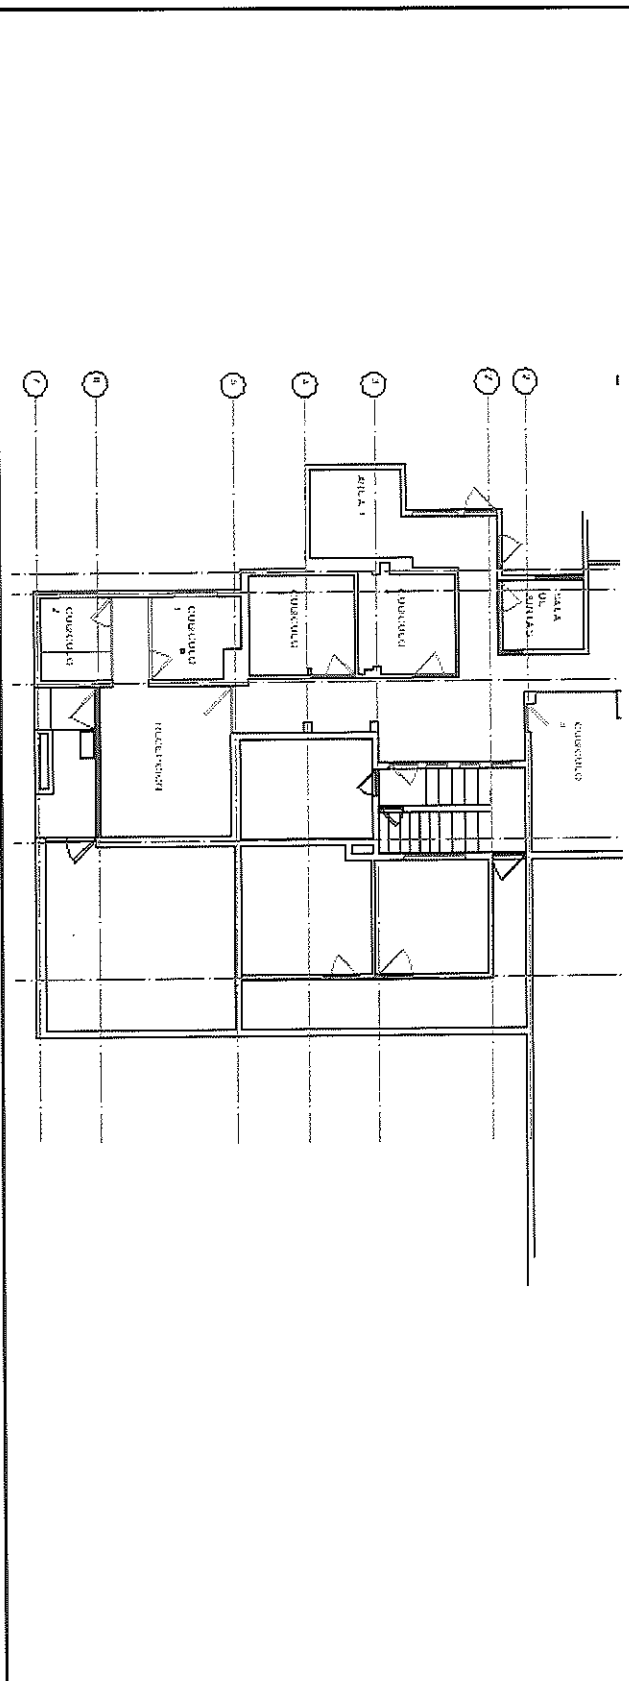

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega

[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo


[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	2
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 11/03/2020
CONTRATO:						AL: 25/03/2020
PARTIDA:		CANDELERIA				FECHA: 25/03/2020
SUBPARTIDA:						
N/A				DE: 2		

CONCEPTO

TEMP*31 INSTALACION DE MINISPLIT EXISTENTE

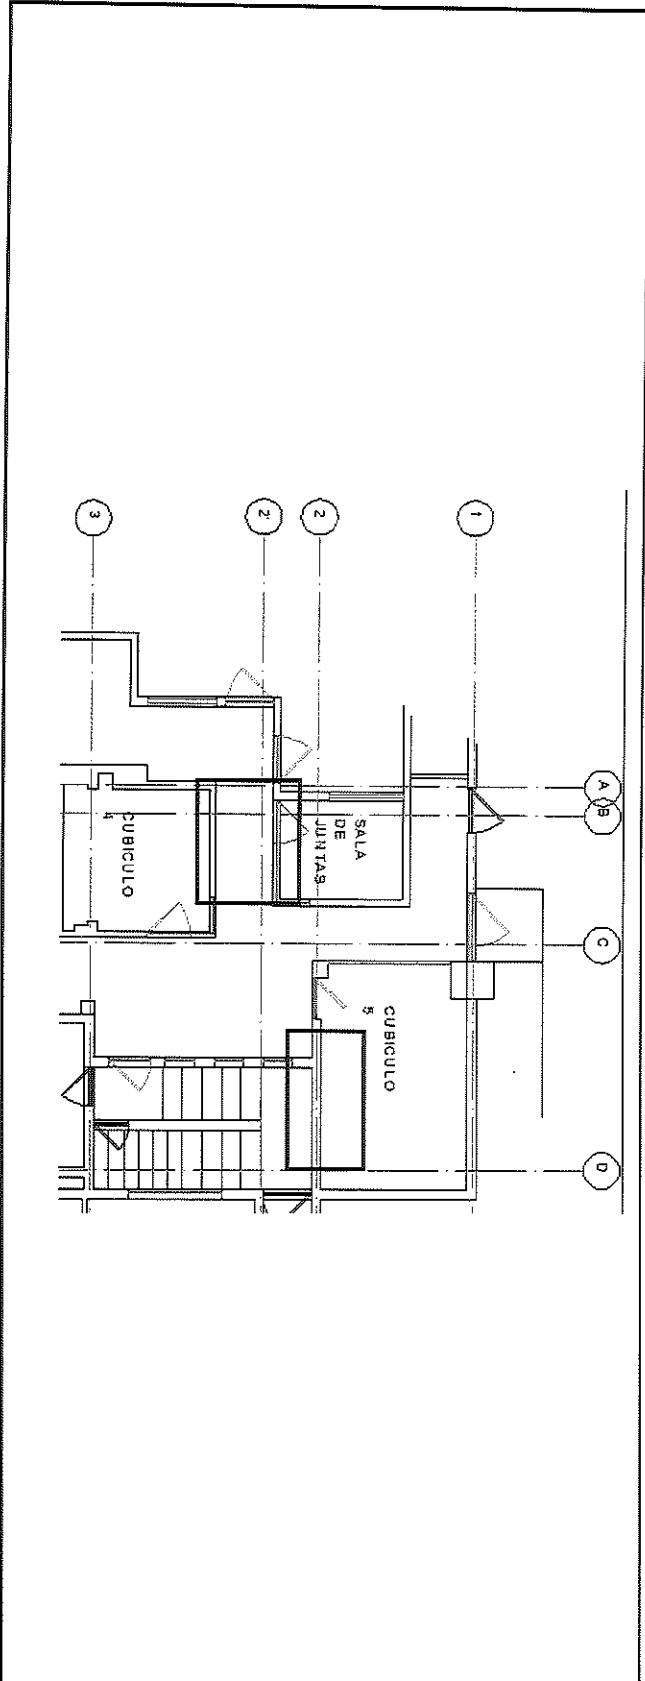

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega


[Signature]
Arq. Carlos Olivares Salcedo

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández

FOTOGRAFIA


CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	2	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	11/03/2020
						AL:	28/03/2020
CONTRATO:		PARTIDA:	CLIMAS	SUBPARTIDA:	HOJA: 2	DE:	3
N/A						FECHA:	28/03/2020
CONCEPTO							

TEMP*33	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TON
---------	--

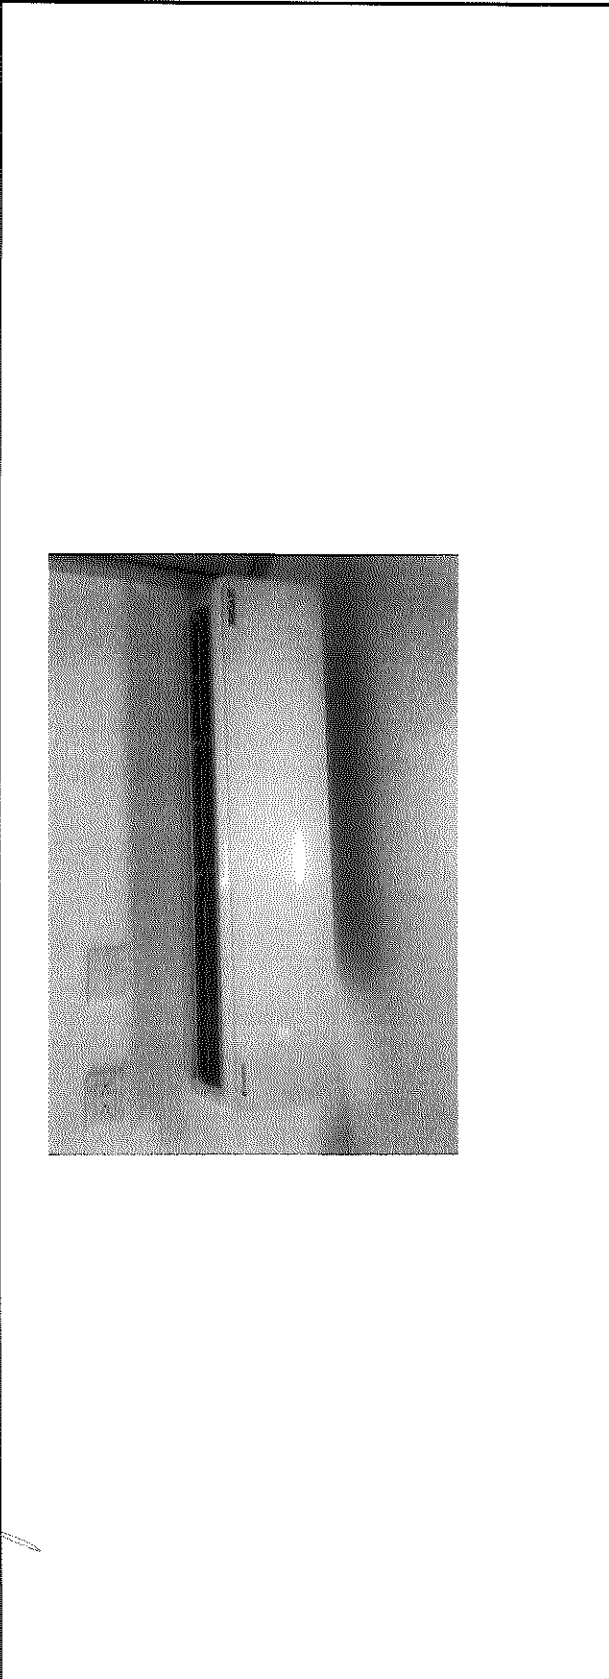


Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra



Arq. Carlos Olivas Salgado
 Supervisor de Obra


Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	2
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 11/03/2020
CONTRATO:		CANCELERIA	SUBPARTIDA:	HOLA: 3	AL: 28/03/2020	FECHA: 28/03/2020
PARTIDA:		DE: 3				
CONCRETO						

CLAVE	TEMP*33
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TON

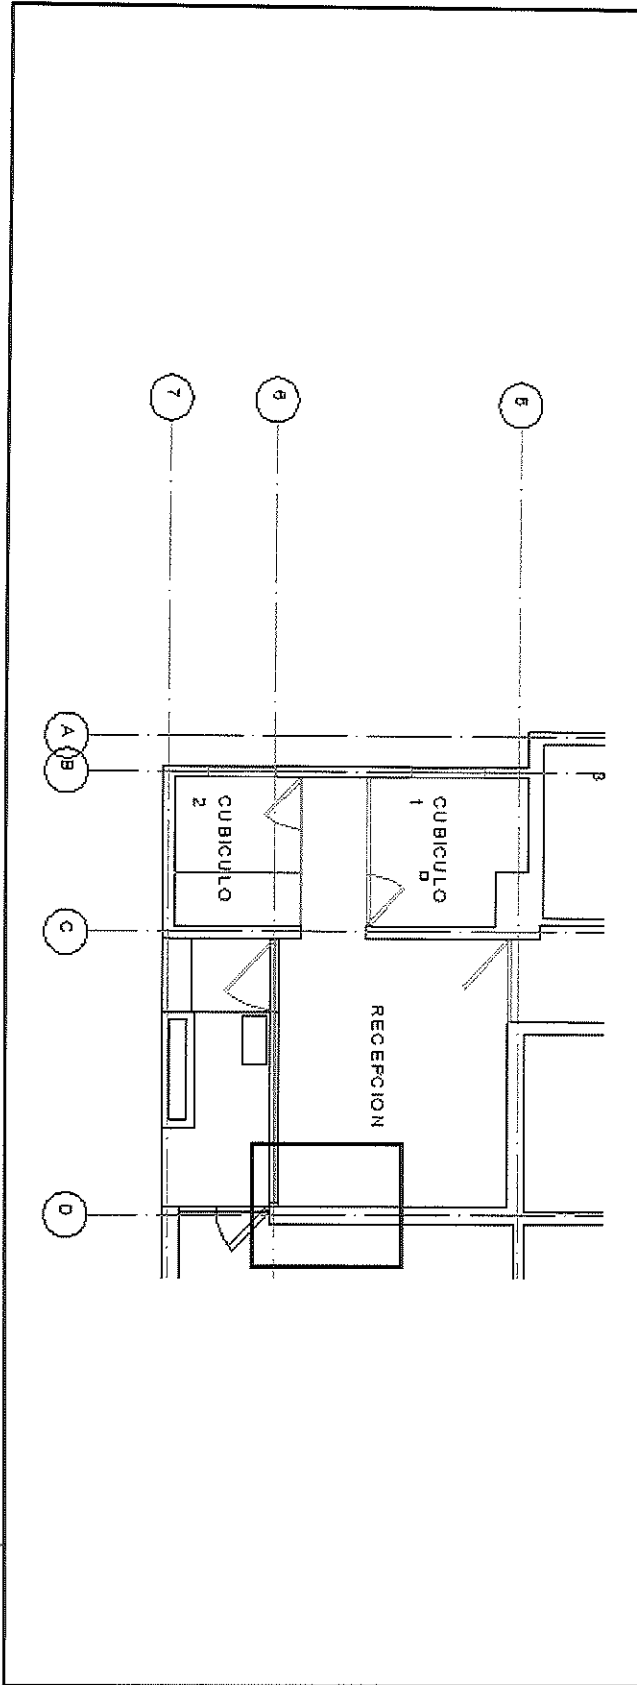

Elaboró

Autorizo

Va. Bo.

Carlos Vargas Orfega
Arq. Carlos Vargas Orfega



[Signature]
Arq. Carlos Olivares Salcedo

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	2
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 11/03/2020
	CONTRATO:			CLIMAS				AL: 28/03/2020
	N/A			PARTIDA:				FECHA: 28/03/2020
CONCEPTO								
CLAVE								

TEMP*32	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON
---------	--

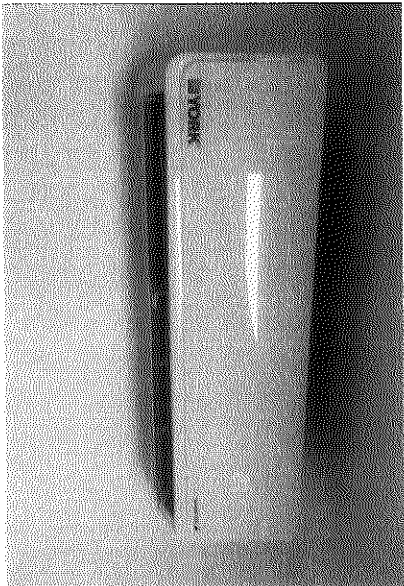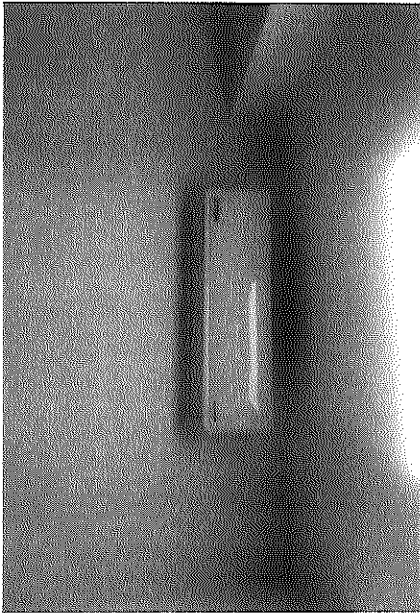

Elaboró

Autoriza

Vo. Bo.

Carlos Vargas
Arg. Carlos Vargas Ortiga
 Residente de Obra


[Signature]
Arg. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO		ESTIMACION	2
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 11/03/2020
CONTRATO:						AL: 26/03/2020
	N/A	PARTIDA:	CANCELERIA	SUBPARTIDA:		FECHA: 25/03/2020
CONCEPTO						

CLAVE	CONCEPTO
TEMP*32	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON

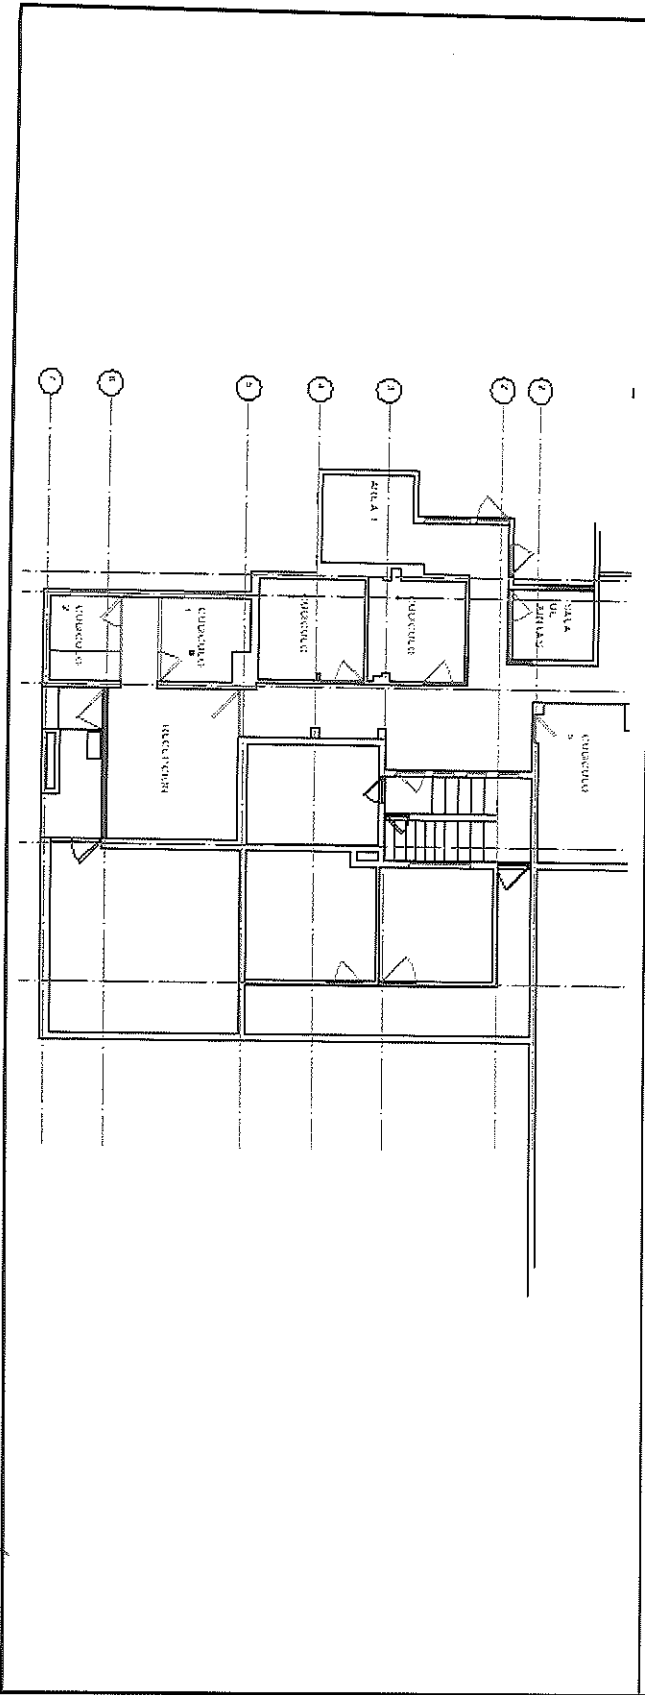

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas
 Arq. Carlos Vargas Ortega

[Signature]
 Arq. Carlos Olivas Salcedo


[Signature]
 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	2	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	11/03/2020
						AL:	26/03/2020
CONTRATO:		CANCELERIA	SUBPARTIDA:	DE: 2		FECHA:	25/03/2020
PARTIDA:						N/A	

CLAVE	CONCEPTO
-------	----------

DEM 1	DEMOLICION DE PISO Y SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA CONSENSADOS
-------	--

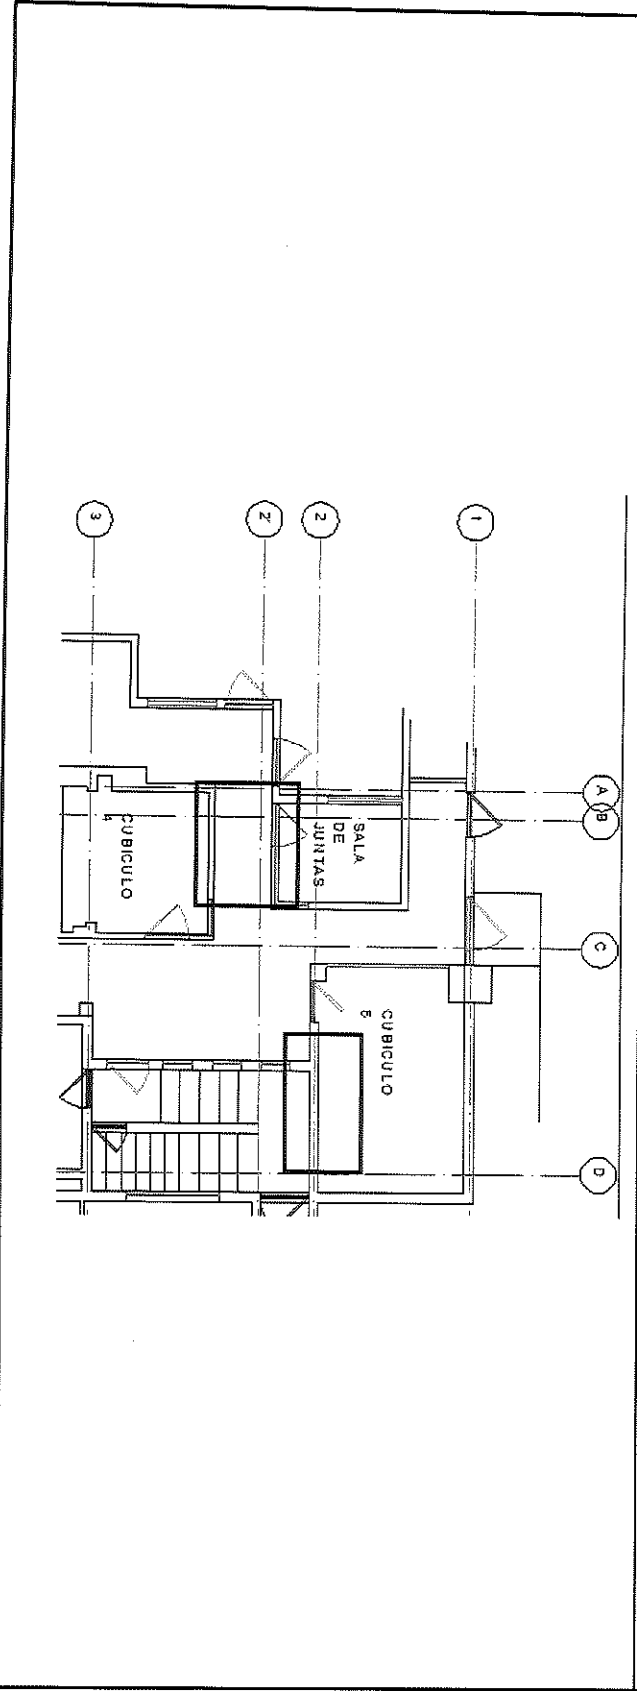

Elaboró


Autorizo


Va. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega

[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández

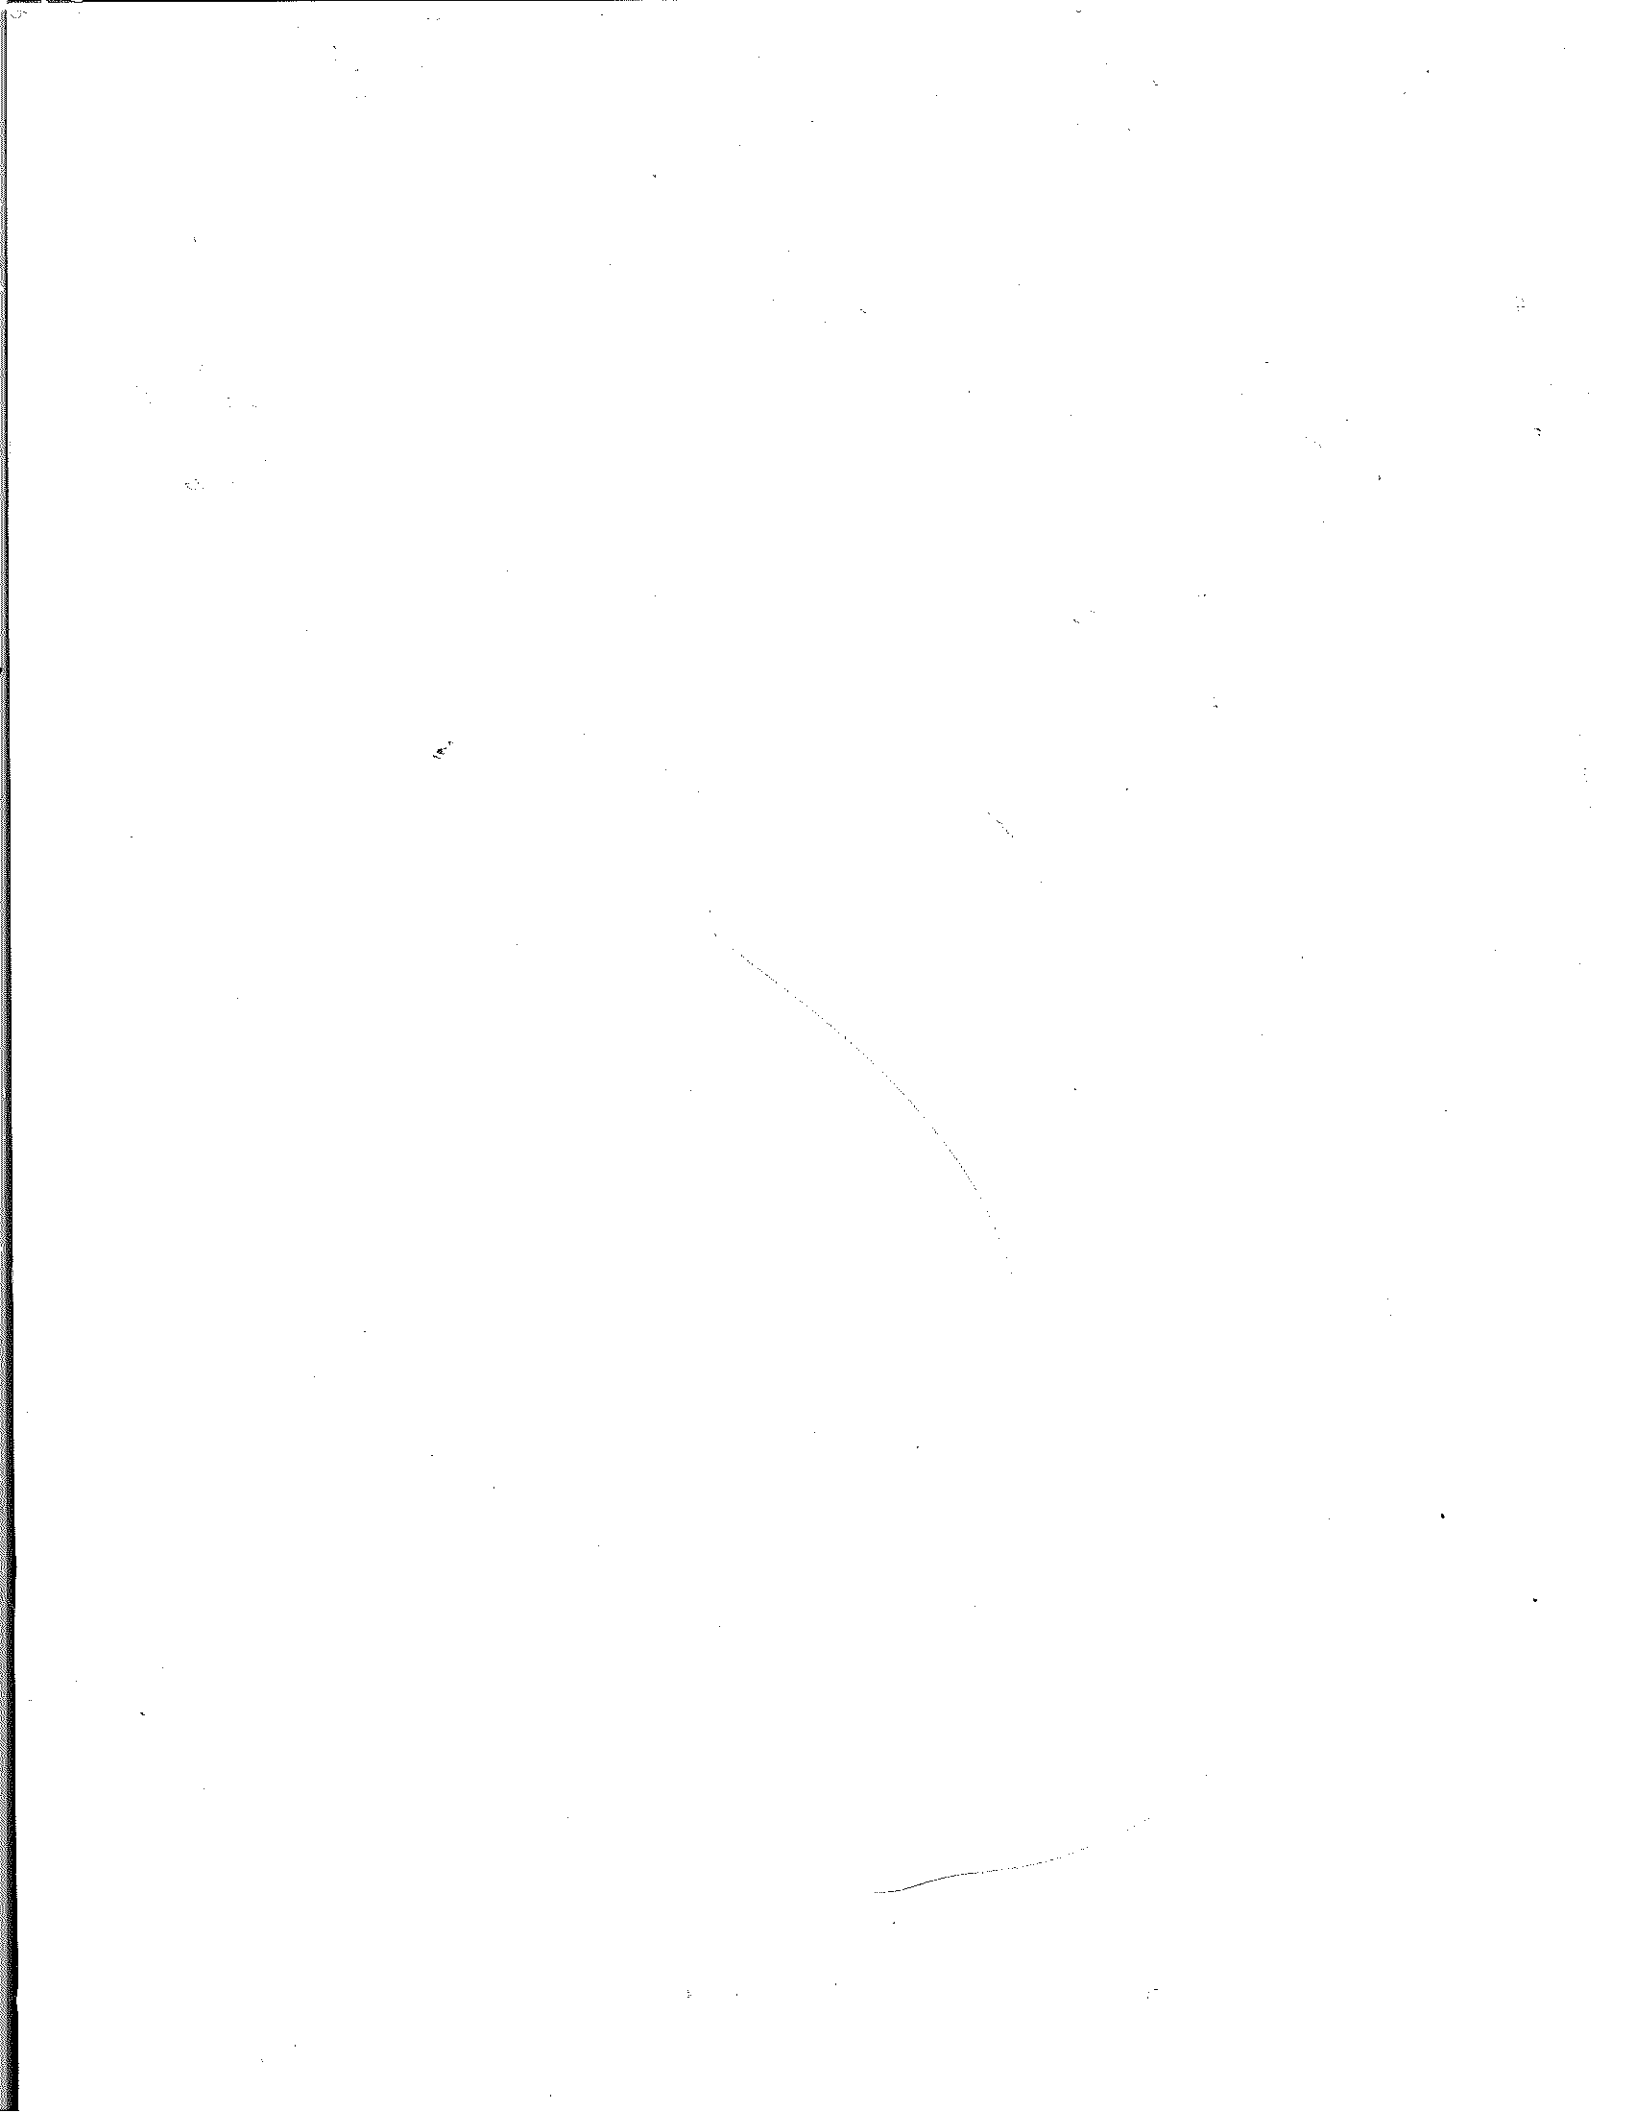



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr. Diana Trevizo
Rep rptPoliza

Póliza: C00466 Del 27/03/2020

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2020
02:03 p. m.
Página | 1

Concepto: F/2890 - Obra Pública : REM/OFNAS/PRINC - REMODELACION OFICINAS PRINCIPALES C.E.D.H. Contrato : 2. GP Folio: 51

Beneficiario: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110120-C0101-18-6223-2	Reconstrucción y remodelación por	\$210,222.32		GP Folio: 51
0002	8260-110120-C0101-18-6223-2	Reconstrucción y remodelación por		-\$210,222.32	GP Folio: 51
0003	2113-00085-1	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES	\$210,222.32		GP Folio: 51
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$210,222.32	GP Folio: 51
Sumas iguales =>			<u>420,444.64</u>	<u>-420,444.64</u>	



BancaNet Empresarial

Viernes 27 de Marzo del 2020, 2:32:40 PM Centro de México

Historial -

Cliente	78862443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de operación

Datos de la operación

Nombre de la operación	Pago Interbancario	Estatus	Por Aplicar
Fecha de solicitud	27/03/2020 13:44:00	Fecha	Mismo Día
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	167078
Importe	\$ 210,222.32	Autorizador 1	07 PERLA I RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA


Cuentas

	Cuenta destino	Cuenta origen	
Tipo			Cheques
Sucursal			934
Cuenta	058150600188600110		3513215
Nombre	BANREGIO		
Fecha valor / Aplicación			

Datos adicionales

RFC			\$ 0.00
IVA			
Clave de rastreo			2990
Número de referencia		EST No 3 REMODELACION FACHADA	
Concepto del Pago		DISENOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	
Beneficiario			

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2020
02:03 p. m.
Página | 1

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Póliza: C00466 Del 27/03/2020

Concepto: F/2890 - Obra Pública : REM/OFNAS/PRINC - REMODELACION OFICINAS PRINCIPALES C.E.D.H. Contrato : 2. GP Folio: 51

Beneficiario: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110120-C0101-18-6223-2	Reconstrucción y remodelación por	\$210,222.32		GP Folio: 51
0002	8260-110120-C0101-18-6223-2	Reconstrucción y remodelación por		\$210,222.32	GP Folio: 51
0003	2113-000854	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES	\$210,222.32		GP Folio: 51
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$210,222.32	GP Folio: 51
Sumas iguales =>			<u>420,444.64</u>	<u>420,444.64</u>	



BancaNet Empresarial

Viernes 27 de Marzo del 2020, 2:32:40 PM Centro de México

Historial -

Ciiente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de operación

Datos de la operación

Nombre de la operación	Pago Interbancario	Estatus	Por Aplicar
Fecha de solicitud	27/03/2020 13:44:00	Fecha	Mismo Día
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	167076
Importe	\$ 210,222.32	Autorizador 1	07 PERLA I RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

	Cuenta destino	Cuenta origen	Cheques
Tipo			934
Sucursal			3513213
Cuenta	058150600168600110		
Nombre	SANREGIO		
Fecha valor / Aplicación			

Datos adicionales

RFC		\$ 0.06
IVA		
Clave de rastreo		2690
Número de referencia		
Concepto del Pago		EST No 3 REMODELACION FACHADA
Beneficiario		.DISENOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal



DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

RFC: DCC060124KS2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31125
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 2890
Fecha: 26/3/2020 15:28:54

Datos del cliente:
Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5
Domicilio: Av. Zarco No. 2427, Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: I01 - Construcciones


Table with 7 columns: Clave, Cantidad, Clave Unidad SAT, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 72102900, 1.00, E48, Servicio - PAGO DE ESTIMACION No. 3 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION EN COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH., 181,226.14, 0.00, 002 - IVA - 28,996.18, 181,226.14

Observaciones

Importe con letra:
DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 32/100

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (181,226.14), Impuestos Traslados (28,996.18), Total (210,222.32)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

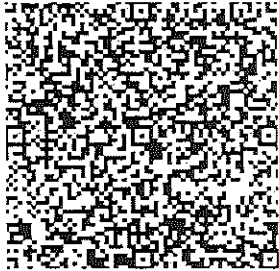

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408408629
Folio fiscal: 46828682-176A-4A2E-BD3F-4B3B25A813A7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 26 2020 - 16:28:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
GcvHUexqCWJnWkZdfg35+BPHygn+HFIdadhFB8CBaBW6i9i62YfIBMysqdtH4B0Rf+qGdgyGjuyPBUBWZw2+t
GWJQeeSb5mDBQJTIekZwc7JZVs6DaCou/ZXXRw7rvSSbKW5oT/2hCAjHylt30fzB6hA2e7/o9ESOBrcsn46ka
UltaDpeCv2hYPAITbH+HN27irusZHFaotjI4U4SeWci6Y+22e3vz6HgUdeXnUaVX2TzldwVtug0tgnmEYw5N
B2HVb80eCf8fo7FdEanZt4jO6japZ69kj42HxTE655CulbAbvljzKnZJLbF2/d8C4xransX/+oG9klIpVg==

Sello del SAT:
Ch3ncC4/fPsWeacyZluowlID/TB8MA1uA6hPw+d+bmhQNeIfOEXxuzJM7VC8uXH/8kmjRLXip7LsoJD
Ss1ISuAEU8AeRu92qdsbYu+oHJpPS92zRjPKXNLenaSovJ1Zsol/GE4Y+r1ywOtn5v3PxcOWFDrScVm
VeAQxbO2pEEV6iyjceSKTc93pTb4hLkuIhngnIRsV6Kiyrgo+Zdje0raOHMa8YOWaI51g1Mc+sX2Rj1J
JGJ3iTrPB8vgcZUvmpjoOnR7T2x4yxeQ93nPeD8iC+uV2dTKigifz7b4j3a70oXyAaOmLLDUmr385Euz
X99/VwYJOYd3+DlIpiV7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|46828682-176A-4A2E-BD3F-4B3B25A813A7|2020-03-26T16:28:56|MAS0810247C0|GcvHU
exqCWJnWkZdfg35+BPHygn+HFIdadhFB8CBaBW6i9i62YfIBMysqdtH4B0Rf+qGdgyGjuyPBUBWZw2
+tGWJQeeSb5mDBQJTIekZwc7JZVs6DaCou/ZXXRw7rvSSbKW5oT/2hCAjHylt30fzB6hA2e7/o9ESOB
rcsn46kaUltaDpeCv2hYPAITbH+HN27irusZHFaotjI4U4SeWci6Y+22e3vz6HgUdeXnUaVX2TzldwV
Tug0tgnmEYw5NB2HVb80eCf8fo7FdEanZt4jO6japZ69kj42HxTE655CulbAbvljzKnZJLbF2/d8C
4xransX/+oG9klIpVg==|00001000000404486074||

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTROL DE ESTIMACIONES**

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.

REMEDIACION OFICINAS




OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y BUS ACCESORIOS
UBICACION:	AVE. ZARCO N° 2427, CDL. ZARCO
CONTRATISTA:	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.
ESTIMACION No.	3
PERIODO:	Del 26 al 07 de Abril del Año 2020
FECHA HOJA:	UNO Jueves, 02 de abril de 2020

N° DE CONTRATO: (IMPORTE DEL CONTRATO):	\$	S/N	1,638,367,83
	GLOBAL A LA FECHA		
PAGO ANTERIOR	\$	ESTA ESTIMACION	\$
469,180,26		181,226,14	
PAGO ACUMULADO	\$	POR EJERCER	\$
650,406,40		650,406,40	987,961,42

CONCEPTO	CONTRATADO	GLOBAL A LA FECHA
OBRA NORMAL:	\$	469,180,26
MATERIALES	\$	
CONTRATO FINAL	\$	
OBRA EXCEDENTE:	\$	
OBRA EXTRAORDINARIA:	\$	
ESCALATORIA:	\$	181,226,14
TOTAL:	\$	650,406,40

AVANCE PROGRAMADO:		ANTICIPO OTORGADO	\$	RETENCIONES	
AVANCE REAL:	40%	% DE I. V. A-	-		
AVANCE ESTA ESTIMACION:	11%	ANTICIPO OTORGADO	\$		
ESTADO DE CUENTA		AMORTIZACION ACUMULADO ANTERIOR:	\$		
IMPORTE PAGADO ANTERIOR:	\$	ESTA AMORTIZACION	0,00		
IMPORTE ESTIMACION:	\$	AMORTIZADO ACUMULADO:	0,00		
IMPORTE ACUMULADO:	\$	IMPORTE RETENIDO ANTERIOR:	\$		0,00
IMPORTE POR PAGAR:	\$	RETENCION ACUMULADA:	\$		0,00

RESUMEN	
IMPORTE ESTA ESTIMACION:	\$ 181,226,14
IVA:	\$ 26,986,18
TOTAL A PAGAR:	\$ 210,222,32

ELABORO:	 ARQ. CARLOS VARGAS ORTEGA RESIDENTE DE OBRA
REVISO:	 ARQ. CARLOS OLIVÁS SALCEDO SUPERVISOR DE OBRA
AUTORIZO:	 ING. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DIGSA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CONTROL DE ESTIMACION

REMODELACION OFICINAS

OBRA: REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS AVE. ZARCO N° 2437, COL. ZARCO	NOMBRE DEL CONTRATO		ESTIMACION No.		HOJANO. 2				
	No. DEL CONTRATO		PERIODO.						
	IMPORTE DEL CONTRATO:		FECHA:						
CONTRATISTA: GISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	NO. PAQUETES	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ESTA.	ACUM. POSTERIOR	IMPORTE POR EJECUTAR

DESCRIPCION DE OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	NO. PAQUETES		PORCENTAJE DE AVANCES		ANTERIOR	ESTA. EST.	ACUMULADO	IMPORTE POR EJECUTAR
					ANTERIOR	ESTA.	ANTERIOR	ESTA.				
PRESUPUESTO REMODELACION CEBS												
PRELIMINARES												
INTERIOR												
TRAZO Y REVELACION	M2	130,10	19,60	2556,95	130,10		100%	0%	2.536,95		\$ 2.536,95	\$ -
DEMOLICION DE MUROS DE TABLARCOA	M2	34,28	178,66	6121,62	34,28		100%	0%	6.021,62		\$ 6.021,62	\$ -
DESMONTAR Y DESCONEXION DE SISTEMA ELECTRICO	LOTE	1,00	6034,35	6034,35	1,00		100%	0%	6.034,35		\$ 6.034,35	\$ -
DESMONTAR CANCELERIA	LOTE	1,00	5260,65	5260,65	1,00		100%	0%	5.260,65		\$ 5.260,65	\$ -
DEMOLICION DE PARED Y REPARACION DE HUECO PARA CALDERA	LOTE	1,00	4735,80	4735,80	1,00		100%	0%	4.735,80		\$ 4.735,80	\$ -
RETIRO DE JINSPUT	PZ	3,00	974,55	2923,65	3,00		100%	0%	2.923,65		\$ 2.923,65	\$ -
DEMOLICION DE PARED PARA HACER PUERTA, HICOTE PERIFONEO DE HUECO	PZ	2,00	1624,25	3248,52	2,00		100%	0%	3.248,52		\$ 3.248,52	\$ -
EXTERIOR												
DESMONTAR REJAS METALICAS	PZ	9,00	747,30	6725,70	9,00		100%	0%	6.747,30		\$ 6.747,30	\$ -
DESMONTAR BARANDAL Y REJA DE ACCESO	PZ	1,00	2923,67	2923,67	1,00		100%	0%	2.923,67		\$ 2.923,67	\$ -
DESMONTAR PORTOR ELECTRICO	PZ	1,00	2538,39	2538,39	1,00		100%	0%	2.538,39		\$ 2.538,39	\$ -
DEMOLICIONES EN FECHADA (desmontar molduras de puertas y ventanas)	LOTE	1,00	4160,65	4160,65	1,00		100%	0%	4.160,65		\$ 4.160,65	\$ -
DEMOLICION DE MURO DE LAURILLO PARA HACER ACCESO A OFICINAS	M2	1,00	2698,82	2698,82	1,00		100%	0%	2.698,82		\$ 2.698,82	\$ -
RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	M2	55,00	65,97	3628,35	55,00		100%	0%	3.643,92		\$ 3.643,92	\$ -
RETIRO DE FACHALETA DE LADRILLO EN AREA DE COCHERA	M2	6,72	97,59	655,80	6,72		100%	0%	655,80		\$ 655,80	\$ -
RETIRO DE FACHALETA DE LADRILLO PARA LA COLOCACION DE BARANDAL	M2	13,00	130,67	1698,71	13,00		100%	0%	1.268,07		\$ 1.268,07	\$ -
DEMOLICION Y REHABILITACION DE ESCALONER PARA ACCESO A SUBESTACION	M2	1,00	3248,52	3248,52	1,00		100%	0%	3.248,52		\$ 3.248,52	\$ -
CONSTRUCCION INTERIOR												
ACERILLADOS												
SORREMURO DE TABLARCOA DE HOJA BLANCA	M2	90,20	284,25	25659,35	45,10	45,10	50%	50%	12.819,68	12.819,68	\$ 25.639,35	\$ -
MURO DE TABLA ROCA DE DOS CARAS A BASE DE HOJA GALVANIZADA DE 500 CAL 25 COLOCADA EN TABLA ROCA DE 600 MM DE ESPESOR Y 1200 MM DE ANCHO DE TABLA ROCA DEBERAN SER EN LAS JUNTAS DE TABLA ROCA QUE NO QUEDEN FORZADAS EN LAS JUNTAS	M2	34,10	383,11	13064,95	17,05	17,05	50%	50%	6.532,03	6.532,03	\$ 13.064,05	\$ -
ALISO Y ACABADO A BASE DE CEMENTO Y UN ANCHA DE CARGA SUPERADA DE LA ESTRUCTURA ESCALONER @2"	M2	130,10	276,07	35918,91	130,10	130,10	100%	0%			\$ 36.176,91	\$ -
CANILLOS DE TABLARCOA A BASE DE HOJA DE TABLARCOA DE 1/2 SUJETO AGUAFLETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 1500 CAL 25	M/L	32,27	284,24	9174,42	16,14	16,14	50%	50%	4.586,21	4.586,21	\$ 9.172,42	\$ -
ANTEPECHO DE TABLARCOA EN PUERTA Y VERTINAS DE CANCELERIA	M/L	6,51	386,10	2513,51	6,51	6,51	100%	0%			\$ 2.513,51	\$ -


		M2	124.30	60.34	990.28	62.15	62.15	124.30	50%	100%	\$	4,993.13	\$	4,993.13	\$	9,986.26	\$	
	transferencia y colocación de sistema RTI de fibra de vidrio																	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	H2	103.10	633.47	824.45			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	82,284.35	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE CERAMICA DE 10CM	H2	105.40	132.49	1394.45			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	13,984.45
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	H2	398.50	69.32	2740.78			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	27,407.78
	TRABAJOS DE BAÑOS																	
	DESQUINTAR JUEGO DE SANTARIOS	LOTE	1.00	500.00	500.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	500.00
	INSTALACION DE SANTARIOS	LOTE	1.00	1100.00	1100.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1,100.00
	SUMINISTRO DE SANTARIO	PZ	1.00	850.00	850.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	850.00
	SUMINISTRO DE LAVABO, INC. MEZCLADORA	PZ	1.00	1200.00	1200.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1,200.00
	SUMINISTRO DE INJERTO	PZ	1.00	1150.00	1150.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1,150.00
	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	H2	3.45	85.97	294.49			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	294.49
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	H2	3.45	632.47	2182.02			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	2,182.02
	DESQUINTAR PUERTA EXISTENTE E INSTALAR PUERTA NUEVA DE MADERA	LOTE	1.00	4000.00	4000.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	4,000.00
	SALIDA ALBIFRISO																	
	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	H2	2.70	65.97	176.69			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	176.69
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	H2	2.70	632.47	1707.67			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1,707.67
	PUERTA DE 80X20 Y CUALITAD DE 20X20 EN ALUMINIO DE 2" GZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00	936.68	936.68			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	936.68
	QUITAR CERAMICAS EXISTENTES	PZ	30.00	80.80	2400.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	2,400.00
	COLOCACION DE CERAMICAS	PZ	30.00	80.80	2400.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	2,400.00
	MEDIO DE ESCALERAS																	
	RETIRO DE PAPEL PIZ EN PISO Y MUROS	LOTE	1.00	2000.00	2000.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	2,000.00
	TERMINACION DE MUROS CON CORTAPLANO DE YESO	H2	82.40	45.90	3784.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	3,784.00
	MODIFICACION DE BARANDAL	LOTE	1.00	3000.00	3000.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	3,000.00
	SUMINISTRO DE PUERTAS CON REJILLAS INFERIOR EXTERIOR	PZ	2.00	4950.00	8100.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	8,100.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINADA PARA ESCALERAS	PZ	1.00	4000.00	4000.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	4,000.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN	LOTE	1.00	9500.00	9500.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	9,500.00
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	H2	92.40	69.32	4892.97			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	4,892.97
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2.00 X 1.00 DE VIDRIO DE 6MM	PZ	1.00	6000.00	6000.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	6,000.00
	ACCESOS																	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL PARA DISCAPACITADOS	LOTE	1.00	5000.00	5000.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	5,000.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROPERFORADO EN COLOR DORADO	LOTE	1.00	5500.00	5500.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	5,500.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROPERFORADO EN COLOR ROJO	LOTE	1.00	4841.72	4841.72			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	4,841.72
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE ACERO METALICA	LOTE	1.00	4584.00	4584.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	4,584.00
	OFERTAS UNICIDAD REYES																	
	CAMBIO DE CINTO DE PUERTA (de cambio de mano, hacia do vidrio y colocacion de ceramica)	LOTE	1.00	2430.00	2430.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	2,430.00
	SUMINISTRO DE PAPEL ARENADO EN PUERTAS VENTANAS	LOTE	2.00	1310.00	2620.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	2,620.00
	COBDELETERA																	
	SALA DE JUNTERAS																	
	FIO CLARO DE 68'220 EN ALUMINIO DE 2" GZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00	6119.95	6119.95			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	6,119.95
	FIO CLARO DE 79'220 EN ALUMINIO DE 2" GZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00	6272.96	6272.96			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	6,272.96
	PUERTA DE 80X20 EN ALUMINIO DE 2" GZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00	8550.50	8550.50			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	8,550.50
	CHUBIQUEROS																	
	FIO 85'220 EN ALUMINIO DE 2" GZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00	12770.00	12770.00			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	12,770.00
	PUERTA DE 80X20 EN ALUMINIO DE 2" GZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1.00	8550.50	8550.50			0.00	0%	0%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	8,550.50

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	3
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 26/03/2020
CONTRATO:						AL: 07/04/2020
PARTIDA:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	FECHA: 07/04/2020	
N/A				DE: 3		

CLAVE	CONCEPTO
-------	----------

OBRE MURO TABSOBREMURO DE TABLAROCA DE HOJA BLANCA

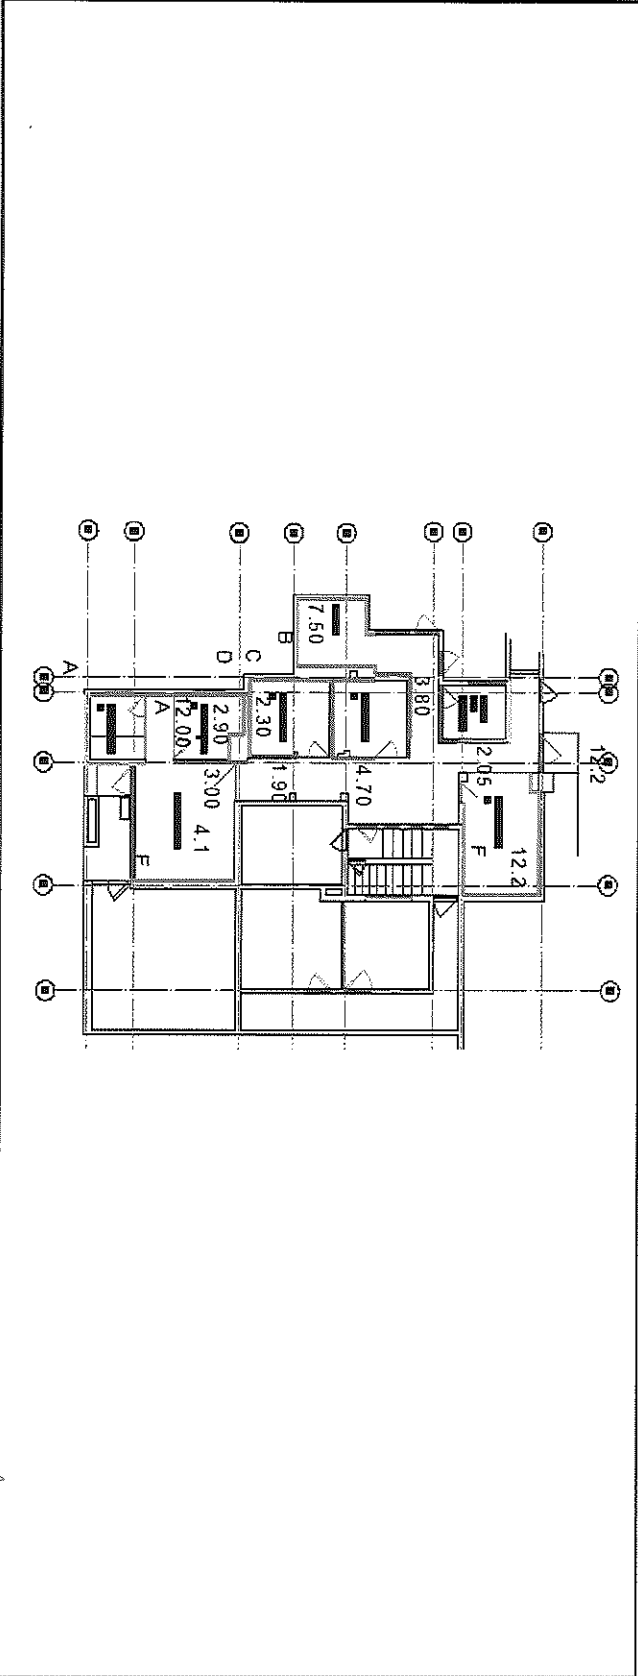

Elaboró

Autorizo

No. Bo

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

José Luis Rodríguez Hernández
Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	3
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	PARTIDA:		ACABADOS	
		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:		HOJA: 2
					DE: 3
CLAVE	CONCRETO				

OBRE MURO TABSOREMURO DE TABLAROCA DE HOJA BLANCA



Elaboró

Autorizo

Vo. Bo

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	3
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	DEL: 26/03/2020
					AL: 07/04/2020
					FECHA: 07/04/2020
CLAVE	CONCEPTO				

MURO DE TABLA ROCA DE DOS CARAS A BASE DE HOJA DE TABLAROCA DE 1/2" SUJETO A CANALETAS DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL. 25 COLLOCADA VERTICALMENTE @ 24" 0.61M LAS HOJAS DE TABLAROCA DEBERAN UNIRSE UNAS A OTRAS DE MANERA QUE NO QUEDEN FORZADAS EN LAS JUNTAS



Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA


CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	3
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 26/03/2020
CONTRATO:				HOJA: 3		AL: 07/04/2020
PARTIDA:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	FECHA: 07/04/2020	
M/A		DE: 3				

CLAVE

CONCEPTO

MURO DE TABLA ROCA DE DOS CARAS A BASE DE HOJA DE TABLAROCA DE 1/2" SUJETO A CAVALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL 25 COLOCADA VERTICALMENTE @ 24" 0.61M LAS HOJAS DE TABLAROCA DEBERAN UNIRSE UNAS A OTRAS DE MANERA QUE NO QUEDEN FORZADAS EN LAS JUNTAS

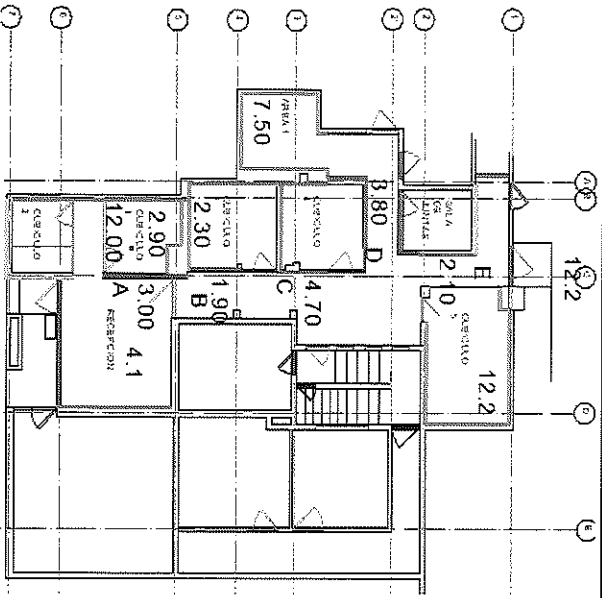

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	3
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	DE: 3
CLAVE	CONCEPTO				

PLAFON H VERD FALSO PLAFON A BASE DE CANAL LISTON Y CANALETA DE CARGA SOPORTADA DE LA ESTRUCTURA ESPACIADA @24"

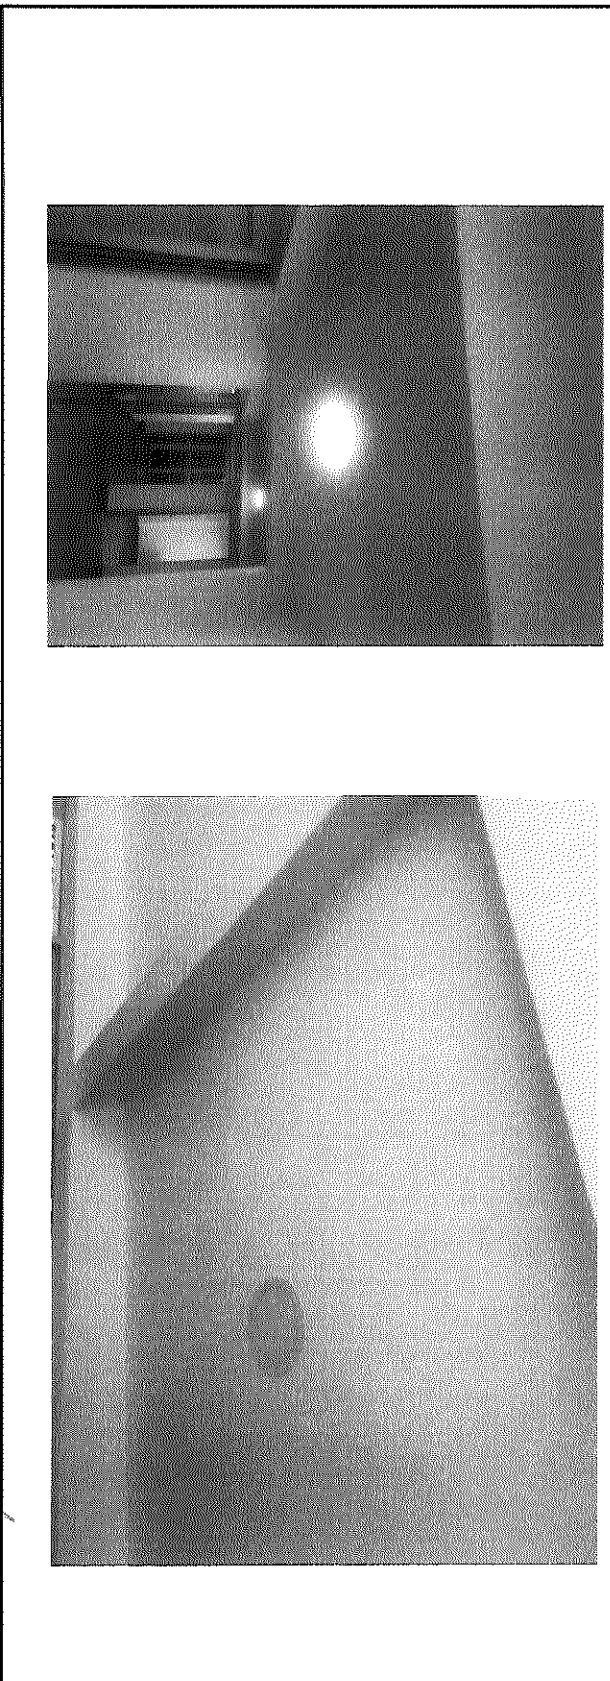

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
Arq. Carlos Olijas Salcedo
 Supervisor de Obra


[Signature]
Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	3
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 26/03/2020
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	HOUA: 3	AL: 07/04/2020
N/A		PARTIDA:			DE: 3	FECHA: 07/04/2020

CONCEPTO

PLAFON H VERD/ FALSO PLAFON A BASE DE CANAL LISTON Y CANALETA DE CARGA SOPORTADA DE LA ESTRUCTURA ESPACIADA @24"

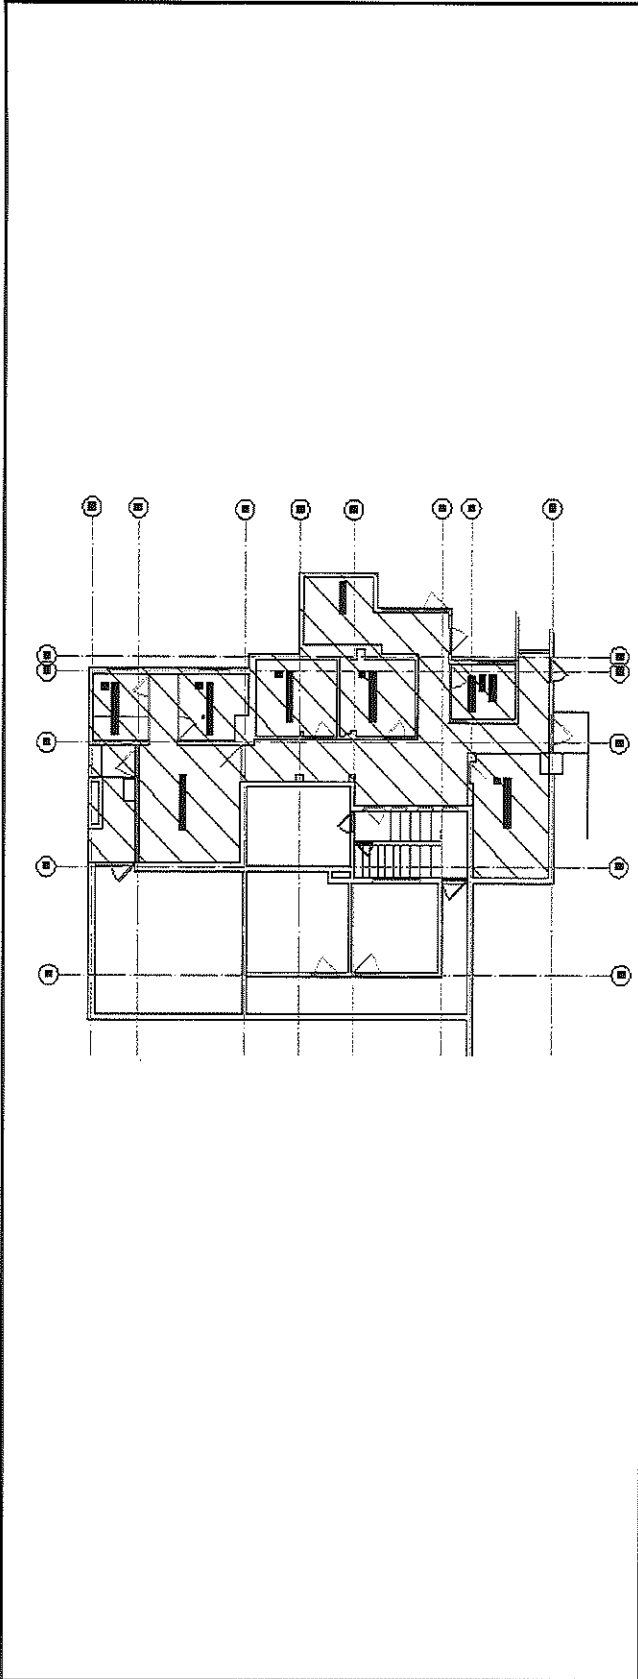

Elaboró

Autorizo

Va. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arg. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
Arg. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra


[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	3
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/03/2020
CONTRATO:						AL: 07/04/2020
PARTIDA:		CONSTRUCCION INTERIOR		ACABADOS		FECHA: 07/04/2020
N/A		SUBPARTIDA:		DE: 2		

CONCRETO

CAL 1	CAJILLOS DE TABLAROCA A BASE DE HOJA DE TABLAROCA DE 1/2" SUELO ACANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL 25
-------	--

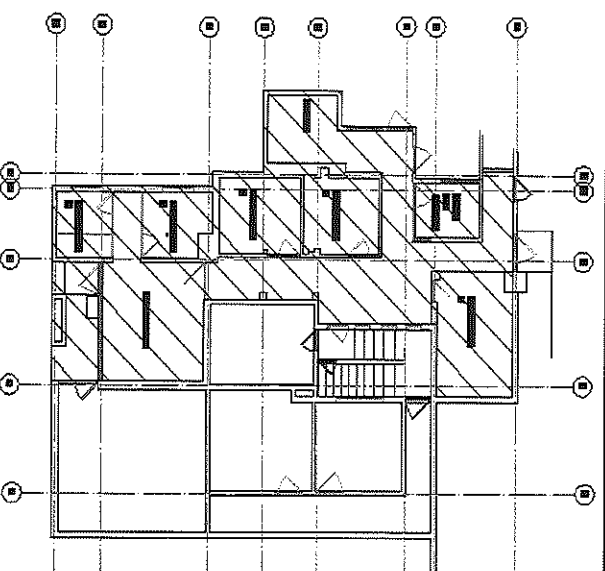

Elaboró

Autorizo

Va. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Olivares Salcedo
Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra


Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	3
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 26/03/2020
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	HOLAZ	AL: 07/04/2020
PARTIDA:				DE: 2	FECHA:	07/04/2020

CONCEPTO

ANT 1 ANTEPECHO DE TABLARCOCA EN PUERTA Y VENTANAS DE CANCELERIA

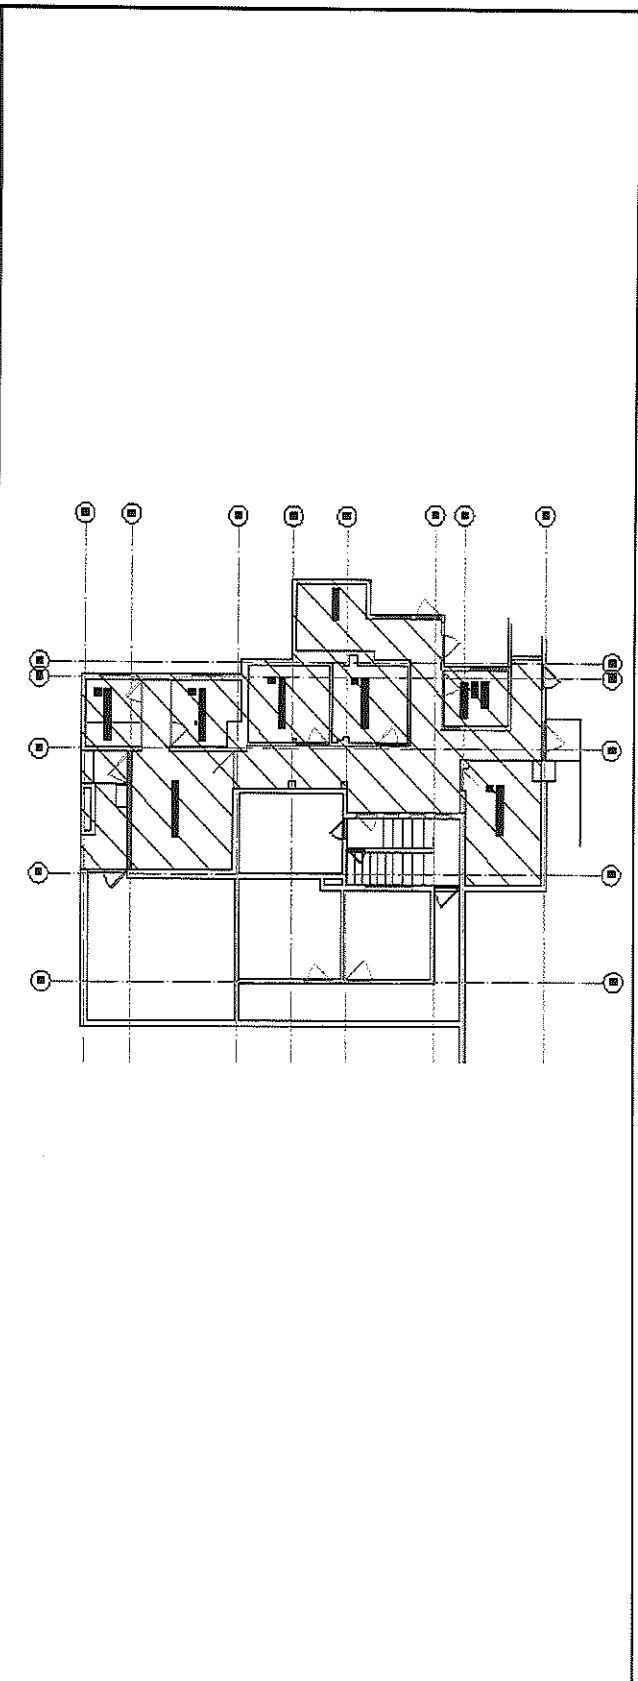

Elaboró

Autorizo

Vo. Bp.


Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

Ing. Jose Luis Rodriguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	3
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 26/03/2020
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	HOLA: 2	AL: 07/04/2020
CLAVE	CONCEPTO					
ASLANT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE R11 DE FIBRA DE VIDRIO					

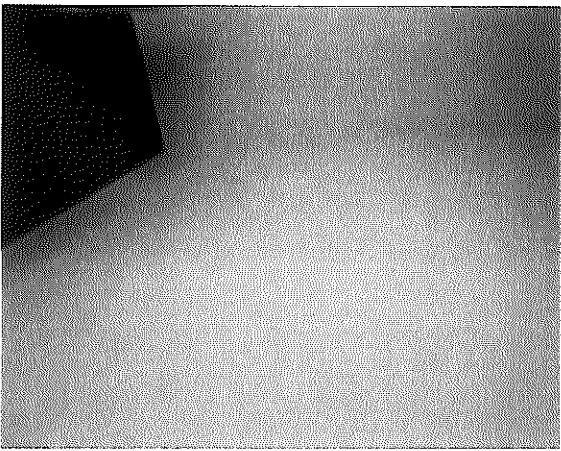

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas C.
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
 Arq. Carlos Ojinas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	3
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS ORIGINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/03/2020
CONTRATO:		PARTIDA:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS
N/A		N/A		DE: 3	FECHA:	07/04/2020
CLAVE	CONCRETO					

ASISLANT SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE R11 DE FIBRA DE VIDRIO

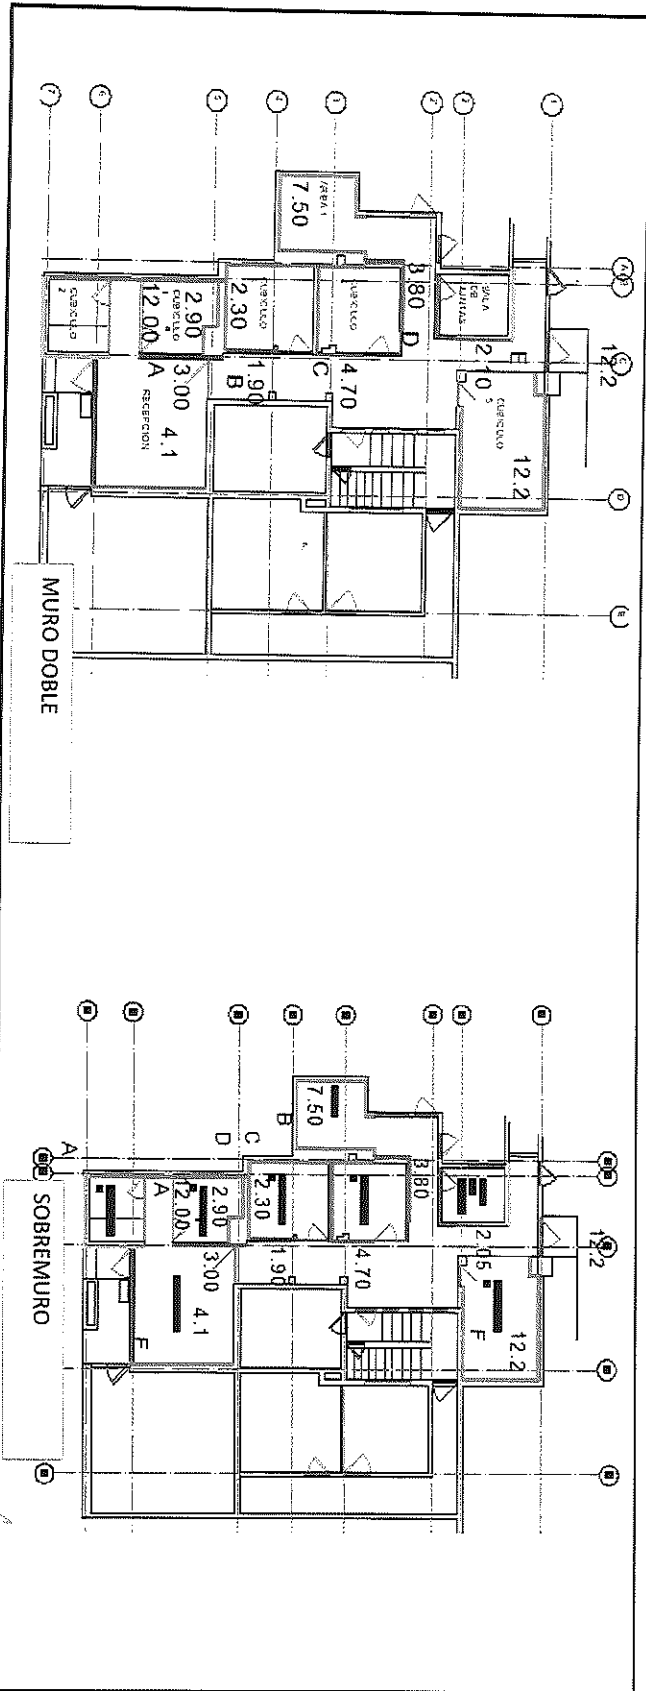

Elaboró

Autorizó

Va. Ba.


Carlos Vargas O.
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
 Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS ORIGINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	3
	CONTRATO:	ELECTRICIDAD	SUBPARTIDA:	CHIHUAHUA	DEL: 26/03/2020
	N/A				HOLA: 2 07/04/2020
					AL: 07/04/2020
					FECHA: 07/04/2020
CLAVE	CONCEPTO				

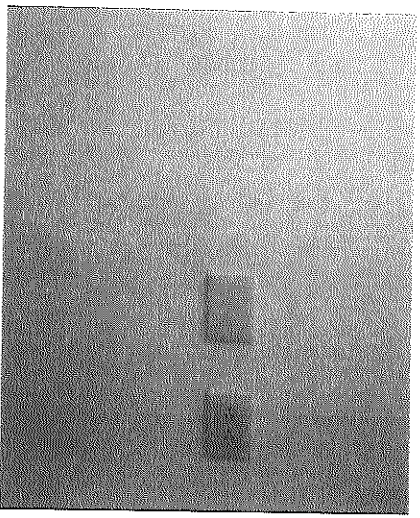SAL TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE	
----------	--	--

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivares Salgado
Arq. Carlos Olivares Salgado
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
CONTRATO:		PARTIDA:	ELECTRICIDAD	SUBPARTIDA:	DE:	3
N/A					HORA: 2	AL:
					FECHA:	07/04/2020
					DE: 2	

CLAVE	CONCEPTO
SAL. LUM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION

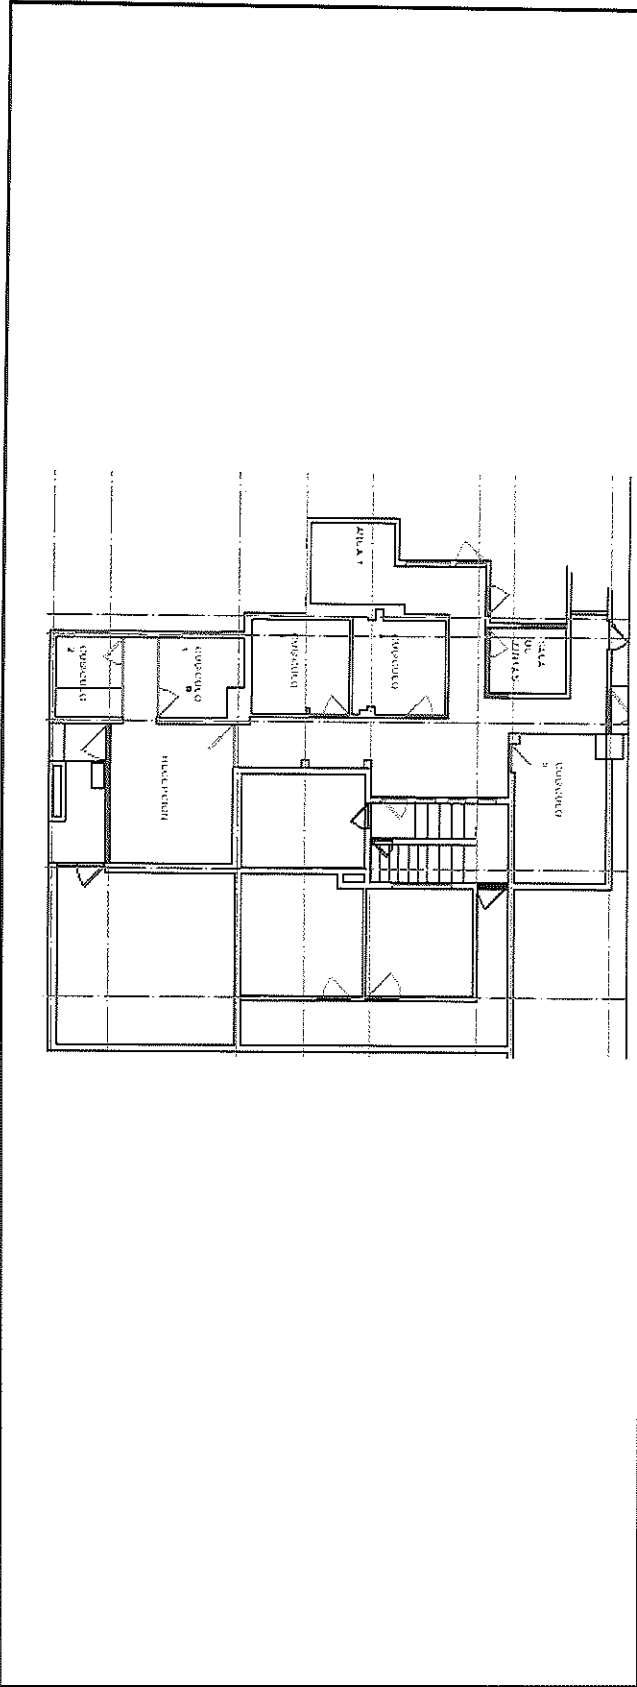

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.


Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega

[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo

[Signature]
Ing. José Luis Rodríguez Hernández

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	3
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 26/03/2020
CONTRATO:		ELECTRICIDAD		SUBPARTIDA:		HOLA: 3
N/A		PARTIDA:		DE: 3		AL: 07/04/2020
CONCEPTO						
TEMP 30						
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA						

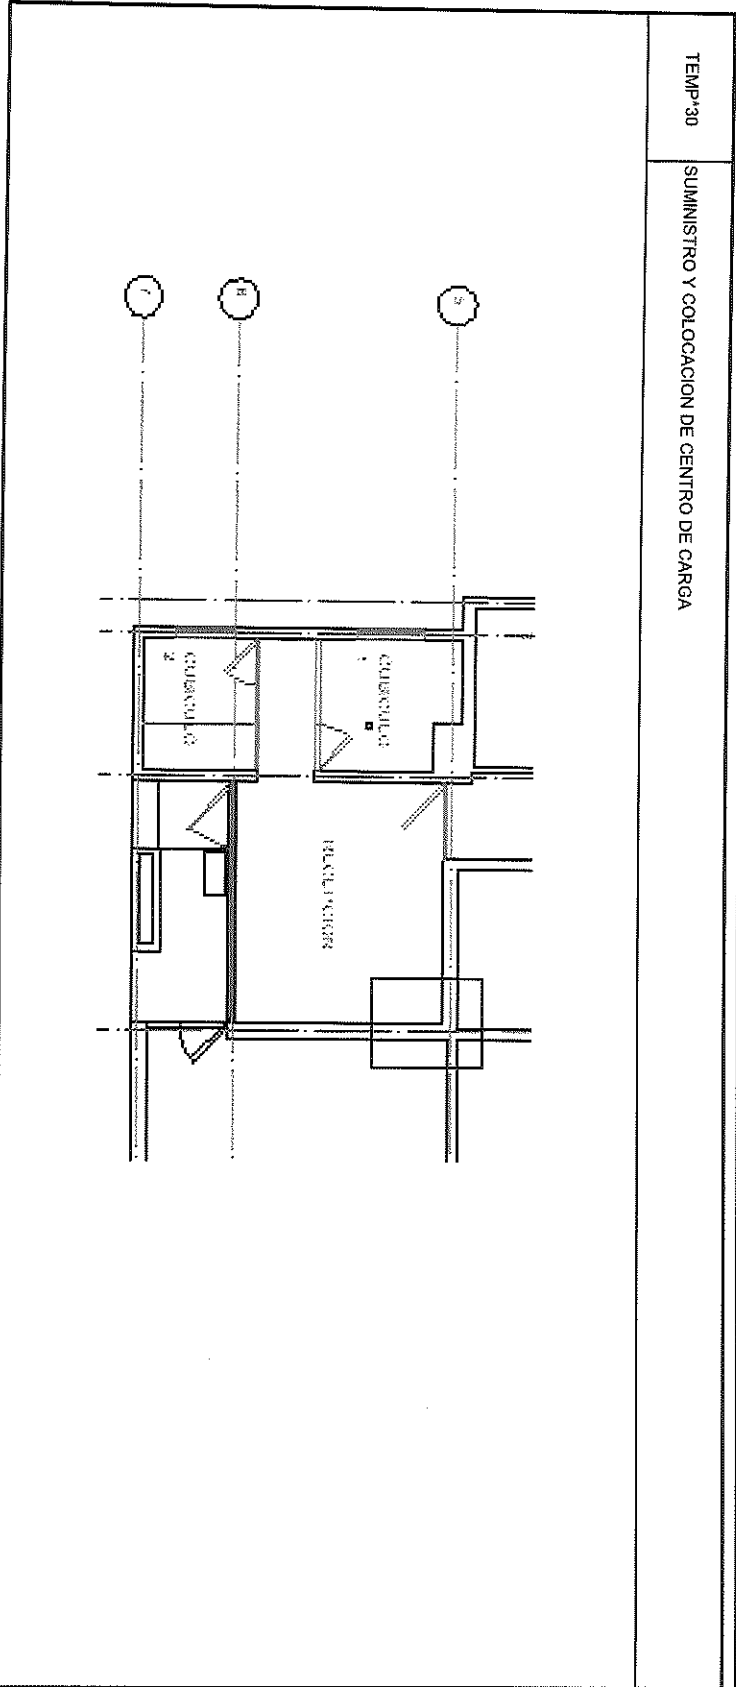

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.


Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega

Carlos Olivares Salcedo
Arq. Carlos Olivares Salcedo

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	3
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 26/03/2020
CONTRATO:	N/A	ELECTRICIDAD	SUBPARTIDA:		HOLA: 2	AL: 07/04/2020
CLAVE	CONCEPTO					
TEMP: 30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA					

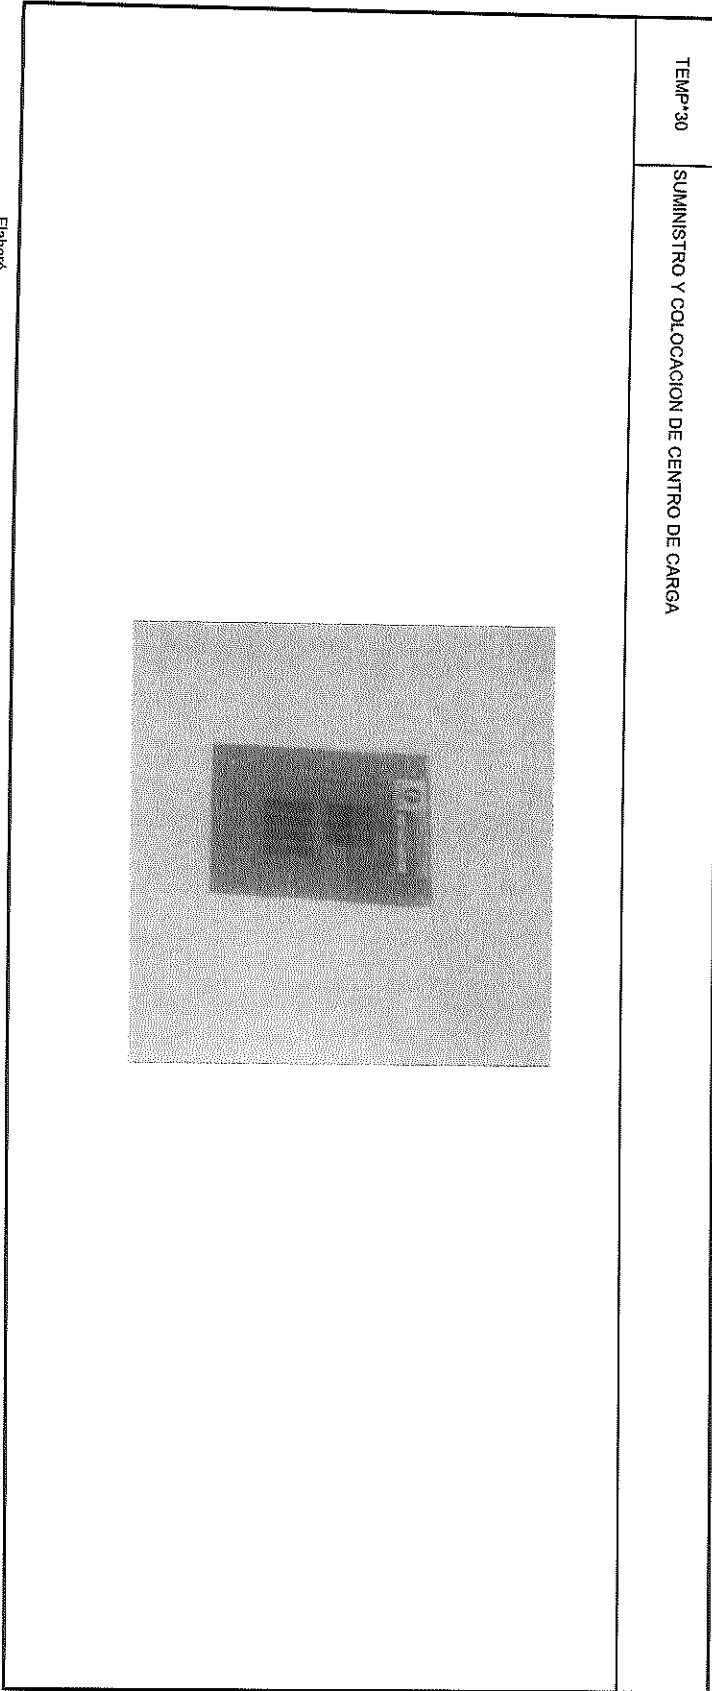

Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra



Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra




Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA



FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	3	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	26/03/2020
	CONTRATO:							A.L:	07/04/2020
		PARTIDA:		ELECTRICIDAD	SUBPARTIDA:			FECHA:	07/04/2020
CLAVE	CONCEPTO								

TEMP*30A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINISPLITS EN AREA DE AZOTEA
----------	--



Elaboró

Autorizo

Vo.Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arg. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivas Salcedo
Arg. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	3
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		ELECTRICIDAD	SUBPARTIDA:	DE: 2	DEL: 26/03/2020
N/A				AL: 07/04/2020	FECHA: 07/04/2020
CLAVE	CONCEPTO				

TEMP ^{30A}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINISPLITS EN AREA DE AZOTEA
---------------------	--

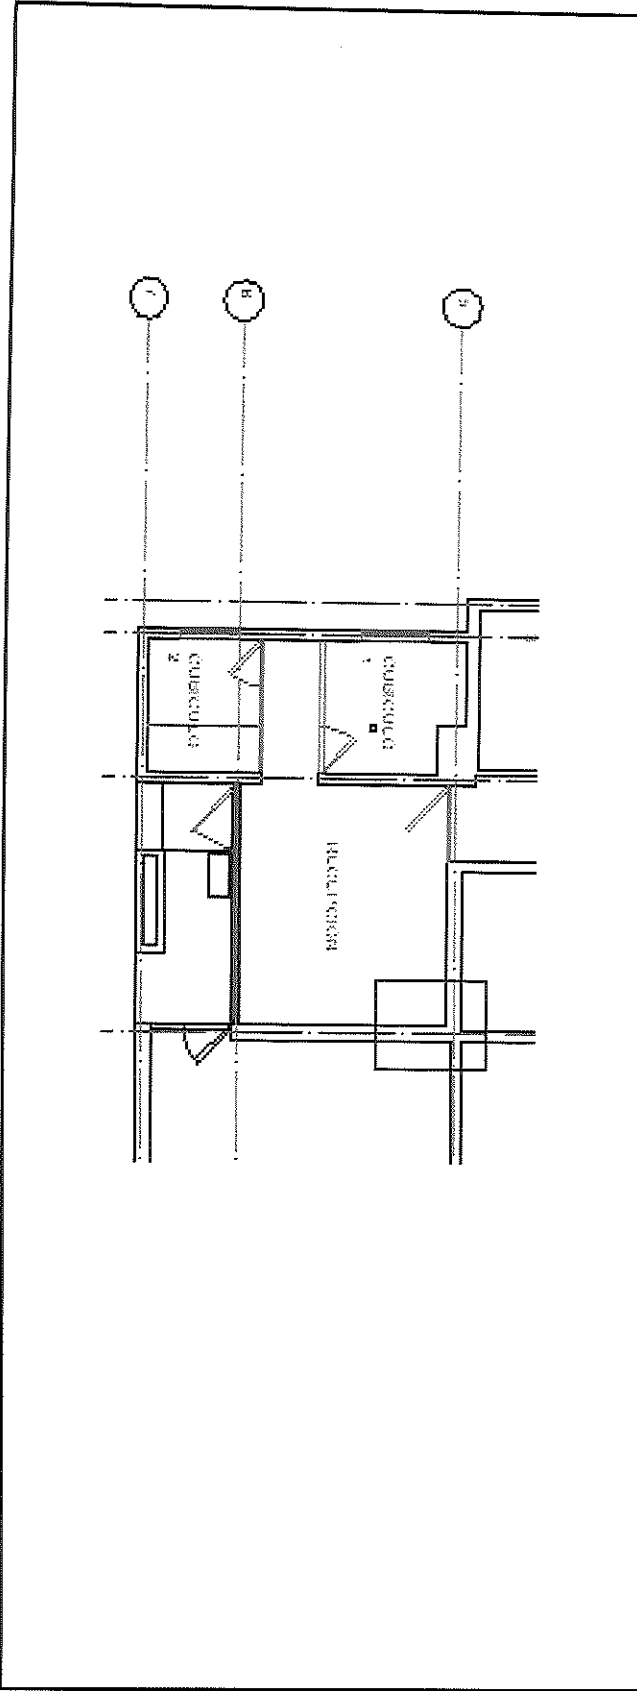

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Olvera
Atq. Carlos Vargas Olvera

Carlos Olivas Salcedo
Atq. Carlos Olivas Salcedo


Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	3	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	28/03/2020
						AL:	07/04/2020
CONTRATO:		VOZ Y DATOS	SUBPARTIDA:			DE:	2
N/A						FECHA:	07/04/2020

CLAVE	CONCEPTO
-------	----------

SAL VOZ DAT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELEFONIA
-------------	--

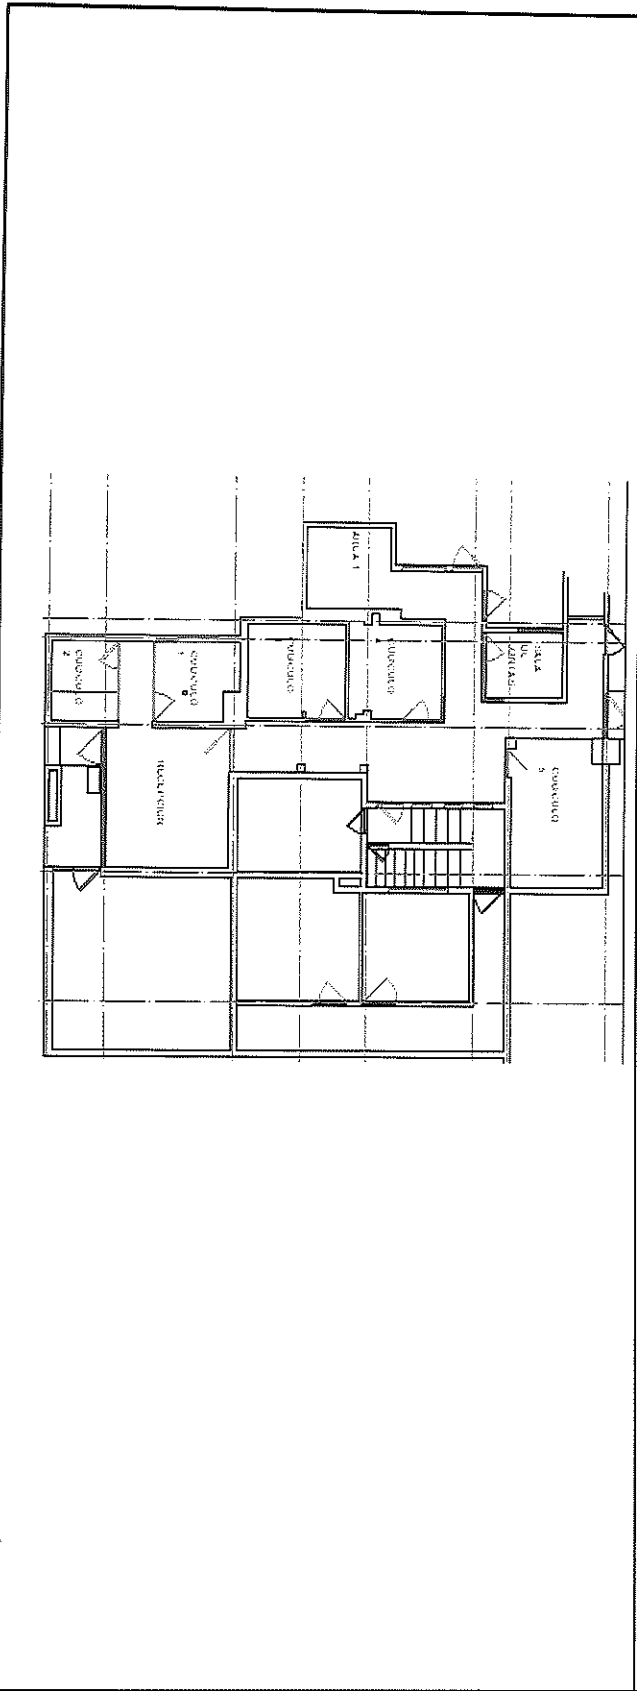

Elaboró

Autorizo

Va. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega

[Signature]
Arq. Carlos Olivares Salcedo


[Signature]
Ing. José LUIS Rodríguez Hernández

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, SOL. ZARCO		ESTIMACION:	3		
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	28/03/2020	
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR		VOZ Y DATOS	H.O.A.: 2		AL:	07/04/2020
PARTIDA:		SUBPARTIDA:		DE: 2		FECHA:	07/04/2020	

CONCEPTO

CLAVE	SAL TOM'A
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE

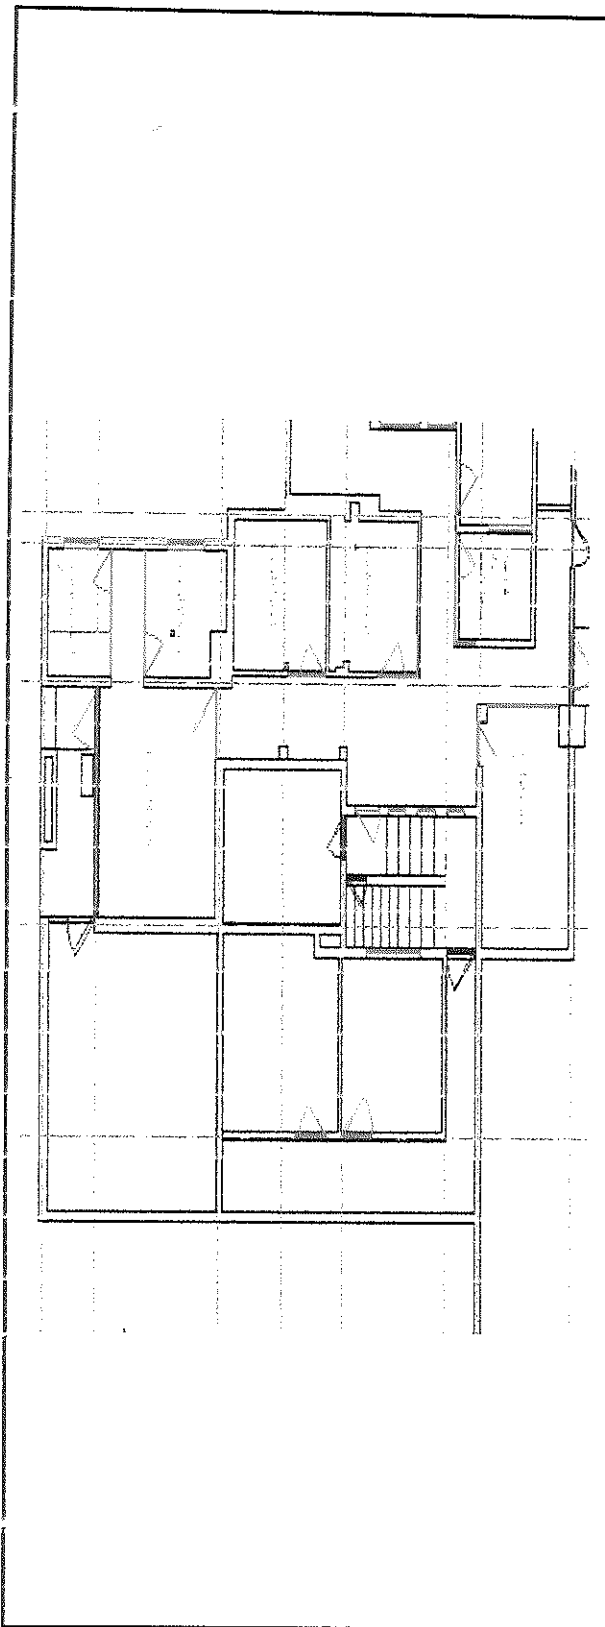

Elaboró

Autoriza

Va. Ba


Carlos Vargas
Atq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
Atq. Carlos Olivas Salcedo
 Supe Visor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Consult. Acciones Civiles S.A. de C.V. DIOCSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE ZARCO N° 2427, COL. ZAVALCO		ESTIMACION	3
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
CONTRATO:		CONSTRUCCION	SUBPARTIDA:	CCTV	FECHA:	28/03/2023
CLAVE	N/A	INTERIOR			HOLA: 2	07/04/2023
CONT EPTO						
TEMP 41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CCTV					

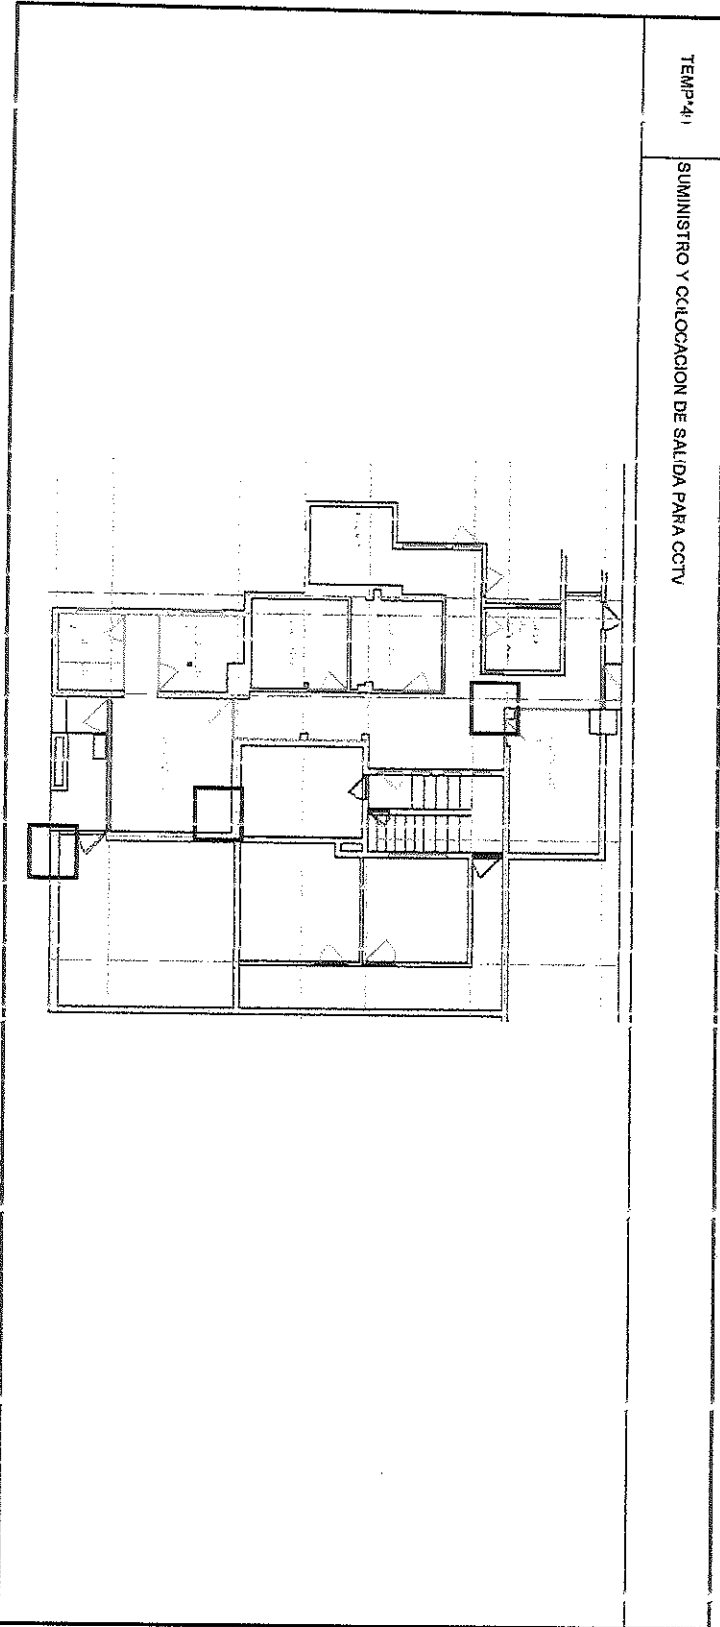

Elaboró

Autorizó

Vº. Lº.


Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
Arq. Carlos Ollas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. / DCSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION EXTERIOR	SUBPARTIDA:	ALBALILLERI AS	DEP: 3
CLAVE	CONCEPTO				
TEMP: 35	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE ALUCUBOND				

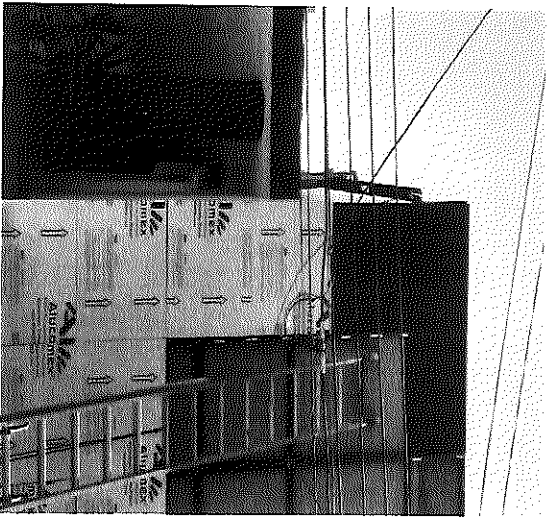

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivares Salcedo
Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodríguez Hernández
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	3
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 26/02/2020
CONTRATO:						AL: 11/03/2020
	N/A	PARTIDA:	CONSTRUCCION EXTERIOR	SUBPARTIDA:	ALBANIILERIAS	FECHA: 11/03/2020
						DE: 3
CLAVE	CONCEPTO					

TEMP'35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUCUBOND
---------	--------------------------------------

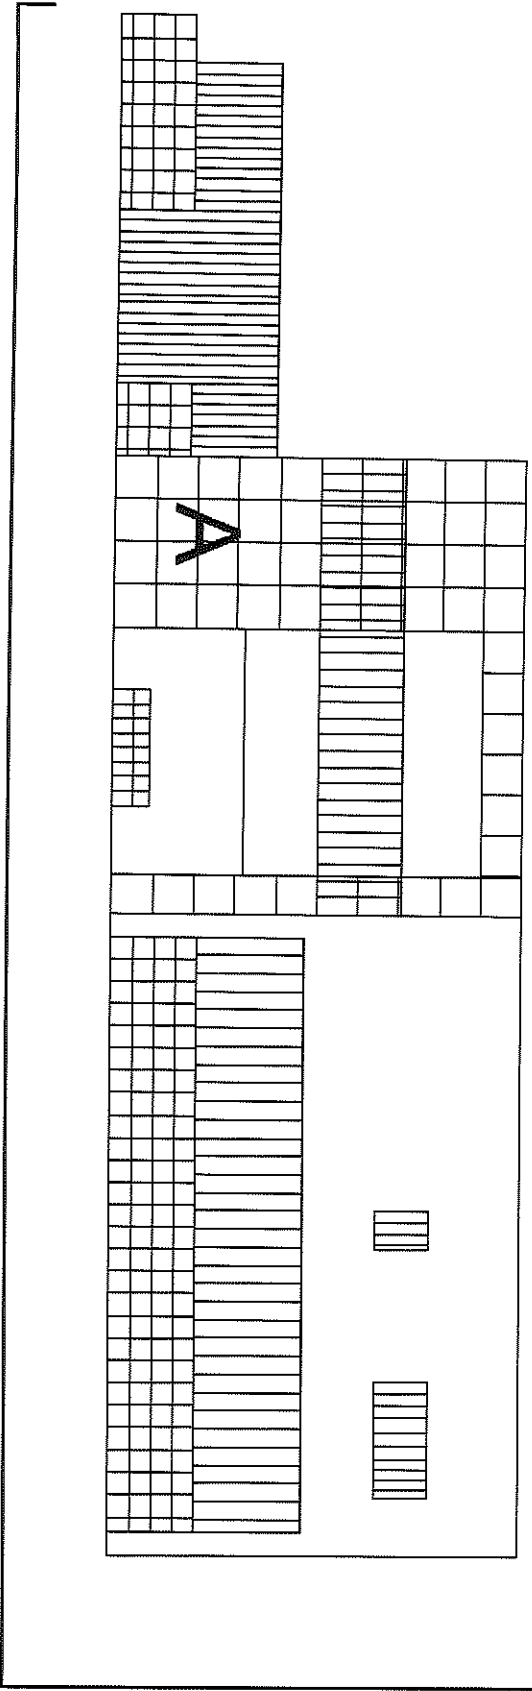

Elaboró

Autorizo

Va. Bo.

Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega

[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernández



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00486 Del 08/04/2020

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2020
Página | 07:01 p. m.
1

Concepto: F/2908 ESTIMACION 4 - Obra Pública : REM/OFNAS/PRINC - REMODELACION OFICINAS PRINCIPALES C.E.D.H. Co. GP
Folio: 54

Beneficiario: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110120-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por contra	\$256,542.48		GP Folio: 54
0002	8260-110120-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por contra		\$256,542.48	GP Folio: 54
0003	2113-000854	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVIL	\$256,542.48		GP Folio: 54
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$256,542.48	GP Folio: 54
Sumas iguales =>			<u>513,084.96</u>	<u>513,084.96</u>	

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I.RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07	PERLA I.RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR.ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BANREGIO - 059150600168600110	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 256,542.48
	Fecha valor	08/04/2020
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	080420
	Concepto del pago	EST 4 REMODELACION FACHADA CEDH
	Número de Autorización	252791
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

RFC: DCC060124KS2

Tipo de Comprobante: Ingreso
Lugar de Expedición: 3112
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parceladas o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Fecha de Emisión: 2806
Hora: 8/4/2020 09:54:27


Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MPS
Domicilio: Av. Zarco No. 2427, Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: 101 - Construcciones

Clave de Producto	Cantidad	Clave de Servicio	Descripción	Importe	Clave de Impuesto	Importe
73102900	1.00	648	Servicio - PAGO DE ESTIMACION No. 4 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION EN COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	221,157.31	002 - IVA - 35.385 17	221,157.31

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 42/100

Subtotal	221,157.31
Impuestos Trascendentes	35,385.17
Total	256,542.48

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001000000408408629
 SP9AFEF2-0D37-46F5-857D-558393067FE7
 00001000000404486674
 Abril 8 2020 - 10:54:29

clwdTWQeK3B89GuR7H3YSROG3pWAI0dYPHISCB1eLRr46jdvnThaDUJeg7kwm8BRAOy7X2BQMDqgVvCOsd0
 6D9-kuxPSe7CYvVcb3Mv5J8VEW2S4OQXE8kh2EPTaTMol+ehoPNCVvOyFeVAKaR8d7SNGFRYyibk3Sc
 W6CychgzsQdyhDHJG9boKHrHv77d0LM5KnFHC9JQIMIP+M1STChm0Cj7QpTjg3r81gM
 NSAWSoe9ShGtveR2pC5dHpu4LmDlS9zZlXA7sNhA2zTFJkz4XPezOXG6QzZDdcaN9Rv8BzuhFAWbrXYLjQ==

qRbyvR/d0IRNcoIPR25bG2qY11vchMxg3h+VVDG54RUdSeLz+ARGGKmEUCEfInDM4gu4nHrBHSZ
 n4gD1J0qW4DT0P7CW0IAWdd0M47k8=blunqEEqf/d308CLUqHAvJGj4WJF-HTK3dwObancJLIPRF11
 Y1uxpUAdfdeSc7vSTK4qjT/mN6uISLlgoq1V6wLoyelACSGvTXgEaYCDmLWv82N2hyP89pYEdveh
 dkBes+Ztb35m196z7JohSR7IUCOS2K4HvICww1wDm76rWjgMv9Rh/2BBoInRUA5YvChJ51ItIU
 lvNcuNF42uZ0H/L3EKUP2w==

[[1.1|SP9AFEF2-0D37-46F5-857D-558393067FE7|2020-04-08T10:54:29|MAS0510247C0|clwd
 TWQeK3B89GuR7H3YSROG3pWAI0dYPHISCB1eLRr46jdvnThaDUJeg7kwm8BRAOy7X2BQMDqgVvCOsd0
 6D9-kuxPSe7CYvVcb3Mv5J8VEW2S4OQXE8kh2EPTaTMol+ehoPNCVvOyFeVAKaR8d7SNGFRYyibk3Sc
 W6CychgzsQdyhDHJG9boKHrHv77d0LM5KnFHC9JQIMIP+M1STChm0Cj7QpTjg3r81gM
 NSAWSoe9ShGtveR2pC5dHpu4LmDlS9zZlXA7sNhA2zTFJkz4XPezOXG6QzZDdcaN9Rv8BzuhFAWbrXYLjQ==|00001000000404486674]]

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTROL DE ESTIMACIONES**

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.

REMODELACION OFICINAS

OBRA: REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERIA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS

UBICACION: AVE. ZARCO N. 2427, COL. ZARCO

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.

Nº DE CONTRATO: \$ S/N 1,638,367.83

IMPORTE DEL CONTRATO:

ESTIMACION No. 4


PERIODO: Del 08 al 27 de Abril del Año 2020


FECHA: UNO sábado, 25 de abril de 2020


CONCEPTO	CONTRATADO	GLOBAL A LA FECHA	ESTA ESTIMACION	PAGO ACUMULADO	FOR EJERCER
OBRA NOMINAL:	\$ 1,638,367.83	\$ 650,406.40	\$ 221,157.31	\$ 871,563.71	\$ 766,804.10
MATERIALES	\$	\$	\$	\$	\$
CONTRATO FINAL	\$	\$	\$	\$	\$
OBRA EXCEDENTE:	\$	\$	\$	\$	\$
OBRA EXTRAORDINARIA:	\$	\$	\$	\$	\$
ESCALATORIA:	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL:	\$ 1,638,367.83	\$ 650,406.40	\$ 221,157.31	\$ 871,563.71	\$ 766,804.10

ESTADO DE AVANCE		DATOS DEL ANTICIPO		RETENCIONES	
AVANCE PROGRAMADO:	53%	ANTICIPO OTORGADO	\$ -	IMPORTE RETENIDO ANTERIOR:	\$
AVANCE REAL:	13%	% DE I. V. A. - ANTICIPO OTORGADO	\$ 0.00	ESTA RETENCION:	\$
ESTADO DE CUENTA		AMORTIZACION ACUMULADO ANTERIOR:	\$ 0.00	RETENCION ACUMULADA:	\$
IMPORTE PAGADO ANTERIOR:	\$ 650,406.40	ESTA AMORTIZACION:	\$ 0.00	IMPORTE RETENIDO ANTERIOR:	\$
IMPORTE ESTIMADO:	\$ 221,157.31	AMORTIZACION ACUMULADO:	\$ 0.00	ESTA RETENCION:	\$
IMPORTE ACUMULADO:	\$ 871,563.71	POR AMORTIZAR (SALDO):	\$ 0.00	RETENCION ACUMULADA:	\$
IMPORTE POR PAGAR:	\$ 766,804.10				\$

RESUMEN	
IMPORTE ESTA ESTIMACION:	\$ 221,157.31
IVA:	\$ 35,385.17
TOTAL A PAGAR:	\$ 256,542.48

ELABORÓ:  **ARQ. CARLOS VARGAS ORTIGA**
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:  **ARQ. GERARDO OLIVARES SALCEDO**
SUPERVISOR DE OBRA


AUTORIZÓ:  **ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ**
Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DISCA

OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	600	32855	198110	6.00	6.00	100%	0%	100%	\$	1981,10	\$	-	\$	1981,10	\$	-
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	1530	49350	298824	16.90	16.90	100%	0%	100%	\$	7848,24	\$	-	\$	7848,24	\$	-
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	630	44160	308878	6.99	6.99	100%	0%	100%	\$	3088,78	\$	-	\$	3088,78	\$	-
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	4639	30405	1439887	46.59	46.59	100%	0%	100%	\$	14258,87	\$	-	\$	14258,87	\$	-
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	LOTE	1,00	246396	244416	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	2,446,36	\$	-	\$	2,446,36	\$	-
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	PZA	1,00	183500	183200	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	1,835,00	\$	-	\$	1,835,00	\$	-
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	27,30	17878	488069	27,30	27,30	100%	0%	100%	\$	4,880,69	\$	-	\$	4,880,69	\$	-
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	27,30	73732	2012064	27,30	27,30	100%	0%	100%	\$	20,120,64	\$	-	\$	20,120,64	\$	-
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	64,62	160832	1037181	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	103,718,01
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	PZ	1,00	596000	658000	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,560,00
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	PZ	1,00	650000	650000	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,480,00
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	0,60	70927	521248	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	650,00
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	32,00	8332	783924	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,212,48
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	LOTE	1,00	5183300	18183300	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	151,833,00	\$	-	\$	151,833,00	\$	-
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	136,10	4323	562813	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,628,13
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	VALE	6,90	183218	1112268	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	11,122,68
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	47,30	1630	713176	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	713,176
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	LOTE	1,90	487218	487218	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,872,18
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	PZ	1,00	97466	97466	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	974,56
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	LOTE	1,60	1297113	1297113	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12,977,13
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	1723	16366	286589	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,865,89
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	PZ	2,90	87168	184912	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,849,12
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	PZ	2,60	64970	159340	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,299,40
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	PZ	1,90	243839	243839	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,438,39
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	6030	30766	308860	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,078,50
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	12300	38800	466600	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,666,00
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	15390	107812	1714211	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17,142,11
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	7390	31464	231130	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,381,30
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	2840	28435	802270	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,022,70
OPERA DE ACABADO DE CONCRETO DE 20x20x20 cm con arena de 200µm	M2	2030	27007	886403	0,00	0%	0%	0%	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,864,03

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	4
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 08/04/2020
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	HORA: 2	AL: 27/04/2020
CLAVE	CONCEPTO					

CERAN OFICINAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA

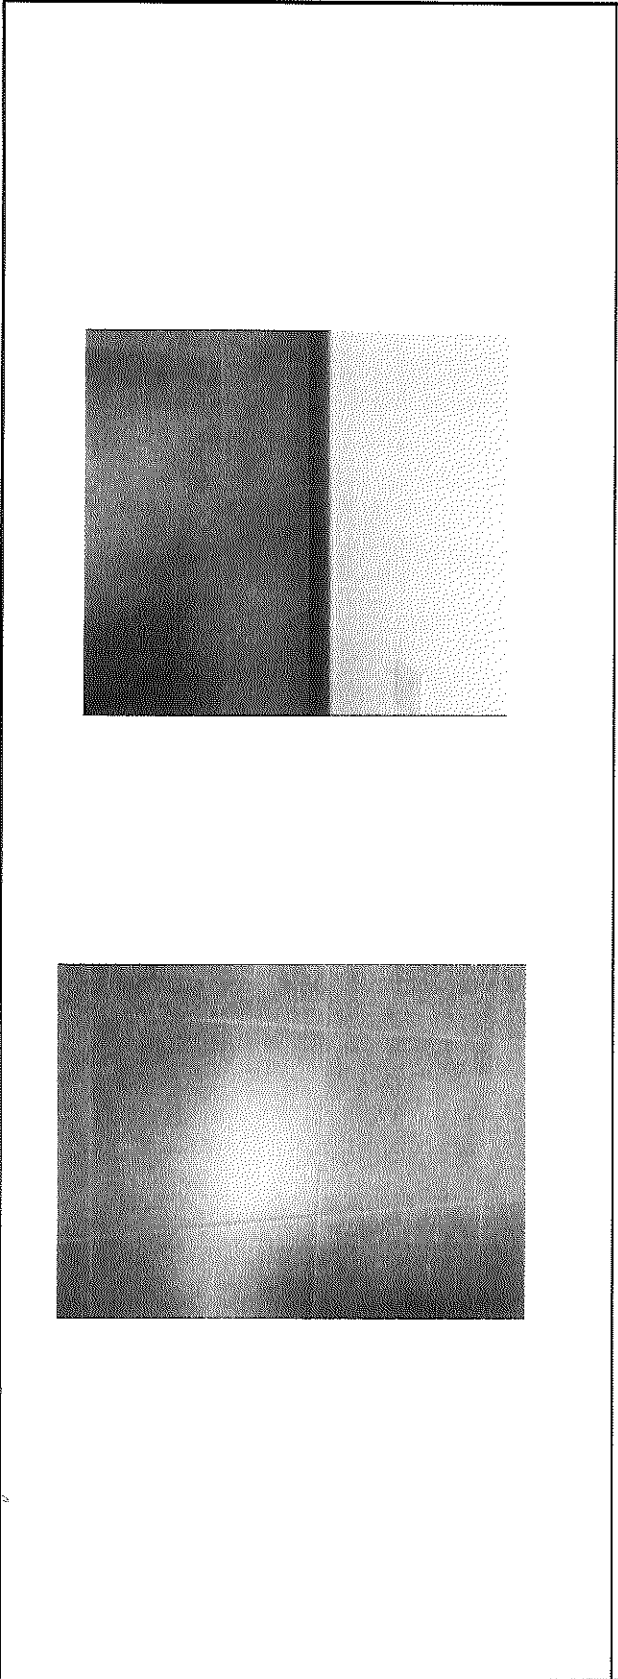

Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Salgado
Arq. Carlos Olivas Salgado
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	DE: 3
					FECHA:
					27/04/2020
CLAVE	CONCRETO				

CERAN OFICINAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA

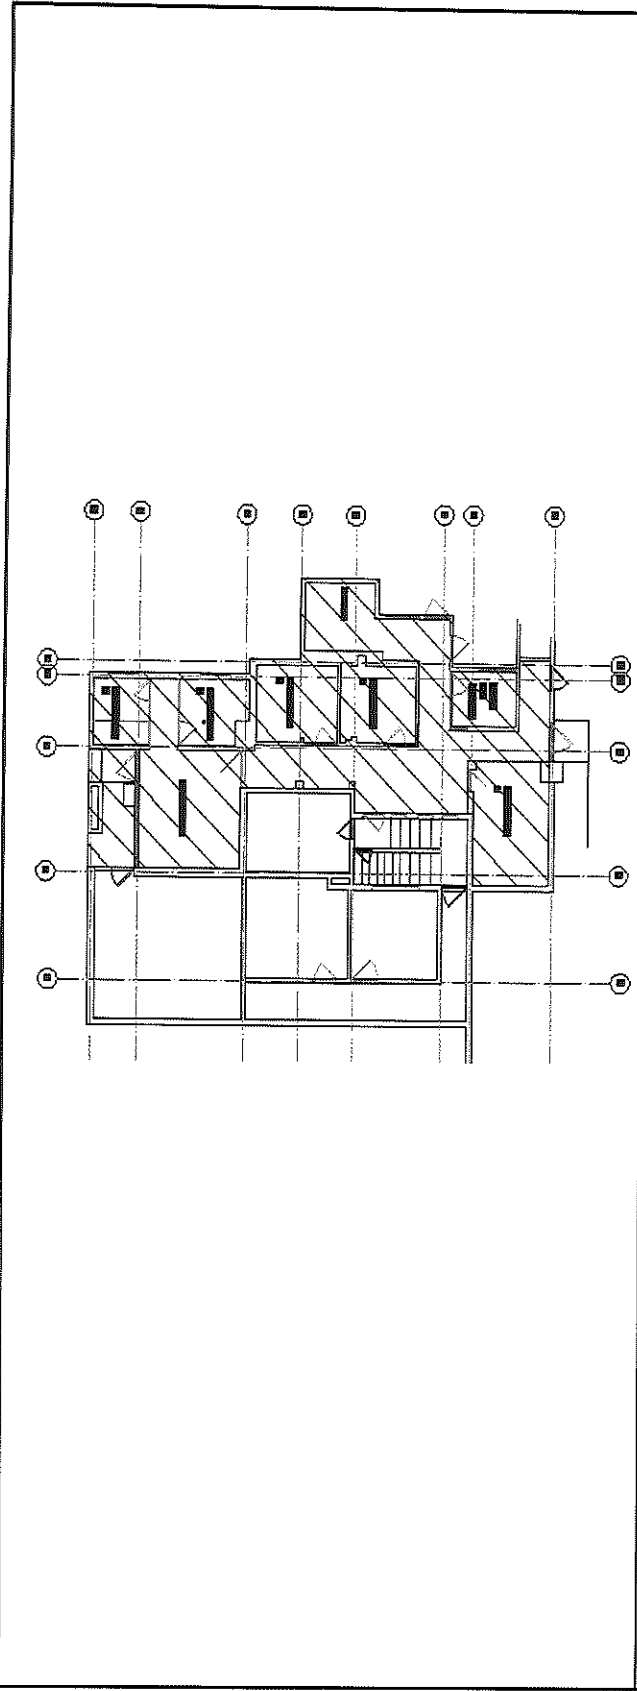

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.


Carlos Vargas Ojeda
 Arq. Carlos Vargas Ojeda
 Residente de Obra


Carlos Olivares Salcedo
 Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra

Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA


FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	PARTIDA:		ACABADOS	
		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:		HOLA: 2 DE: 3
CLAVE	CONCRETO				

ZOCLO 10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE CERAMICA DE 10 CM
Elaboró	Autorizó
	
Vó, Bq/	


Arq. Carlos Vargas Orta
 Residente de Obra



Arq. Carlos Olivas Salgado
 Supervisor de Obra


Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 08/04/2020
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR		SUBPARTIDA:		AL: 27/04/2020
PARTIDA:		ACABADOS		DE: 3		FECHA: 27/04/2020
CONCRETO						

ZOCLO 10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE CERAMICA DE 10 CM
----------	--

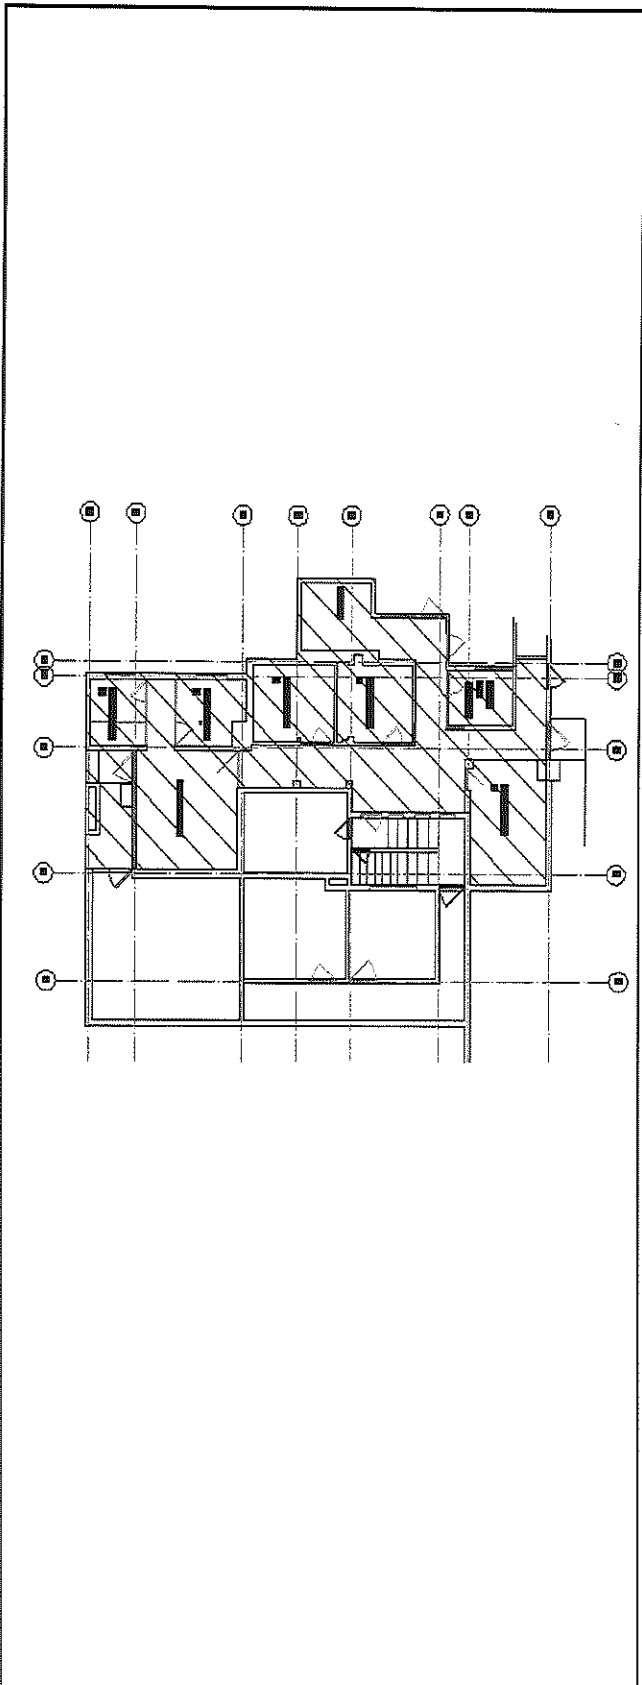

Elaboró

Autorizó

Va. Bq.


Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Olivares Salcedo
Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernández
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA


FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 08/04/2020
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ESCALERAS	HOLA: 2	AL: 27/04/2020
CLAVE	CONCEPTO					
1.36	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA					

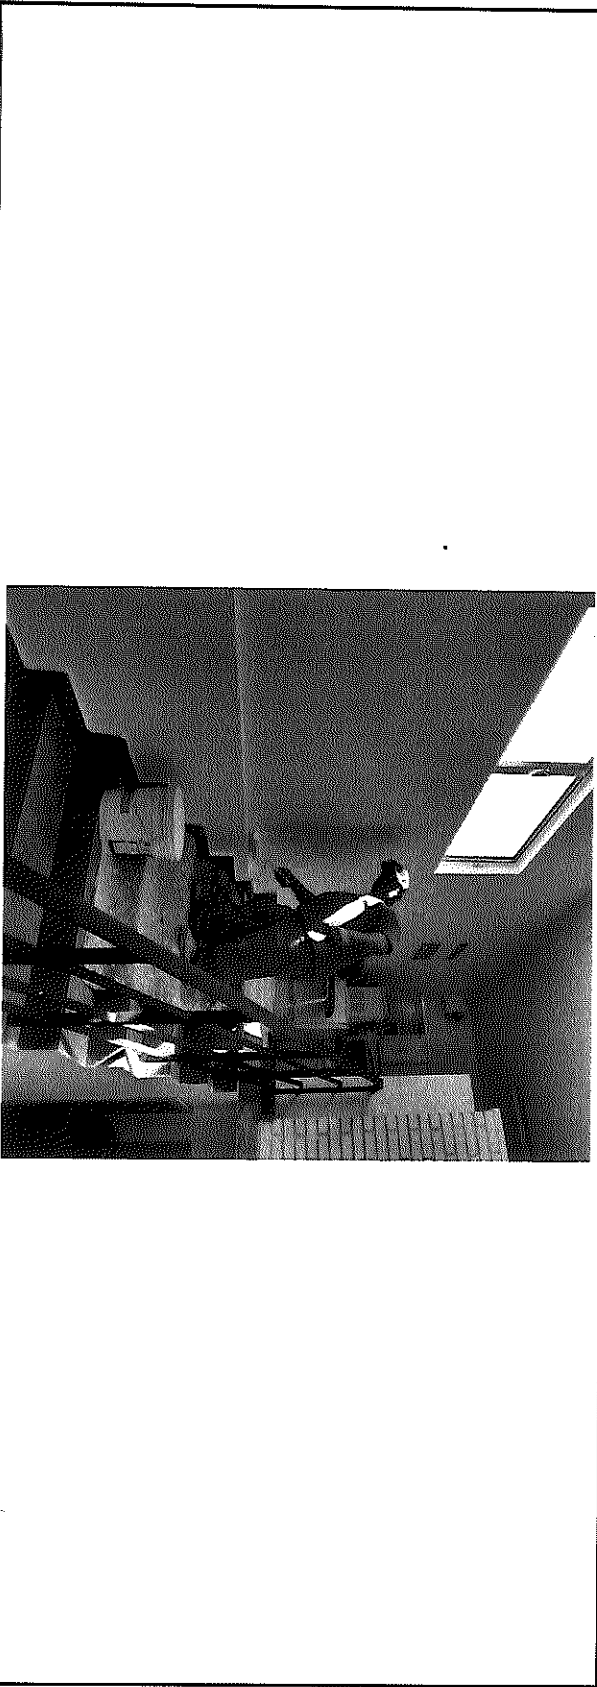


Arq. Carlos Vargas Ortiga
 Residente de Obra



Arq. Carlos Oivas Salcedo
 Supervisor de Obra


Ing. Jose Luis Rodriguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DE: 08/04/2020
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR		SUBPARTIDA:		AL: 27/04/2020
PARTIDA:		ACABADOS		DE: 3		FECHA: 27/04/2020
CONCEPTO						

CLAVE	CONCEPTO
1,36	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA

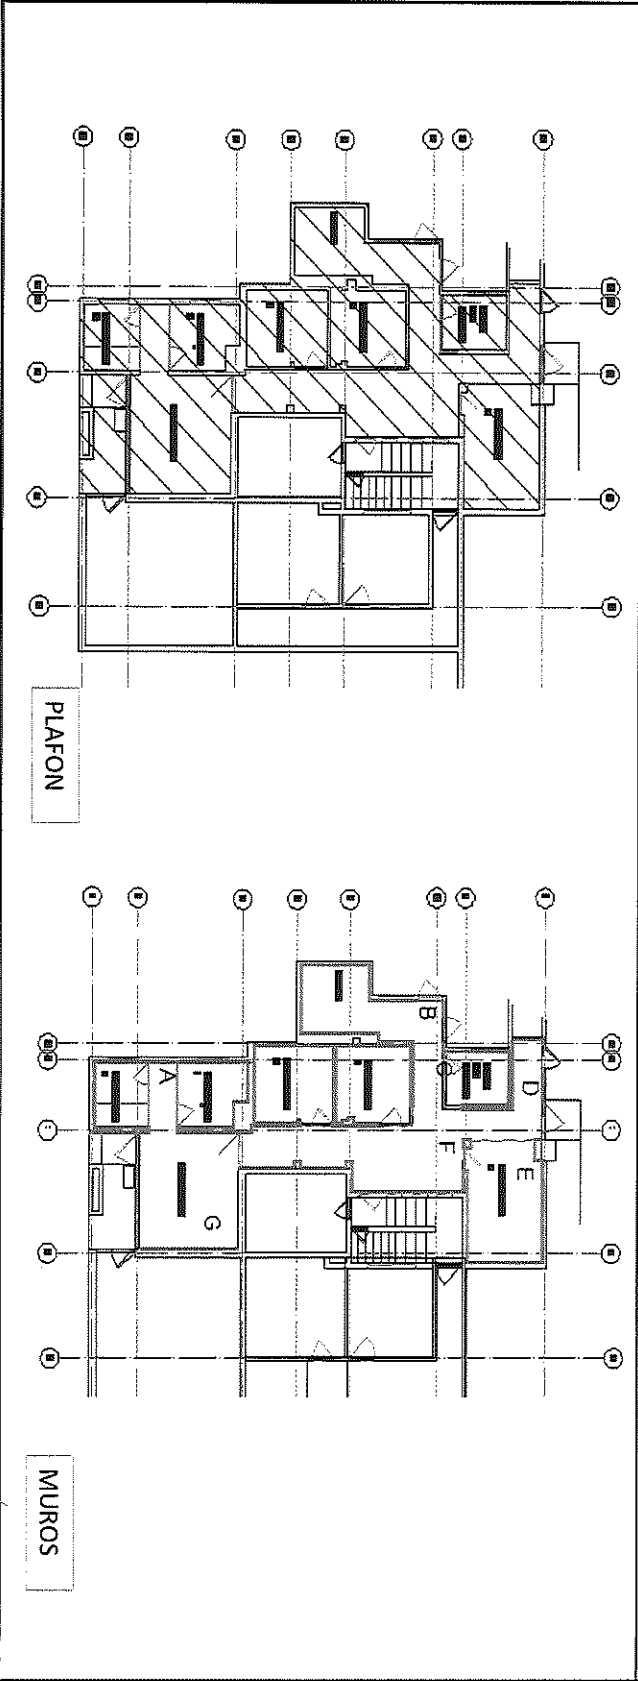

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodríguez Hernández
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 08/04/2020
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR		TRABAJO EN BAÑO	HOLAS: 2	AL: 27/04/2020
PARTIDA:		SUBPARTIDA:		DE: 2	FECHA:	27/04/2020
CONCEPTO						

CLAVE						
DESM1	DESMONTAR JUEGO DE SANITARIOS					

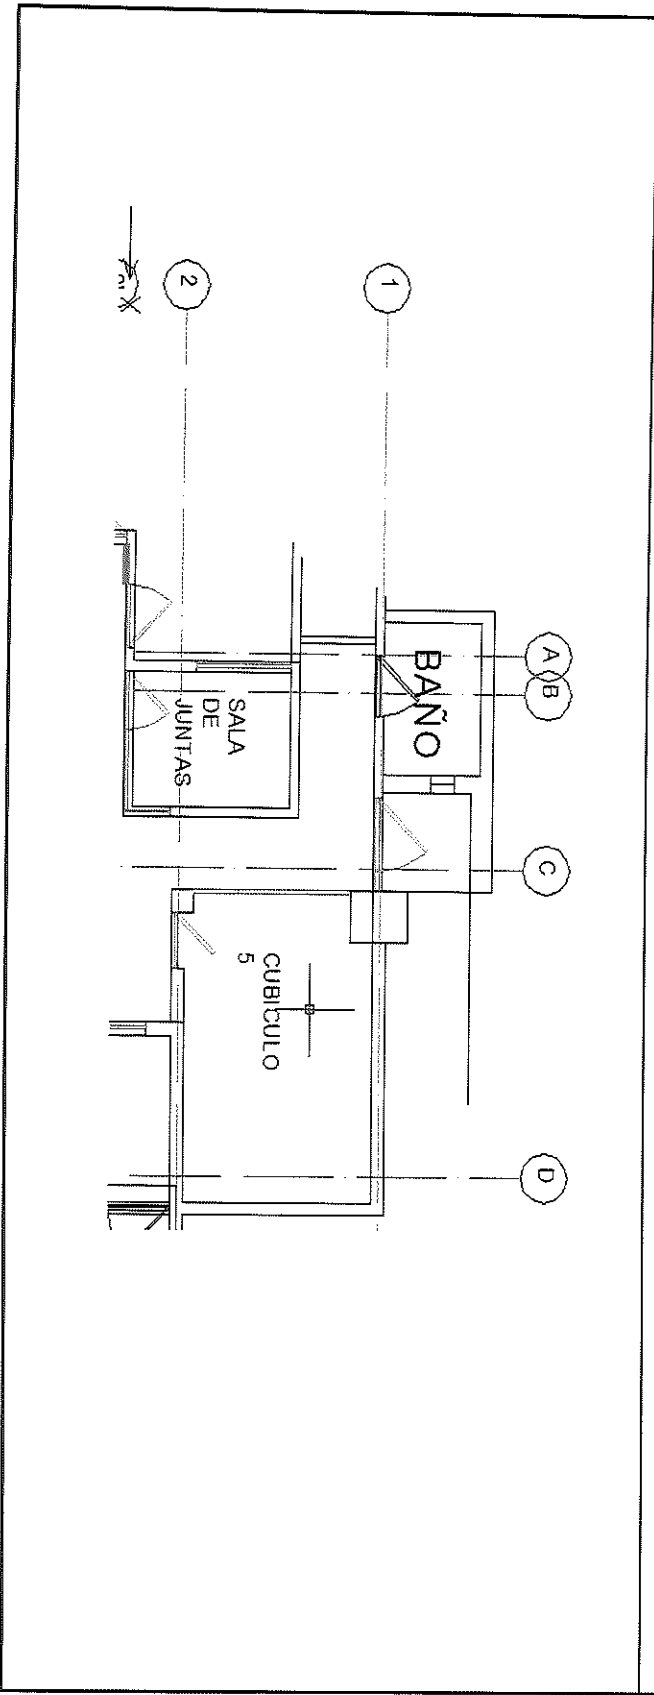

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.


Carlos Vargas
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
 Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA


FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	TRABAJOS EN BANO	HOJA: 2 DE: 3
CONCEPTO					
CLAVE	INSTALACION DE SANITARIOS				

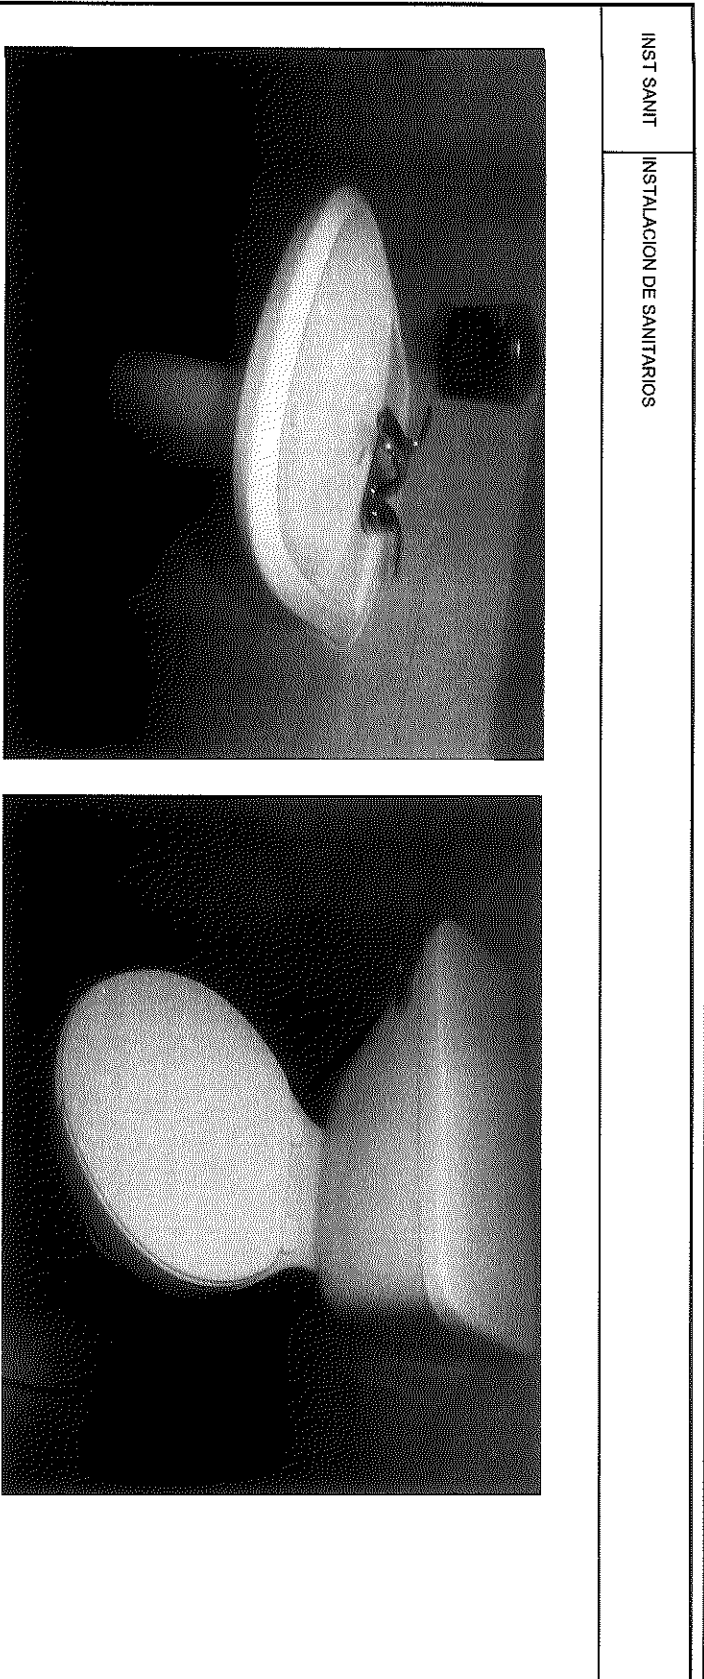

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION:	4	
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 08/ 4/2020	
CONTRATO:	M/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	TRAZAJOS EN PLANO	HOLA: 3	AL: 27/ 4/2020	
CLAVE	CONCEPTO					FECHA:	27/ 4/2020

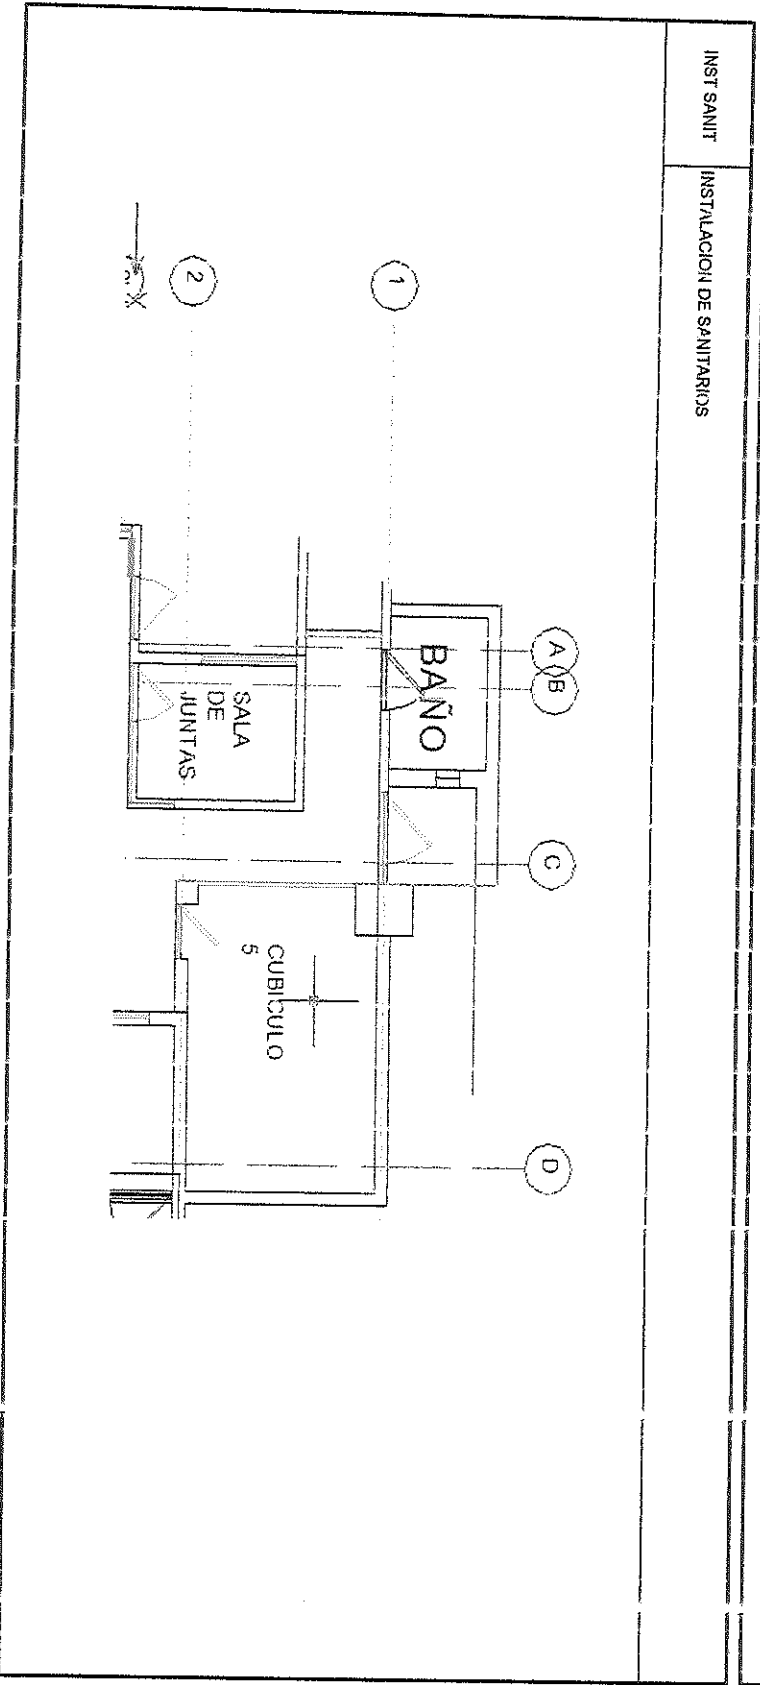

Elaboró

Autorizo

Va. Bo


Carlos Legado
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
 Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. D.I.C. S.A.

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BOREGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	TRABAJOS EN BAÑO	DE: 3
	N/A	PARTIDA:			FECHA:
CLAVE	CONCEPTO				
SUM SANIT	SUMINISTRO DE SANITARIOS				

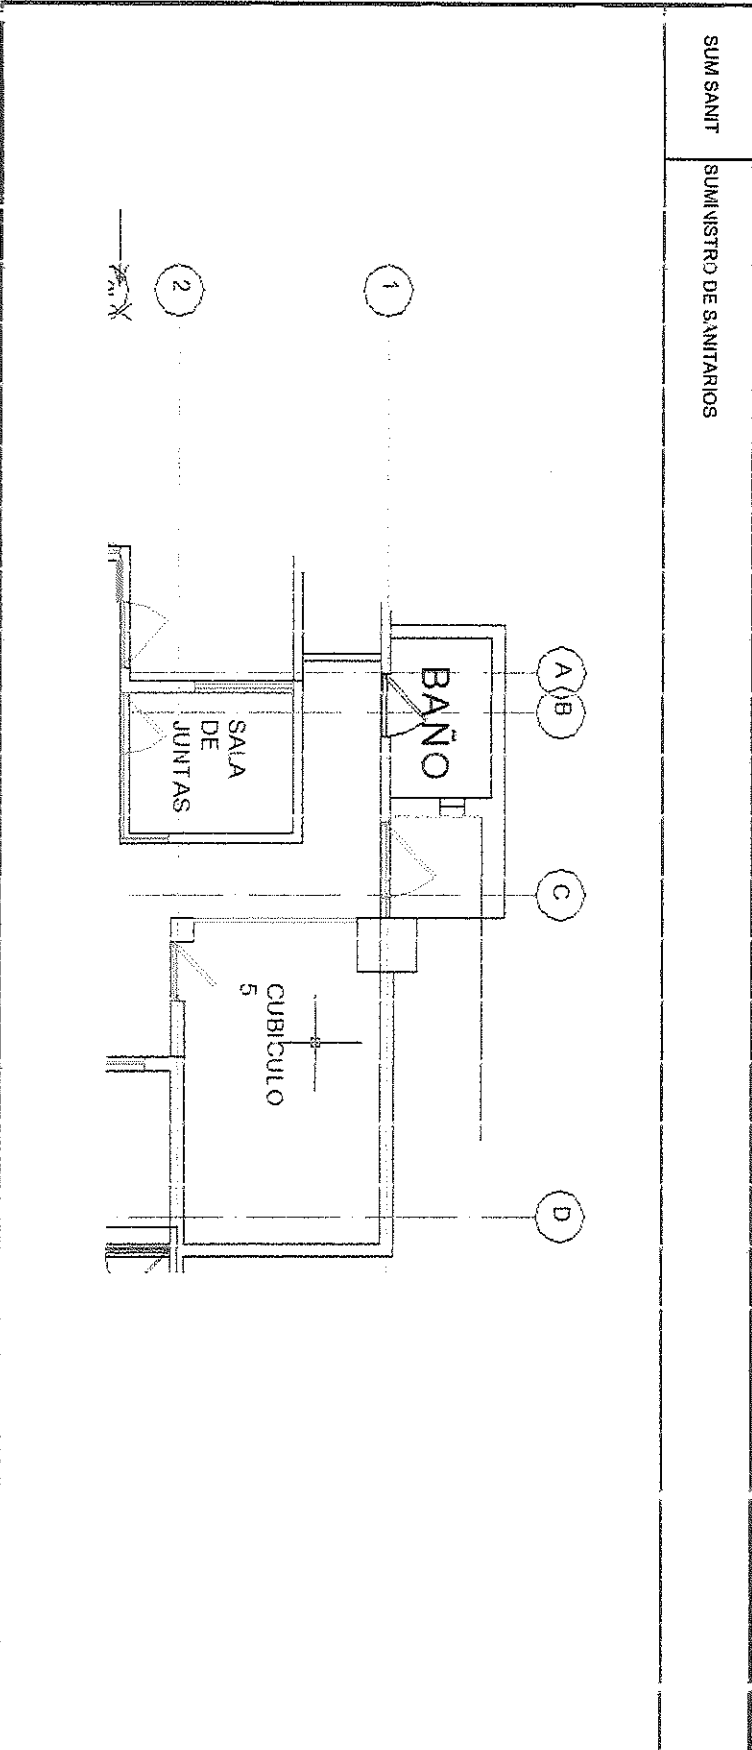

Elaboró

Auto/izo

Vc. Bo.

Carlos Vargas O.
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis R. Arriaga Hernández
 Diseños y Construcción: Civiles S.A de C.V. DICS A

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.		DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	4
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGAS DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS		ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
CONTRATO:	N/A	PARTIDA:	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	TRABAJOS EN BANO	HOJA: 2	DEL: 08/04/2020
CLAVE			COUCERTO			AL: 27/04/2020	FECHA: 27/04/2020

SUM LAV SUMINISTRO DE LAVABO



Elaboró

Autozo

V. Ba.

Carlos Vargas
Ing. Carlos Vargas Ortíz
Residente de Obra


Arturo Salcedo
Art. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

Jose Luis R. Hernandez
Ing. Jose Luis R. Hernandez
Diseños y Construcción Civiles S.A de C.V. DICS

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO	ESTIMACION	
CONTRATO:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA, Y BOLEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	4	
PARTIDA:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
CLAVE		SUBPARTIDA	TRABAJOS EN BAÑO	HOJA: 3	
				DE: 3	
				DEL: 38/04/2020	
				AL: 27/04/2020	
				FECHA: 27/04/2020	

SUM LAV	SUMINISTRO DE LAVABO
CONCEPTO	

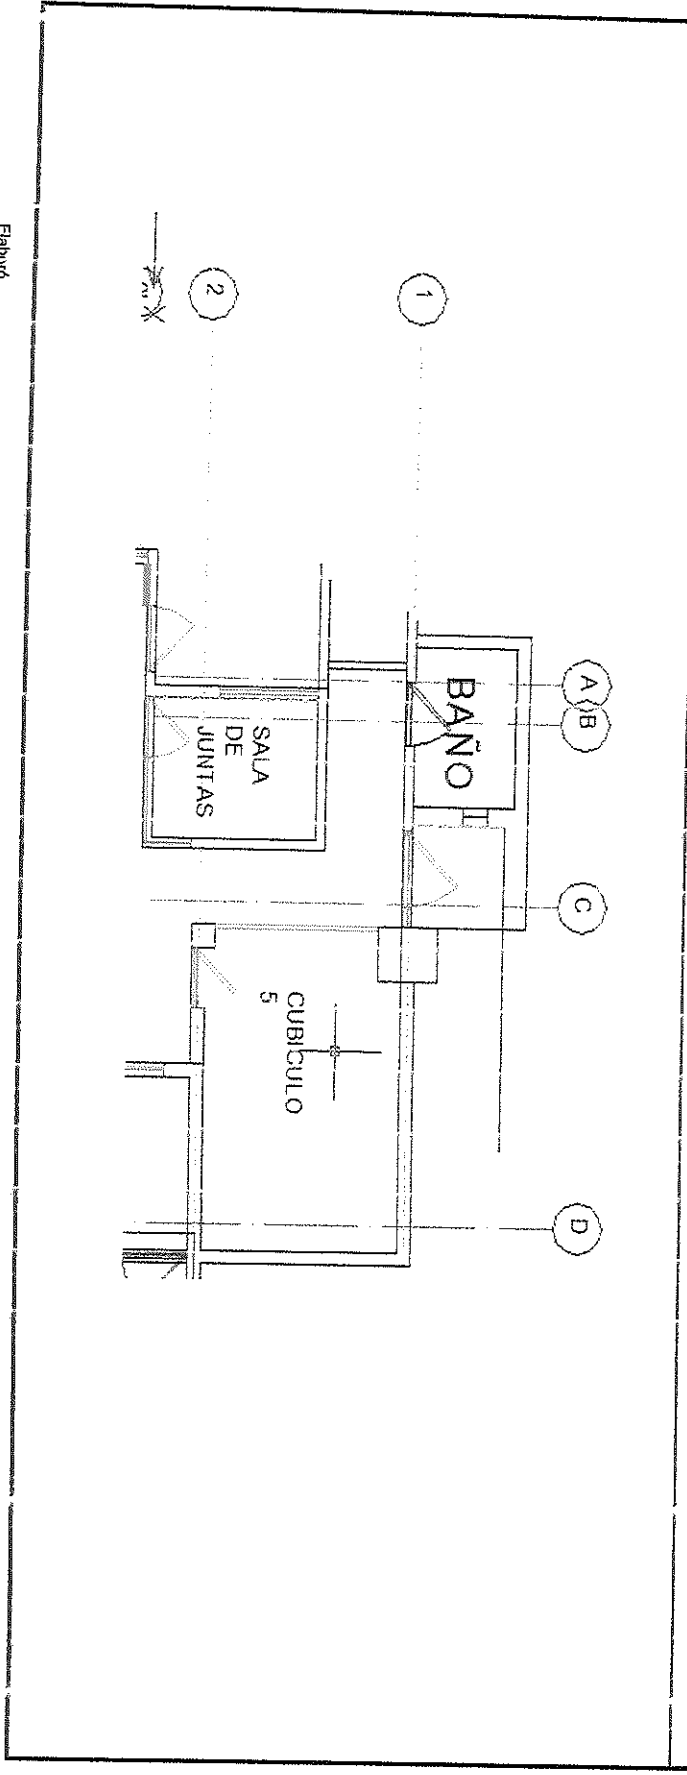

Elaboró

Autorizo

Vr. Bo.


Carlos Vergara
 Arq. Carlos Vergara Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis R. Arizpe Hernández
 Diseños y Construcción Civiles S.A. de C.V. DICE S

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVIL, ES S.A. DE C.V.		DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEMAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS		CIUD/D:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 08/ 4/2020
	CONTRATO:						AL: 27/ 4/2020
	MA	PARTIDA:	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	TRABAJOS EN BAÑO	DE: 2	FECHA: 27/ 4/2020
CLAVE	CONCEPTO						
SUM MING	SUMINISTRQ DE MINGTORIO						

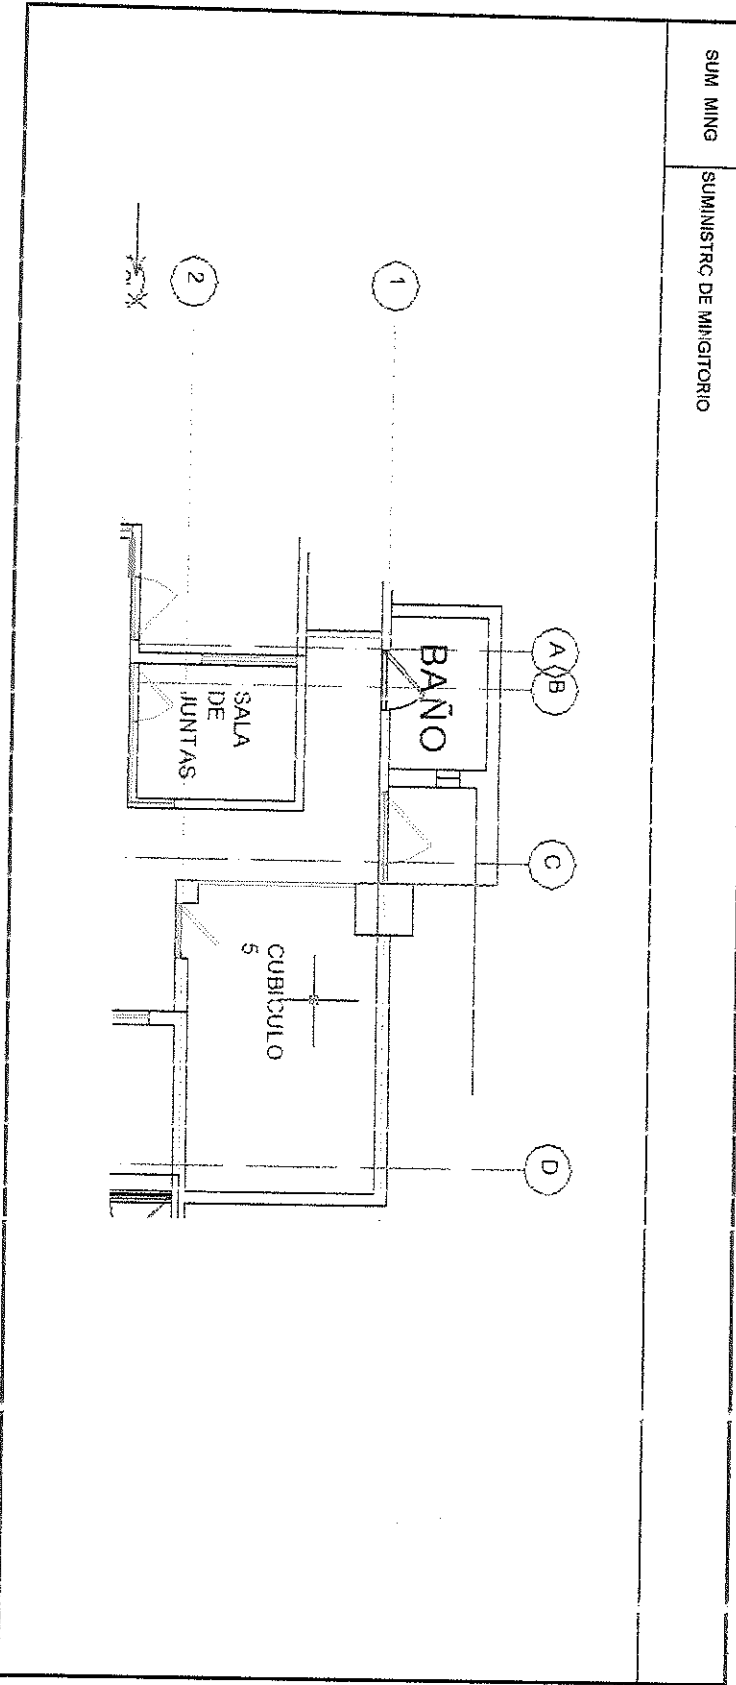

Elaboró

Autorizo

Va. Eo.


Carlos V. Ortega
 Arq. Carlos Vangas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jessé Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DIC SA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	TRABAJOS EN BAÑO	DE: 2
CLAVE	N/A	PARTIDA:			
CONCEPTO					
TEMP+9	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE				

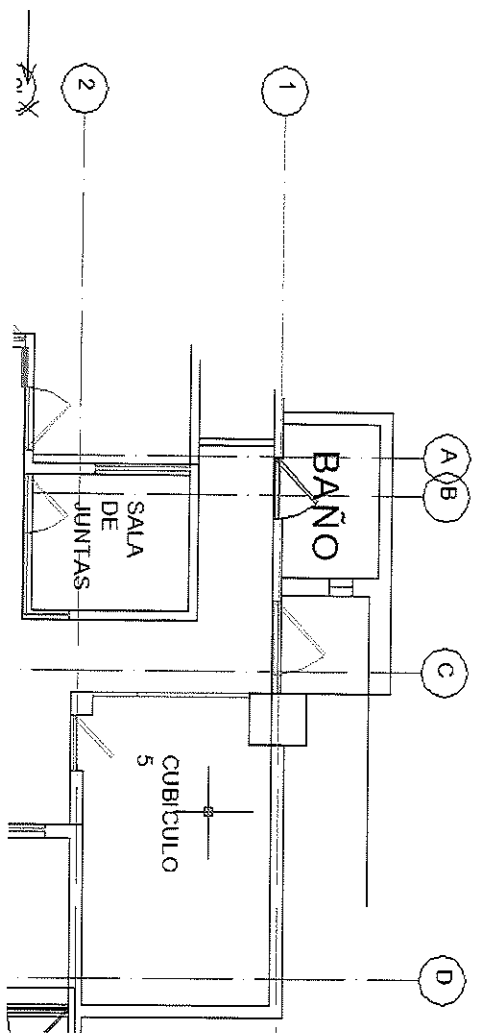

Elaboró

Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Autorizo

Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra


Vo. Bo.

Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO	ESTIMACION	4
C/ BRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BOILERIA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
	PARTEIDA:	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA	TRABAJOS EN BAÑO	DE: 2
	M/A				FECHA: 27/04/2020
CLAVE	CONCEPTO				

TEMP*9	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE
--------	------------------------------

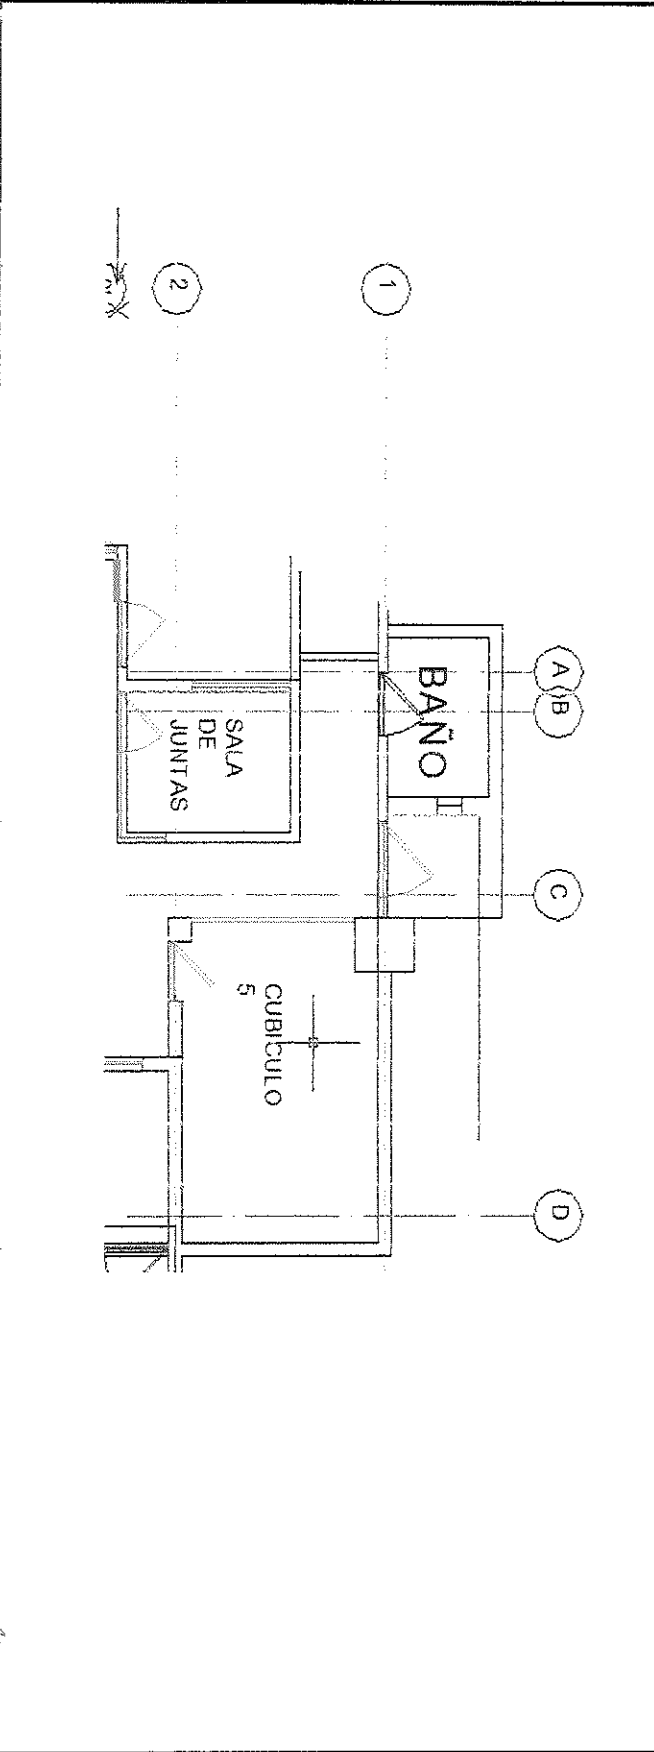

Elaboró

Auto/izo

Vk. Bo.

Carlos Vargas Ordoñez
 Arq. Carlos Vargas Ordoñez
 Residente de Obra


[Signature]
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcción Civiles S.A de C.V. DICES A

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	TRABAJOS EN BAÑO	DE: 4
PARTIDA:				DE: 2	DEL: 08/04/2020
				AL: 27/04/2020	FECHA: 27/04/2020
CONCEPTO					

CERAN OFICINAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	
--	--

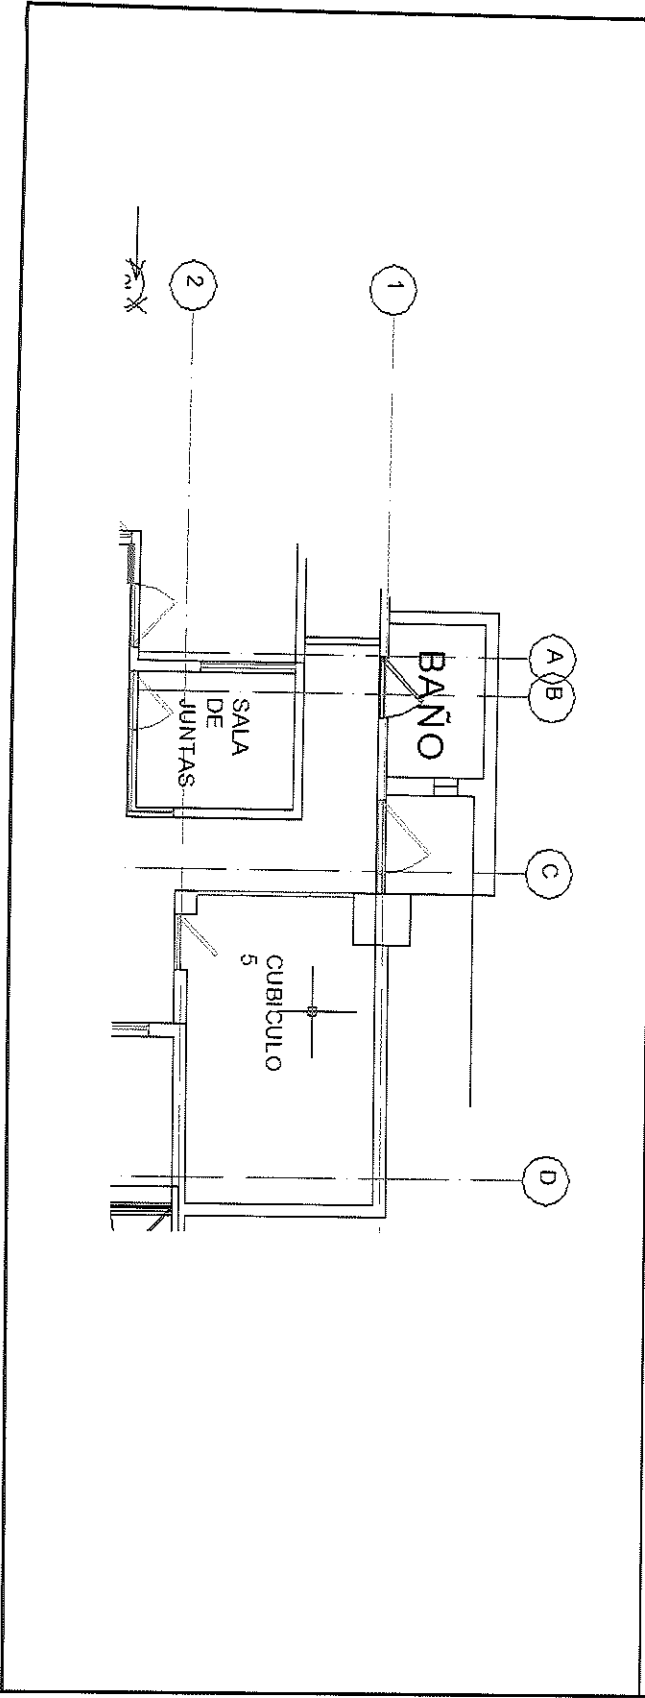

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	4
	CONTRATO:		CHIHUAHUA		DEL: 08/04/2020
					AL: 27/04/2020
					FECHA: 27/04/2020
	PARTIDA:	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ESCALERAS	
					DE: 2
CLAVE	CONCEPTO				

RETI TAP	RETIRO DE PAPEL, TAPIZ EN PISO Y MUROS
----------	--

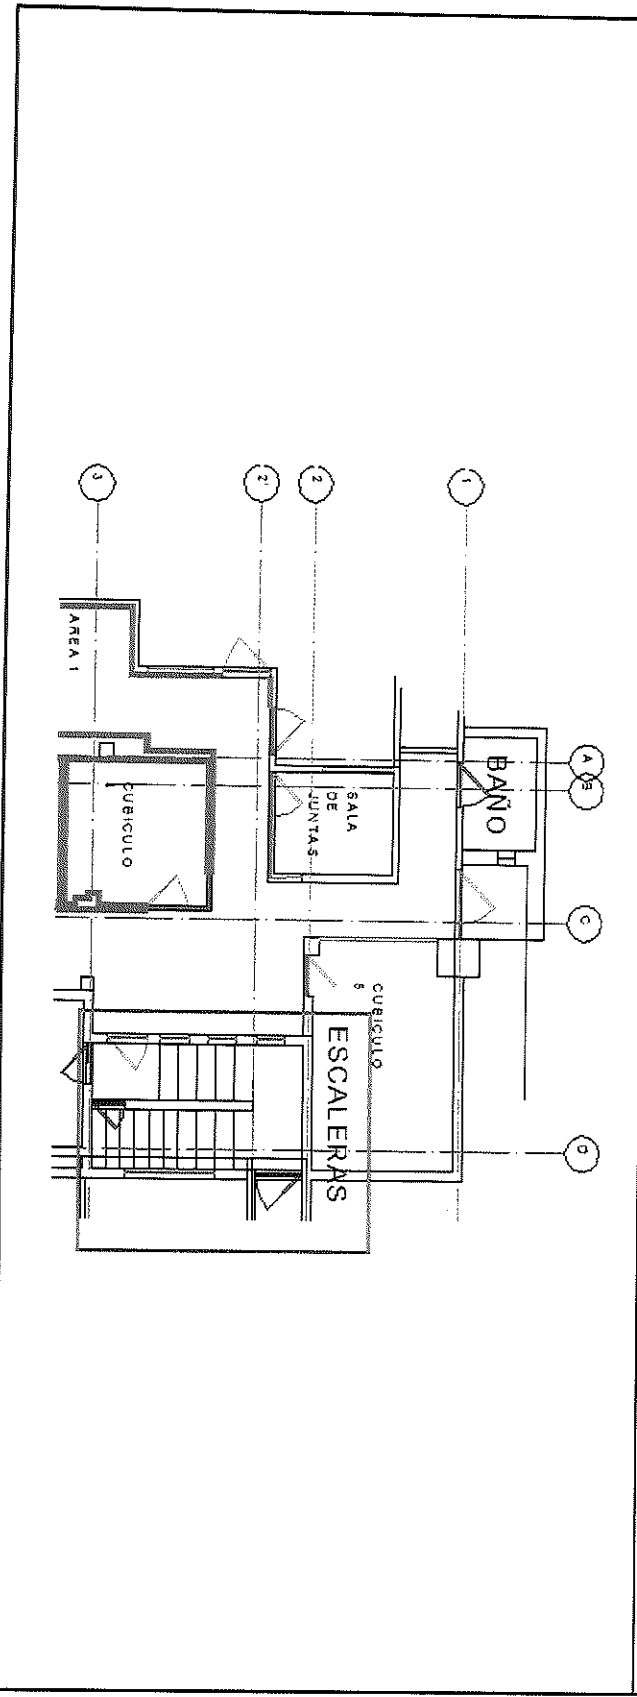

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Romáñez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.				DIRECCION:	AVI: ZARCO N° 2427, COL. ZARCO			ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DELAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS				ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	4
	CONTRATO:							DEL: 08/04/2020	
								AL: 27/04/2020	
								FECHA: 27/04/2020	
CLAVE	PARTIDA:		SUBPARTIDA:		ESCALERAS		HOJA: 2		
							DE: 3		
	CONCEPTO								

TERM. MUR	TERMINACION DE MUEBLES CON APLANADO DE YESO								
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

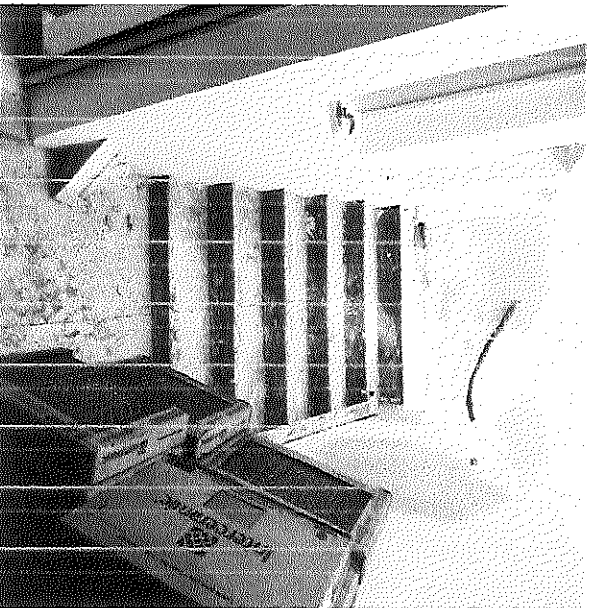

Elaboró

Autorizo

V. Bo.

Carlos Vargas Ortega

A. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Carlos Olivares Salcedo


A. Carlos Olivares Salcedo
Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez

Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
Diseños y Construcción. Civiles S.A de C.V. DICS-1

CROQUIS

CONTR. LISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2421, C.D.L. ZARCO	ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SISTEMAS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTR. TO:	M/I	PARTIDA:	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ESCALERAS
CI AVE		CONCEPTO			
TERMINACION	TERMINACION DE MUROS CON CON APLANADO DE YESO				
DE: 3					
FECHA: 27/04/2020					

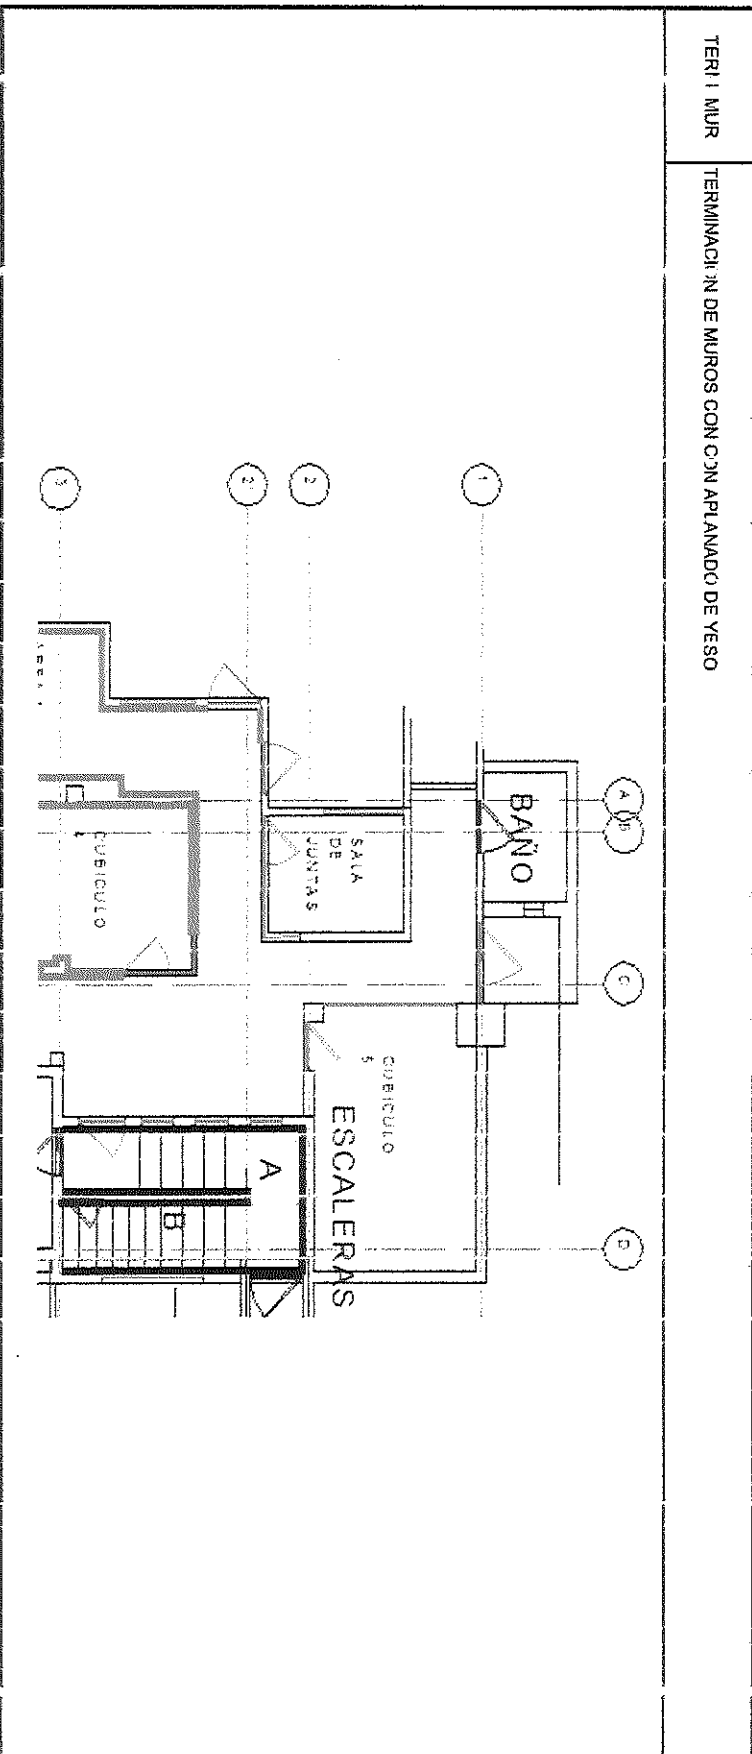

Elaborado

Autorizo

Vº. Bº.

Carlos Vargas C.
 Arq. Carlos Va gas
 Residente de la Obra

[Signature]
 Arq. Carlos Ollave Salgado
 Supervisor de Obra


[Signature]
 Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. D.D.C.S.A

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	4
OBRA:	REHABILITACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 08/04/2020
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR		SUBPARTIDA:	ESCALERAS	AL: 27/04/2020
PARTIDA:				DE: 3		FECHA: 27/04/2020

CONCEPTO

MOD BAR	MODIFICACION DE BARANDAL
---------	--------------------------

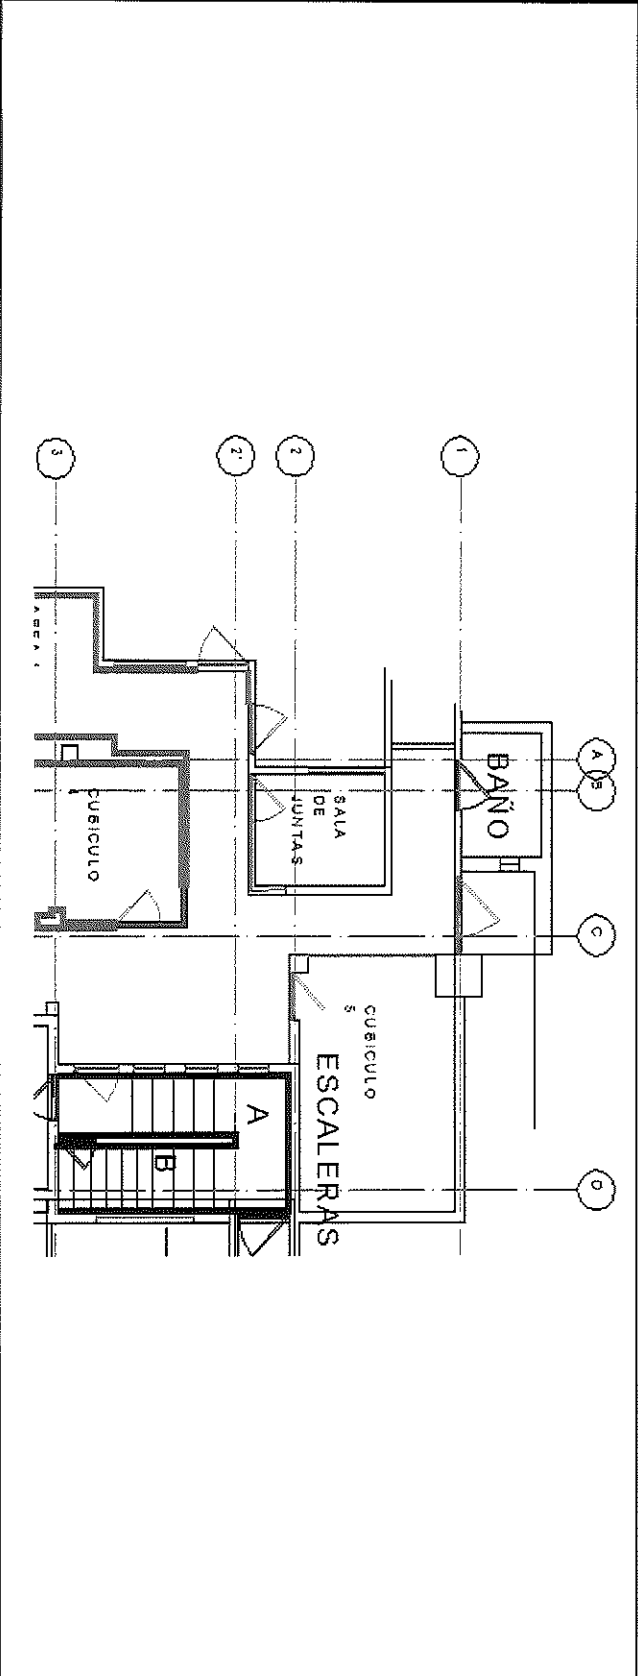

Elaboro

Autorizo

Vo. Bo.


Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICISA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	4
					08/04/2020
	CONTRATO:				DEL:
	N/A	PARTIDA:			AL:
					FECHA:
					27/04/2020
CLAVE	CONCEPTO				

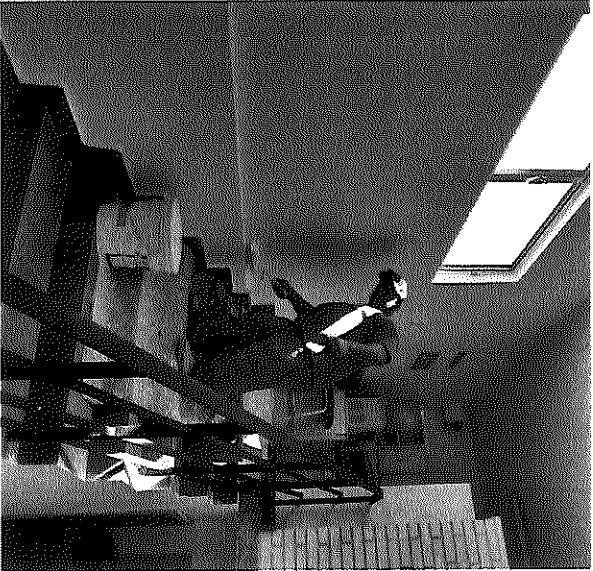MOD BAR	MODIFICACION DE BARANDAL	
---------	--------------------------	--

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Olivas Salgado
Arq. Carlos Olivas Salgado
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernández
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ESCALERAS	HOJA: 2
					DE:3
					AL: 27/04/2020
					FECHA: 27/04/2020
CONCEPTO					

SUM CERAM 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN ESCALERAS
-------------	--



Elaboró

Autorizo

Va. Bo.


Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Carlos Olivas
Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

Jose Luis
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO	ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	4
CONTRATO:	M/A	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	EL: 08/04/20. 0
PARTIDA:	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ESCALERAS	L: 27/04/20. 0
CLAVE	CONCRETO			ECHA: 27/04/20. 0
SUM CERAM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN ESCALERAS			

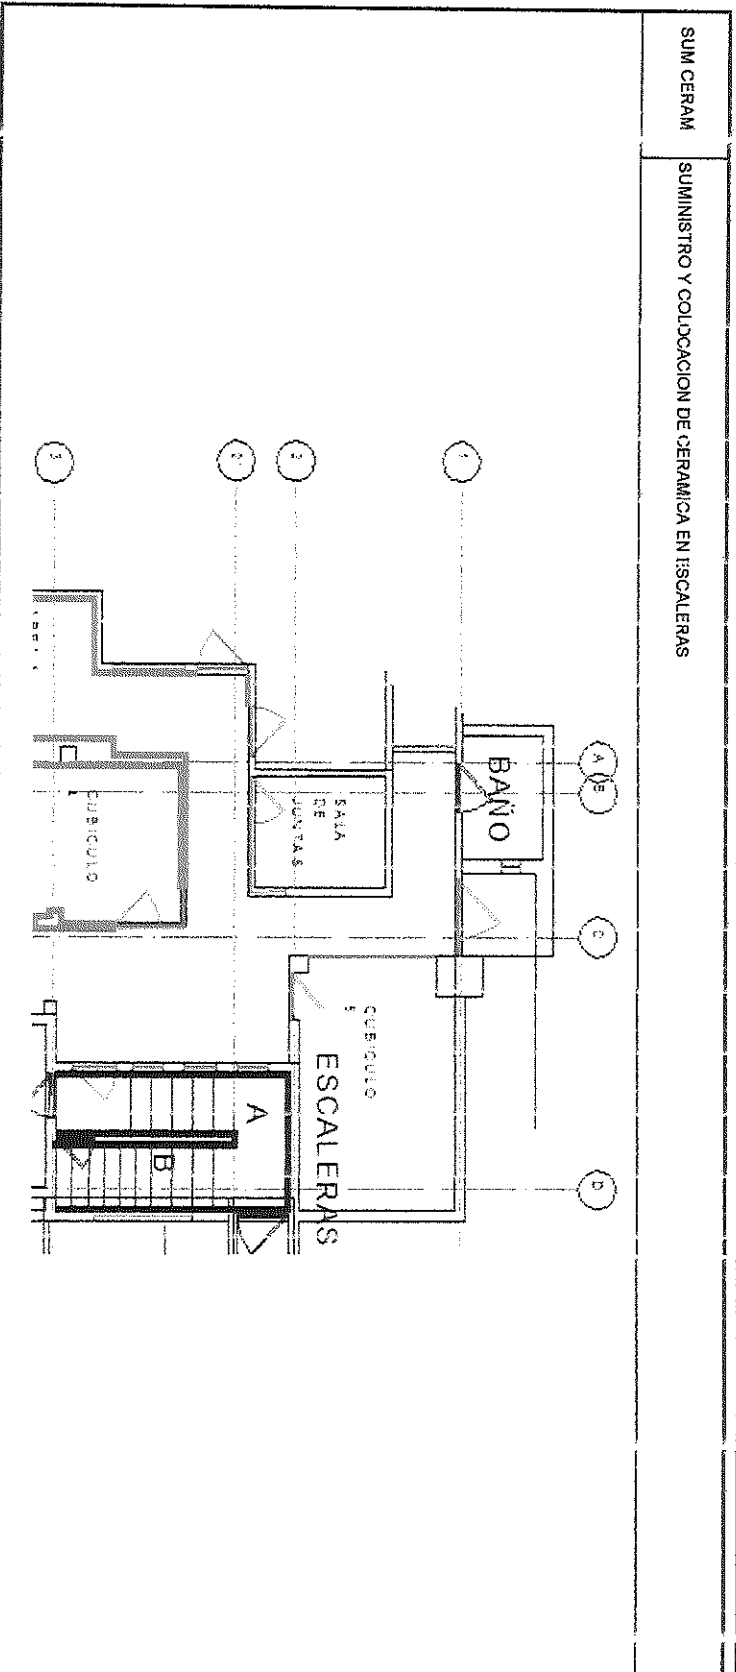

Elaboró

Autorizo

Vo. fo.

Carlos Vargas Ortega
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Vargas Ortega
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Supervisor de Obra



Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Jefe de Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	M/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	DE: 3
					HOJA: 2
					AL: 27/04/2020
					FECHA: 27/04/2020

CONCEPTO

1.36	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
------	------------------------------------

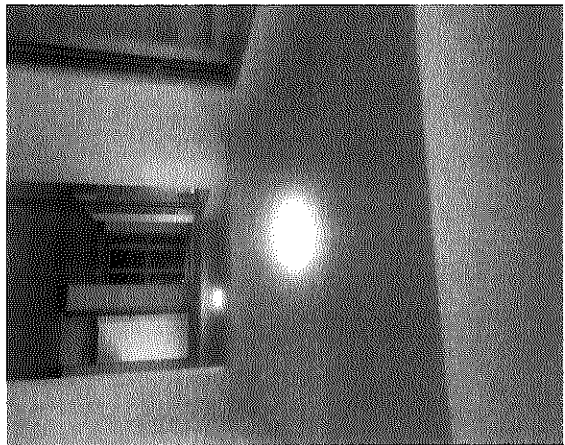

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 08/04/2020
CONTRATO:						AL: 27/04/2020
PARTIDA:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ESCALERAS	DE: 3	FECHA: 27/04/2020

CLAVE	CONCEPTO	
1.36	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	

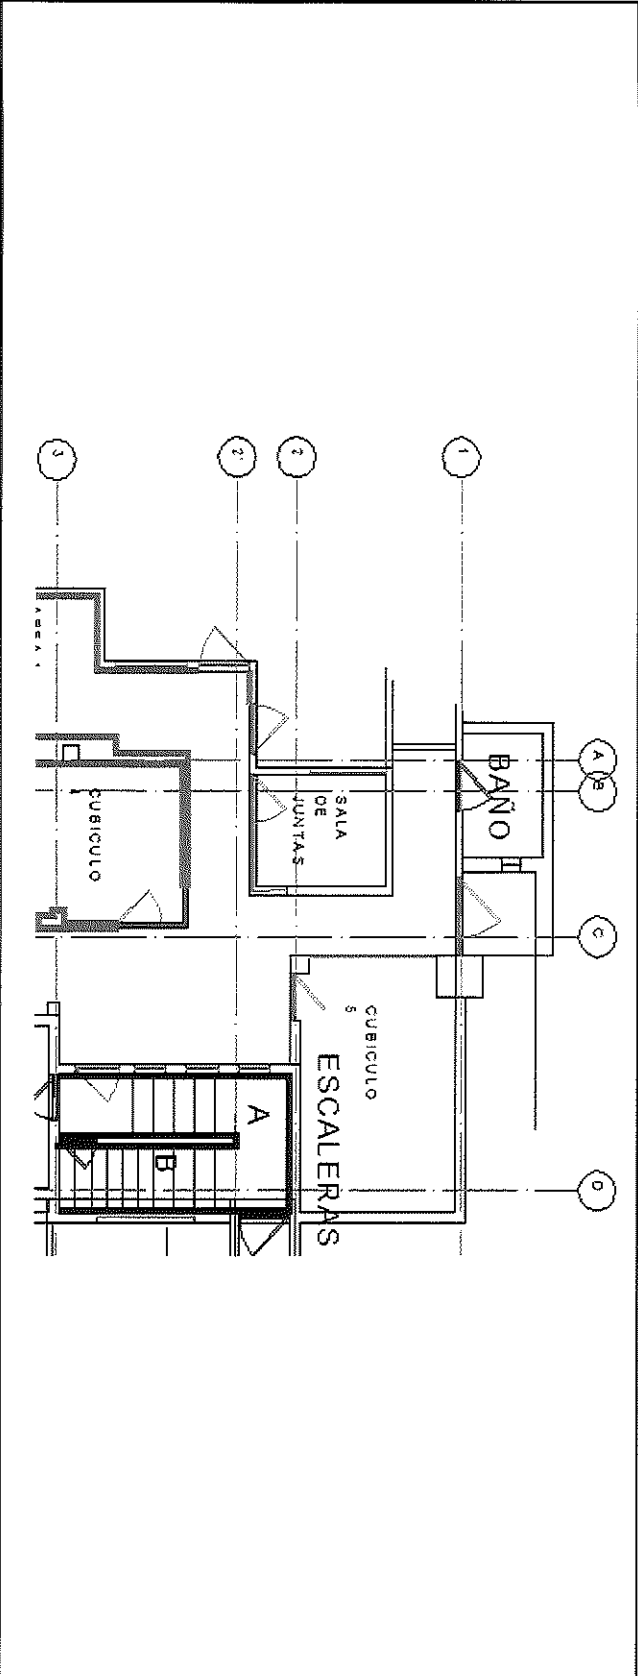

Elaboro

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra


Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA


CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 08/04/2020
CONTRATO:	N/A	ELECTRICIDAD	SUBPARTIDA:		HORA: 2	AL: 27/04/2020
					DE: 3	FECHA: 27/04/2020

CONCEPTO

LAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA GENERAL ELECTRIC INTERIOR SUSP LED60W100-240V4000K5400LM
---------	---

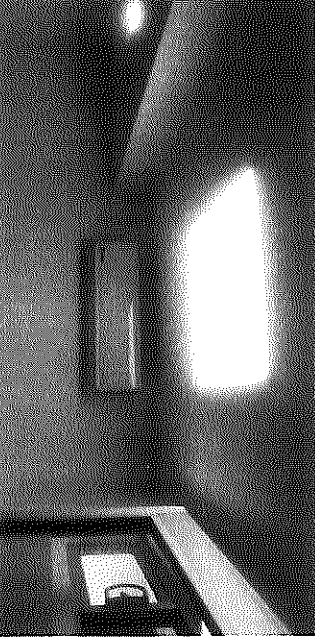

Elaboró

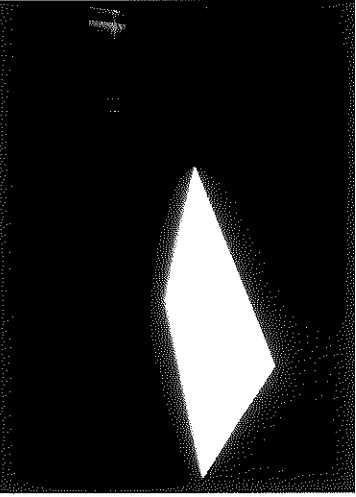

Autorizó

Vo. Bo.

Carlos Vargas D.
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZAVALCO		ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	FECHA: 08/04/2013
CONTRATO:						HORA: 3
	N/A	PARTEIDA:	ELECTRICIDAD	SUBPARTIDA:		DE: 3
CLAVE	CONCRETO					

LAMPARA 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA GENERAL; ELECTRIC INTERIOR GUSP LE D60W/100-240V/1000KS&40 JLM

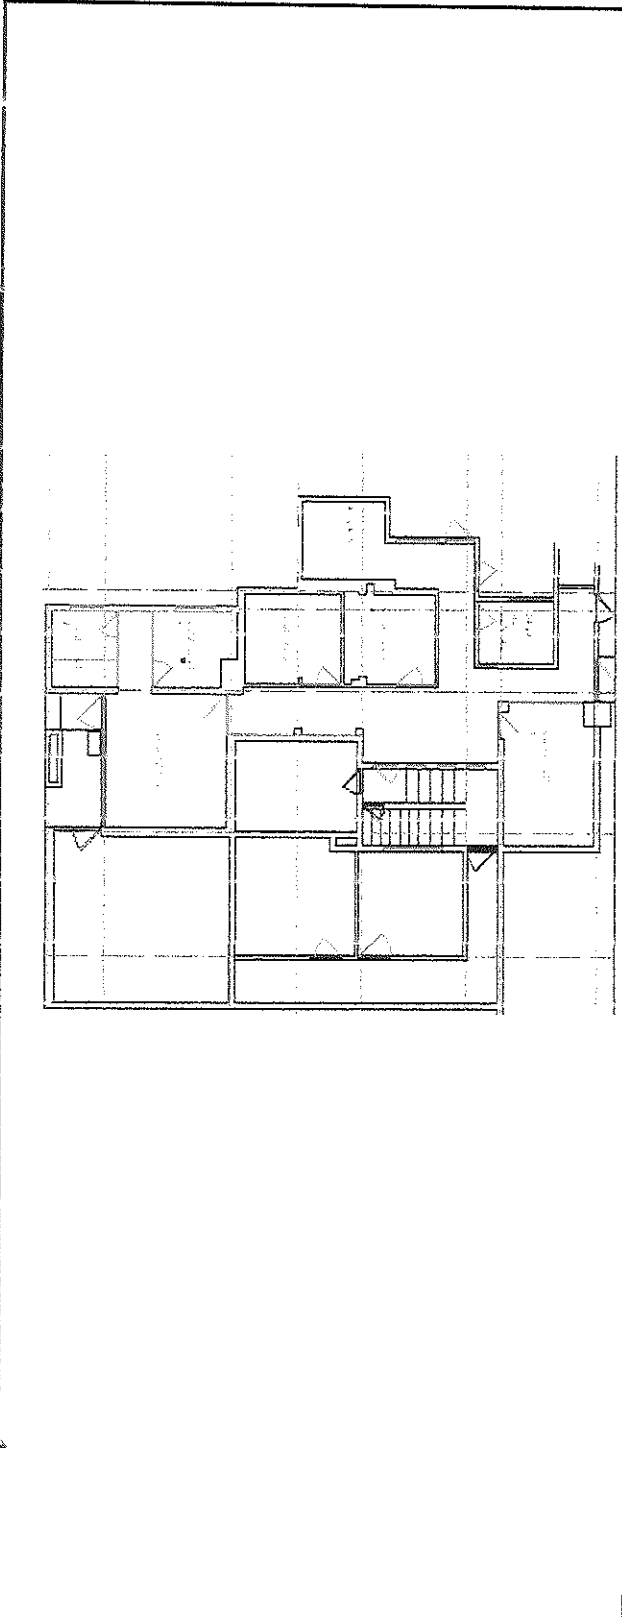

Elaboró

Autorizó

Vo.Bo.


Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Arq. Carlos Olivas Sánchez
Supervisor de Obra

Ing. José Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones (In)tes S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO		
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA, Y BOHEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		PARTIDA:	ELECTRICIDAD	SUBPARTIDA:	
	N/A				
CLAVE	COYCECTO				
LAMP SUJUNT	SUSCRIPCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARA EN SALA DE JUNTA CONSTRUITA R38075830B				
		ESTIMACION		4	
		DEL:	08/04/2020		
		AL:	27/04/2020		
		FECHA:	27/04/2020		

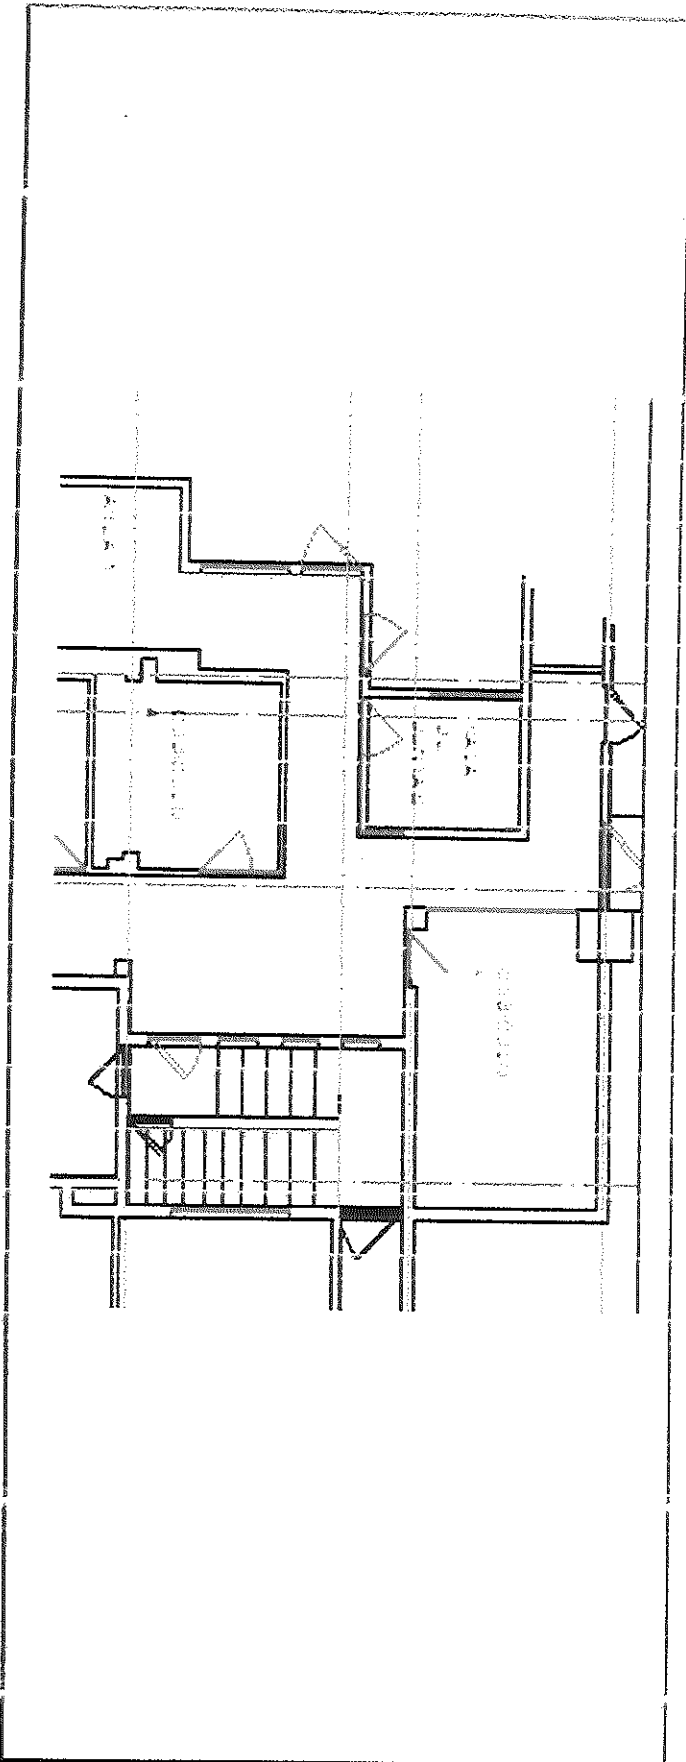

Elaboró

Auto:izo

Vc. Ba.

Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega

[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo

[Signature]
Ing. Jose Luis R. Arriaga Hernández

NÚMERO GENERADORES

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO			ESTIMACION	4																									
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	08/04/2020																									
CONTRATO:	N/A	PARTIDA:	ELECTRICIDAD	SUBPARTIDA:		AL:	27/04/2020																									
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	UNIDAD	TOTAL																						
SPOT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT INTERIOR			CUBICULO 2 CUBICULO 4 AREA 1 RECEPCION PASILLO				2.00 2.00 1.00 13.00 8.00	PZ PZ PZ PZ PZ	2.00 2.00 1.00 13.00 8.00																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">TOTAL</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">PZ</td> <td style="text-align: right;">26.00</td> </tr> </table>											TOTAL																				PZ	26.00
TOTAL																																
									PZ	26.00																						

Elaboró

Autorizó

Vo/Bo

Carlos Vargas C.
Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra


[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.		DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS		ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 08/04/2020
	CONTRATO:		ELECTRICIDAD	SUBPARTIDAS:			AL: 27/04/2020
	N/A	PARTIDA:					FECHA: 27/04/2020
CLAVE	CONCEPTO						

SPOT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT INTERIOR
------	--

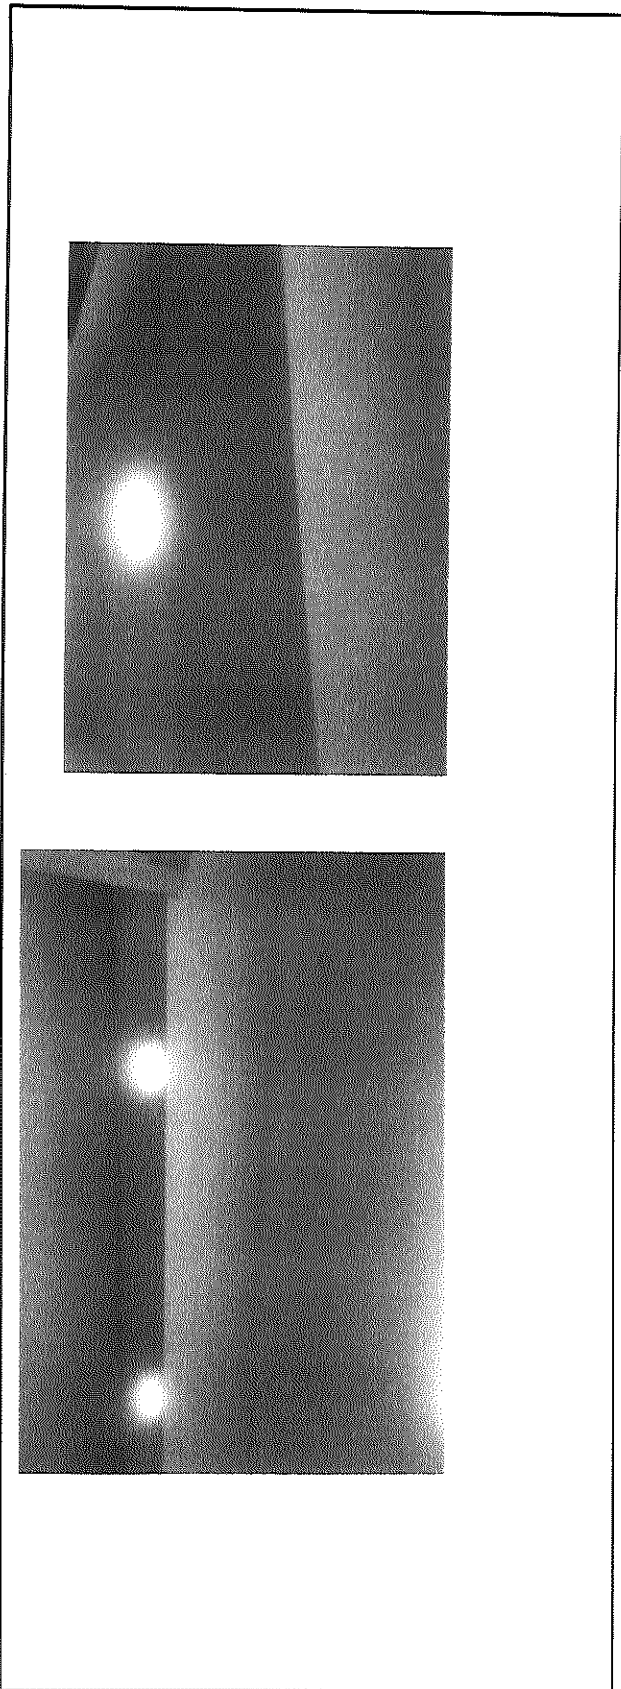

Arg. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Arg. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra


Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DCSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 08/04/2020
CONTRATO:						AL: 27/04/2020
PARTIDA:		ELECTRICIDAD		SUBPARTIDA:		FECHA: 27/04/2020
N/A						DE: 3

CONCEPTO

SPOT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT INTERIOR
------	--

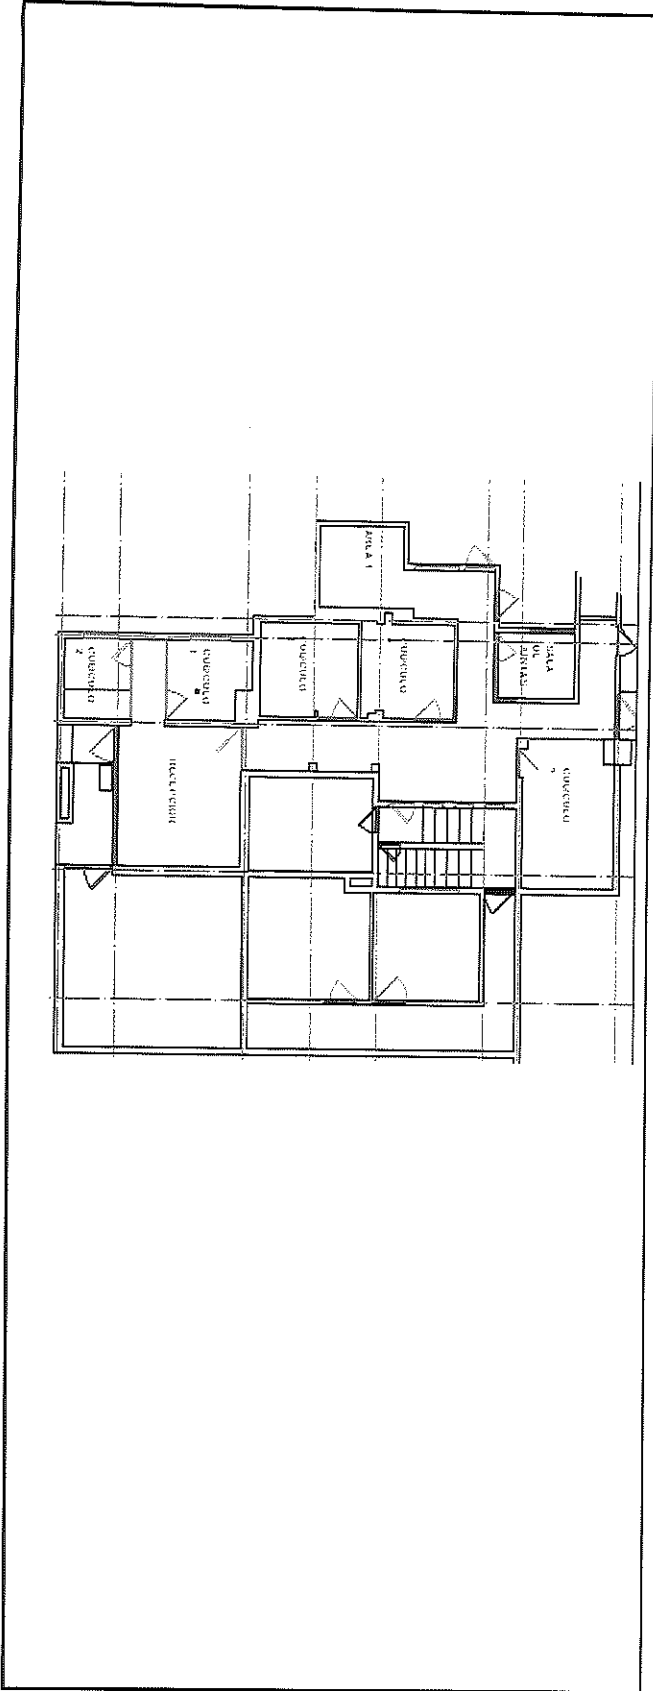

Elaboró

Autorizo

Va. Bo.


Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega

Carlos Olivas
Arq. Carlos Olivas Salcedo

Jose Luis Rodriguez
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO			ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	08/04/2020
	CONTRATO:			CONSTRUCCION				AL:	27/04/2020
				EXTERIOR				FECHA:	27/04/2020
CLAVE	CONCEPTO								
1.33-1	APLANADO A BASE ENJARRE ACABADO FIJO								

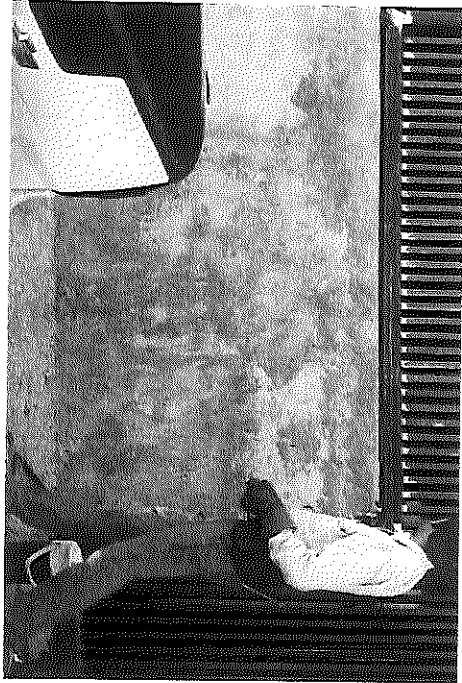

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.


Carlos Vargas O. C.
Arq. Carlos Vargas Oregón
 Residente de Obra

[Signature]
Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2437, COL. ZARCO	ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "TERMINOS Y CUERPOS" Y AREA DE CALLETA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	4
CONTRATO:	N/A	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	FECHA: 08/04/2013
CLAVE	1.33-1	SUBP/RUIDA:		FECHA: 27/04/2013
CONCEPTO				
APLAVADO A BASE ENJARRI ACABADO FIJO				

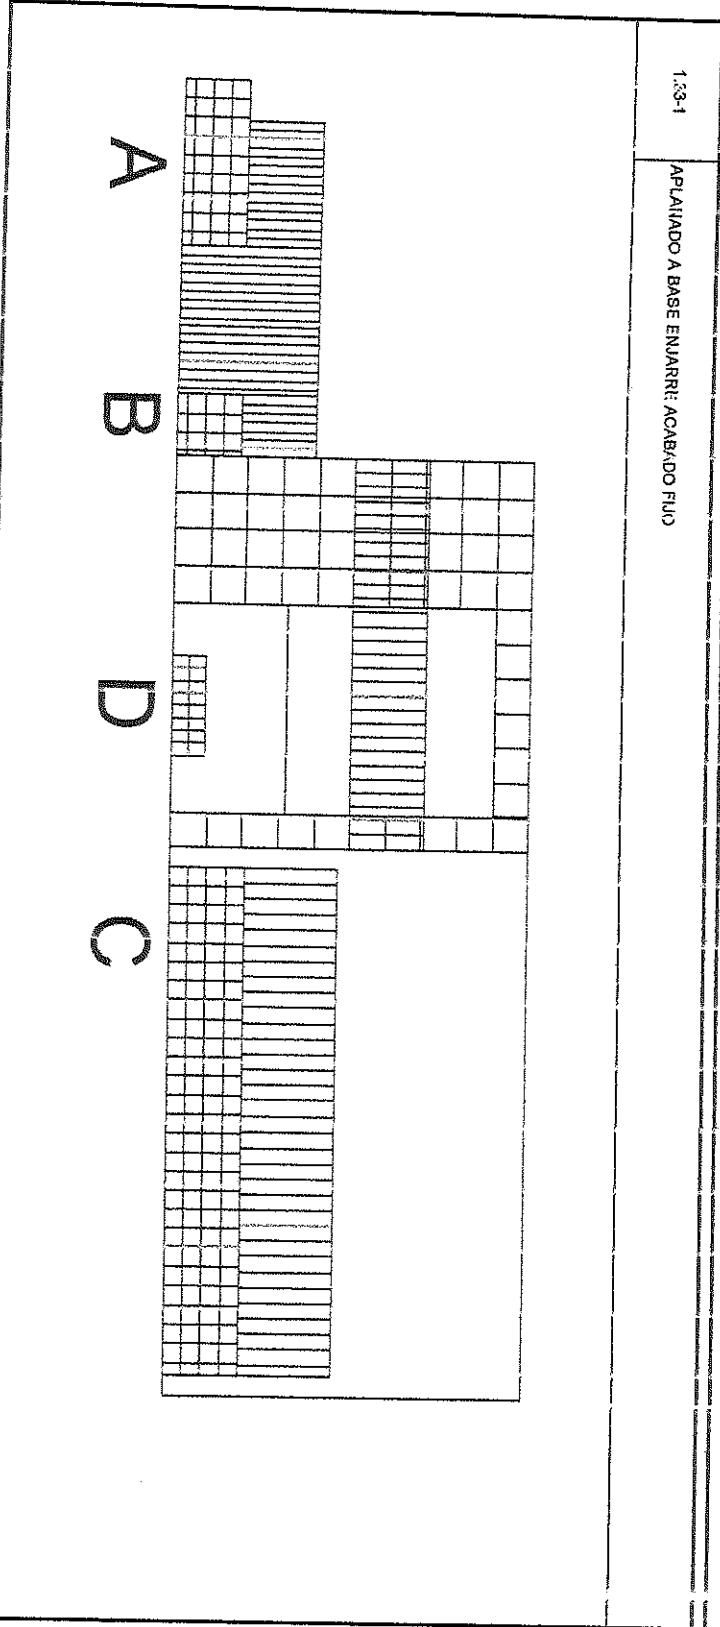

Elaboró:

Autorizo:

1/0. 1/0.

Carlos Vargas Olivas
 Arq. Carlos Vargas Olivas
 Residente de Obra

[Signature]
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. José Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Coordinaciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO			ESTIMACION	4
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA		
	CONTRATO:		PARTIDA:	CONSTRUCCION EXTERIOR	SUBPARTIDA:	ALBALILIERI AS	HOJA: 2	DEL:	08/04/2020
	N/A						DE: 3	AL:	27/04/2020
CLAVE	CONCEPTO								

CANTERA 40*40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA DE 40*40 COLOR PINON



Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO			ESTIMACION	4	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	08/04/2020	
	CONTRATO:							AL:	27/04/2020	
	PARTIDA:			CONSTRUCCION EXTERIOR	SUBPARTIDA:	ALBALERIAS	DE:	3	FECHA:	27/04/2020
CLAVE	CONCRETO									

CANTERA 40*40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA DE 40*40 COLOR PIÑON

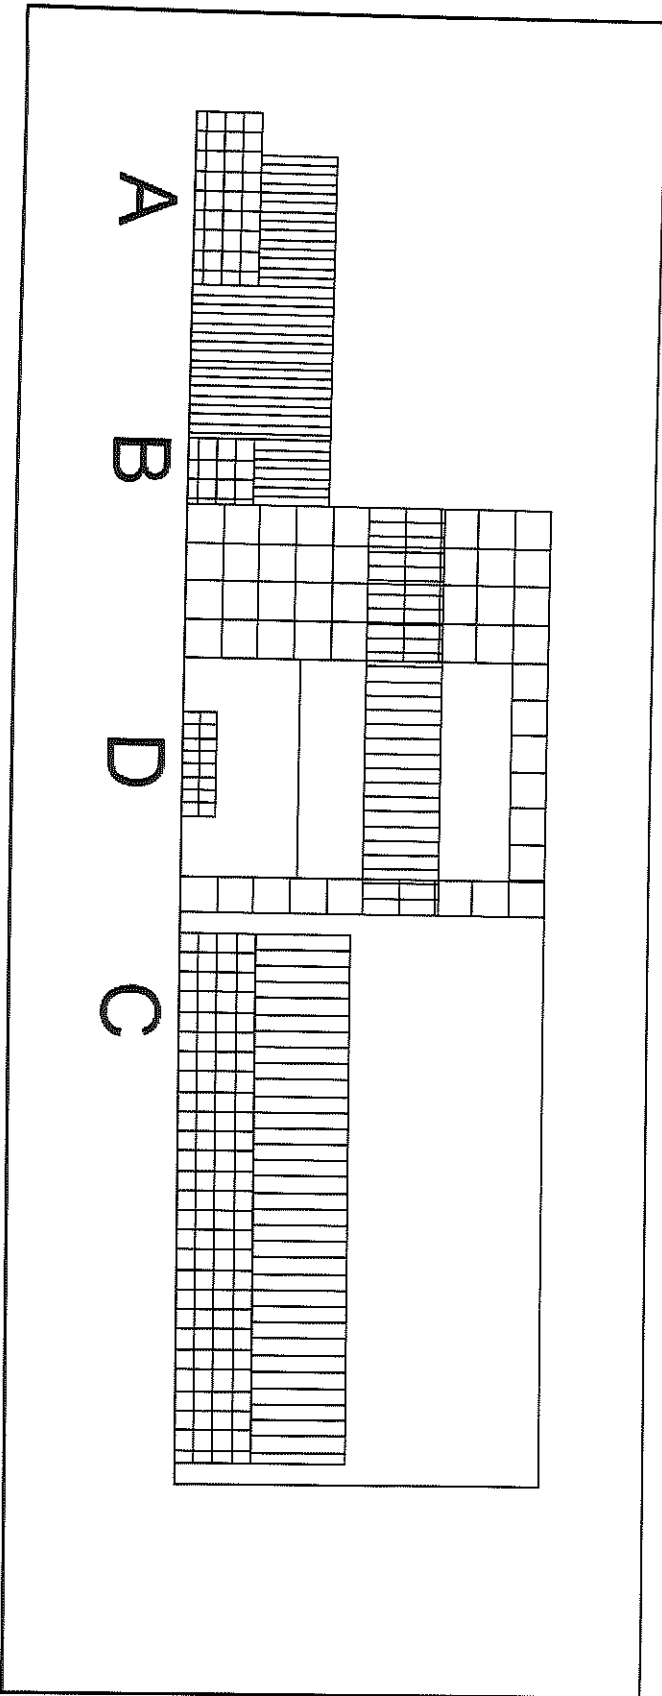

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega

Carlos Olivas
Arq. Carlos Olivas Salcedo

Jose Luis Rodriguez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C00574 Del 04/05/2020

Fecha y hora de impresión | 21/may./2020
10:20 a. m.
Página | 1

Concepto: 2930 - Obra Pública : REM/OFNAS/PRINC - REMODELACION OFICINAS PRINCIPALES C.E.D.H. Contrato : 2. GP Folio: 64

Beneficiario: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV**

Folio / Cheque : SPEI


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110120-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por	\$447,256.04		GP Folio: 64
0002	8260-110120-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por		\$447,256.04	GP Folio: 64
0003	2113-000854	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES	\$447,256.04		GP Folio: 64
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$447,256.04	GP Folio: 64
Sumas iguales =>			<u>894,512.08</u>	<u>894,512.08</u>	



BancaNet Empresarial

Lunes 4 de Mayo de 2020, 4:02 PM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BANREGIO - 058150600168600110	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 447,256.04
	Fecha valor	04/05/2020
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	040520
	Concepto del pago	EST NO 5 REMODELACION FACHADA CEDH
	Número de Autorización	285344
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

RFC: DCC060124KSZ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31125
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 2930
Fecha: 4/5/2020 12:54:47

Datos del cliente:
Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5
Domicilio: Av. Zarco No. 2427, Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, México
Uso CFDI: I01 - Construcciones


Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad SAT, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 72102900, 1.00, E48, Servicio - PAGO DE ESTIMACION No. 5...

Observaciones:

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 04/100

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (385,565.55), Impuestos Traslados (61,690.49), Total (447,256.04)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

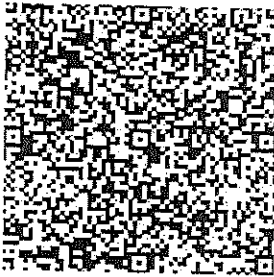

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408408629
Folio fiscal: 8E4ED343-E50C-40F9-9286-33DDA54535B7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2020 - 13:54:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

QSmGQPkrCzDG7fju72Bv4IBSnJsRCJb0fjWSA4i+7s/4nri+Xm5TR3e0t0wiwEmHUocSHC8iLGPZVEur36VMzG
+HY/yKdJdpnnIBis4tMaPrTneb2DgFRXwkiXox+S/QgpAh0kfOPqoHxOEuTMik/sa+ktwirgGX3hTFM7/6haq
717Z1hWBh3DWis58KFFAs5jWn+qb9DOK/FOU6qV7wxyEPYN5PJkPI5BdmeTzQPhn0mbX/69CB3MzXG4XeW1+c
YdjKpuxyk99v/yxER9N6YZeC6Oe8KcBMw8aCdkWZmBnqrJxKJIHSO+r6vyAviQvxHgrGVon5mD6ibL9uSFA==

Sello del SAT:

luL2K2Uu2aD1yT8W4R+maiEdmMjrvZurmWt53aZibW159Y7oyQRE2ZANsbkyTI7y0HEXy/2BAfetpimck
r2oCVRym3McvayODPRwqgo2actN10x3sELYhxoX/piWowZx3AwEXnEe/NQ62h4hWVo/qfwn1ZX+s8gZ
tuWS3yvwVudv8vuwgzlQQQFORFdtlvrQUWihm3I2YScnSts+XqsMS4R6HYyTzGZ3zW9yBI3kAV6PiZ0tb
Dve1ILbFYVWbGJonsJwEGGPGRRdbd5RL2nhgck3CaQfrjPaF9Nkj6XZ9G9AABKXmYUDZ8v5tl9j9bEL
c6Lhf7XmdVcH8EctLvEbGa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8E4ED343-E50C-40F9-9286-33DDA54535B7|2020-05-04T13:54:51|MAS0810247C0|QSmG
QPkrCzDG7fju72Bv4IBSnJsRCJb0fjWSA4i+7s/4nri+Xm5TR3e0t0wiwEmHUocSHC8iLGPZVEur36VM
zG+HY/yKdJdpnnIBis4tMaPrTneb2DgFRXwkiXox+S/QgpAh0kfOPqoHxOEuTMik/sa+ktwirgGX3hT
FM7/6haq717Z1hWBh3DWis58KFFAs5jWn+qb9DOK/FOU6qV7wxyEPYN5PJkPI5BdmeTzQPhn0mbX/69
CB3MzXG4XeW1+cYdjKpuxyk99v/yxER9N6YZeC6Oe8KcBMw8aCdkWZmBnqrJxKJIHSO+r6vyAviQvxH
grGVon5mD6ibL9uSFA==|00001000000404486074||

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTROL DE ESTIMACIONES**

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.

REMEDIACION OFICINAS

OBRA: REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODIO, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS

Ubicaci6n: ANE. ZARCO, N° 2402, COL. ZARCO

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.

GLOBAL A LA FECHA

No. DE CONTRATO: \$ S/N

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,638,367.83

ESTIMACION No. 5

PERIODO: Del 28 al 15 de Mayo del Año 2020

FECHA: UNO

lunes, 04 de mayo de 2020

CONCEPTO	CONTRATADO	PAGO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PAGO ACUMULADO	POR EJERCER
OBRA NORMAL:	\$ 1,638,367.83	\$ 671,563.73	\$ 385,565.55	\$ 1,257,129.28	\$ 381,238.55
MATERIALES	\$	\$	\$	\$	\$
CONTRATO FINAL	\$	\$	\$	\$	\$
OBRA EXCEDENTE:	\$	\$	\$	\$	\$
OBRA EXTRAORDINARIA:	\$	\$	\$	\$	\$
ESCALATORIA:	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL:	\$ 1,638,367.83	\$	\$ 385,565.55	\$ 1,257,129.28	\$ 381,238.55

ESTADO DE AVANCE		DATOS DEL ANTICIPO		RETENCIONES	
AVANCE PROGRAMADO:		ANTICIPO OTORGADO	\$	IMPORTE RETENIDO ANTERIOR:	\$
AVANCE REAL:	77%	% DE I. V. A.	-	ESTA RETENCION:	\$
AVANCE ESTA ESTIMACION:	24%	ANTICIPO OTORGADO	0.00	RETENCION ACUMULADA:	\$
ESTADO DE CUENTA		AGORTIZACION ACUMULADO ANTERIOR:	\$ 0.00		\$
IMPORTE PAGADO ANTERIOR:	\$ 871,563.73	ESTA AMORTIZACION	\$ 0.00		\$
IMPORTE ESTIMACION:	\$ 385,565.55	AMORTIZADO ACUMULADO:	\$ 0.00		\$
IMPORTE ACUMULADO:	\$ 1,257,129.28	POR AMORTIZAR (SALDO):	\$ 0.00		\$
IMPORTE POR PAGAR:	\$ 381,238.55				\$ 0.00

RESUMEN	
IMPORTE ESTA ESTIMACION:	\$ 385,565.55
I.V.A.:	\$ 61,690.49
TOTAL A PAGAR:	\$ 447,256.03

ELABORADO: *Carlos Vargas Olivas*

REVISOR: *Arq. Carlos Olivas Salcedo*

AUTORIZADO: *Ing. Jose Luján Rodríguez Hernández*


Arq. CARLOS VARGAS OLIVAS
RESIDENTE DE OBRA


Arq. CARLOS OLIVAS SALCEDO
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSE LUJÁN RODRIGUEZ HERNANDEZ
Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

suministro y colocación de estufa RIT 1 de 15va de vida	M2	124,30	60,34	998,28	124,30	124,30	100%	0%	100%	\$	998,28	\$	-	\$	998,28	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	104,10	632,47	8284,33	104,10	104,10	100%	0%	100%	\$	8284,33	\$	-	\$	8284,33	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE CERAMICA DE 10CM	M4	106,40	132,49	13964,45	106,40	106,40	100%	0%	100%	\$	13964,45	\$	-	\$	13964,45	\$	-
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	M2	396,60	64,32	21740,78	396,60	396,60	100%	0%	100%	\$	21740,78	\$	-	\$	21740,78	\$	-
TRANSFERENCIA DE BANCOS																	
DESMONTAR JUEGO DE SANITARIOS	LOTE	1,00	600,00	600,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	600,00	\$	-	\$	600,00	\$	-
INSTALACION DE SANITARIOS	LOTE	1,00	1100,00	1100,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	1100,00	\$	-	\$	1100,00	\$	-
SUMINISTRO DE SANITARIO	P2	1,00	650,00	650,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	650,00	\$	-	\$	650,00	\$	-
SUMINISTRO DE LAVAO, INC. MECULADORA	P2	1,00	1200,00	1400,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	1200,00	\$	-	\$	1200,00	\$	-
SUMINISTRO DE JINETORIO	P2	1,00	1150,00	1150,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	1150,00	\$	-	\$	1150,00	\$	-
RETRIO DE CERAMICA EXISTENTE	M2	3,45	65,07	224,49	3,45	3,45	100%	0%	100%	\$	224,49	\$	-	\$	224,49	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	3,45	632,47	2182,02	3,45	3,45	100%	0%	100%	\$	2182,02	\$	-	\$	2182,02	\$	-
DESMONTAR PUERTA EXISTENTE E INSTALAR PUERTA NUEVA DE MADERA	LOTE	1,00	4000,00	4000,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	4000,00	\$	-	\$	4000,00	\$	-
MATERIAL ALIATORIO																	
RETRIO DE CERAMICA EXISTENTE	M2	2,70	15,07	175,69	2,70	2,70	100%	0%	100%	\$	175,69	\$	-	\$	175,69	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	2,70	632,47	1907,67	2,70	2,70	100%	0%	100%	\$	1707,67	\$	-	\$	1707,67	\$	-
PUERTA DE 80X20 Y RINDO LATERAL DE 80X20 EN ALUMINIO DE 7' OZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	P2	1,00	636,58	936,58	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	936,58	\$	-	\$	936,58	\$	-
QUITAR CERAMICAS EXISTENTES	P2	30,00	80,00	240,00	30,00	30,00	100%	0%	100%	\$	240,00	\$	-	\$	240,00	\$	-
COLOCACION DE CERAMICAS	P2	30,00	80,00	240,00	30,00	30,00	100%	0%	100%	\$	240,00	\$	-	\$	240,00	\$	-
AREA DE PISCALERIAS																	
RETRIO DE PAPEL PARE EN PIRIO Y MUDROS	LOTE	1,00	2000,00	2000,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	2000,00	\$	-	\$	2000,00	\$	-
TERMINACION DE MUDROS CON CON ARMADO DE YESO	M2	82,40	45,00	3708,00	82,40	82,40	100%	0%	100%	\$	3708,00	\$	-	\$	3708,00	\$	-
MEJORACION DE BARRANDA	LOTE	1,00	3890,00	3890,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	3890,00	\$	-	\$	3890,00	\$	-
SUMINISTRO DE PUERTAS CON REILLAS INTERIOR	P2	2,00	4500,00	9100,00	2,00	2,00	100%	0%	100%	\$	9100,00	\$	-	\$	9100,00	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINADA PARA EXTERIOR	P2	1,00	4000,00	4000,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	4000,00	\$	-	\$	4000,00	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN ESQUELETOS	LOTE	1,00	9500,00	9500,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	9500,00	\$	-	\$	9500,00	\$	-
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	M2	82,40	69,32	4897,97	82,40	82,40	100%	0%	100%	\$	4897,97	\$	-	\$	4897,97	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 200 X 100 DE VIDRIO DE 6MM	P2	1,00	6000,00	6000,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	6000,00	\$	-	\$	6000,00	\$	-
ACCESOS																	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRANDA PARA DISCAPACITADOS	LOTE	1,00	6000,00	6000,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	6000,00	\$	-	\$	6000,00	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INCIDIPER DOMICO EN COLOR DONADO	LOTE	1,00	5500,00	5500,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	5500,00	\$	-	\$	5500,00	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROPERFORADO EN COLOR ROJO	LOTE	1,00	441,72	441,72	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	441,72	\$	-	\$	441,72	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA DE ACENO METALICA	LOTE	1,00	4584,00	4584,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	4584,00	\$	-	\$	4584,00	\$	-
REDES DE BARRANDAS																	
CAMBIO DE GARG DE PUERTA (inc cambio de marco, locos de tiras y colocacion de estufa)	LOTE	1,00	2438,00	2438,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	2438,00	\$	-	\$	2438,00	\$	-
SUMINISTRO DE PAPEL ARBORDO EN PUERTAS	LOTE	2,00	1310,00	2620,00	2,00	2,00	100%	0%	100%	\$	2620,00	\$	-	\$	2620,00	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPEL ARBORDO EN VENTANAS	LOTE	2,00	1310,00	2620,00	2,00	2,00	100%	0%	100%	\$	2620,00	\$	-	\$	2620,00	\$	-
CANBERELIAS																	
SALA DE PUERTAS																	
PLD CLARO DE 80X20 EN ALUMINIO DE 7' OZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	P2	1,00	6110,95	6110,95	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	6110,95	\$	-	\$	6110,95	\$	-
PLD CLARO DE 80X20 EN ALUMINIO DE 7' OZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	P2	1,00	6272,96	6272,96	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	6272,96	\$	-	\$	6272,96	\$	-
PUERTA DE 80X20 EN ALUMINIO DE 7' OZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	P2	1,00	8550,50	8550,50	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	8550,50	\$	-	\$	8550,50	\$	-
CONDICIONES																	
PLD DE 201 X 20 EN ALUMINIO DE 7' OZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	P2	1,00	12770,00	12770,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	12770,00	\$	-	\$	12770,00	\$	-
PUERTA DE 80X20 EN ALUMINIO DE 7' OZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	P2	1,00	8550,50	8550,50	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	8550,50	\$	-	\$	8550,50	\$	-

MUROS DE DURLOCK 2 COMAS	M2	840	789,77	663,47	840	0,40	0%	100%	100%	\$	-	\$	6.634,07	\$	6.634,07	\$	-		
Suministro y colocación de abajaluz R11 de 60w de vidrio	M2	54,80	80,34	5205,93	64,80	64,80	0%	100%	100%	\$	-	\$	5.206,03	\$	5.206,03	\$	-		
REVENILACION DE PISOS EXISTENTES	M2	47,00	180,60	7050,00	47,00	47,00	0%	100%	100%	\$	-	\$	7.050,00	\$	7.050,00	\$	-		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	47,00	632,47	29725,09	47,00	47,00	0%	100%	100%	\$	-	\$	29.725,09	\$	29.725,09	\$	-		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE CERAMICA DE 10CM	M2	77,00	134,49	10201,73	77,00	77,00	0%	100%	100%	\$	-	\$	10.201,73	\$	10.201,73	\$	-		
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	M2	124,00	65,12	7474,32	124,00	124,00	0%	100%	100%	\$	-	\$	7.474,32	\$	7.474,32	\$	-		
CHAPLETES																			
PIRATA DE GYPSUM Y LATA DE TUBO DE PASADEN ALUMINIO DE 2" G2 CON UNIDICLORO DE 20MM	PZ	200	8986,58	18773,16	200	200	0%	100%	100%	\$	-	\$	18.773,16	\$	18.773,16	\$	-		
UNIDOS CLAVOS DE 8MM	PZ	100	1883,20	1883,20	100	100	0%	100%	100%	\$	-	\$	1.883,20	\$	1.883,20	\$	-		
ELECTRIFICACION																			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE	PZ	600	537,44	3224,64	600	600	0%	100%	100%	\$	-	\$	3.224,64	\$	3.224,64	\$	-		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION	PZ	300	581,24	1812,32	300	300	0%	100%	100%	\$	-	\$	1.812,32	\$	1.812,32	\$	-		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EN SALA DE JUNTAS CON TRUFA REGULABLE	PZ	200	2351,75	5263,56	200	200	0%	100%	100%	\$	-	\$	5.263,56	\$	5.263,56	\$	-		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT INTERIOR	PZ	100	1028,84	1028,84	100	100	0%	100%	100%	\$	-	\$	1.028,84	\$	1.028,84	\$	-		
SUMINISTRO DE SALIDA PARA MANIPULI	PZ	200	2453,39	4872,78	200	200	0%	100%	100%	\$	-	\$	4.872,78	\$	4.872,78	\$	-		
VOZ Y DATOS																			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELEFONIA CELULAR	PZ	600	427,59	2567,88	600	600	0%	100%	100%	\$	-	\$	2.567,88	\$	2.567,88	\$	-		
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIPULI DE 1 TON	PZ	200	21297,63	42595,37	200	200	0%	100%	100%	\$	-	\$	42.595,37	\$	42.595,37	\$	-		
CONSTRUCCION EXTERIOR																			
IMPLEMENTACION A BASE DE PAPEL LUBRIFICADO	M2	15,00	188,32	2824,80	15,00	15,00	0%	100%	100%	\$	-	\$	2.824,80	\$	2.824,80	\$	-		
ACABADO A BASE DE ENGRASE ACABADO FINO	M2	18,00	176,78	3210,64	18,00	18,00	0%	100%	100%	\$	-	\$	3.210,64	\$	3.210,64	\$	-		
COLOCACION DE DIFUSOR PARAMENTACION DE CALDERA	LOTE	1,00	10500,00	10500,00	1,00	1,00	0%	100%	100%	\$	-	\$	10.500,00	\$	10.500,00	\$	-		
ESCUELA MARINA	LOTE	1,00	5970,05	5970,05	1,00	1,00	0%	100%	100%	\$	-	\$	5.970,05	\$	5.970,05	\$	-		
ADREZA																			
LIMPieza GUBERNA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA	M2	47,30	47,26	2045,20	47,30	47,30	0%	100%	100%	\$	-	\$	2.045,20	\$	2.045,20	\$	-		
RETIRO DE ESCORNO PRODUCTO DE LA OBRA	VALE	300	1651,78	5561,34	300	300	0%	100%	100%	\$	-	\$	5.561,34	\$	5.561,34	\$	-		
TOTALES				1.638.357,83									871.563,73		308.555,55		1.257.129,28		351.238,65
													59,20%		23,83%		70,73%		23,27%
																			1.618.357,83



 Ejecutor
 Carlos Vargas
 Arquitecto Vargas Ortega
 Residente de Obra


 Autoriza
 Angel Carlos Vargas
 Supervisor de Obra


 Va. Br.
 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseñador y Construcciones Civiles S A de CV DICISA

FOTOGRAFIA


CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S. A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZAIRCO N° 2427 COL. ZAIRCO		ESTIMACION
PROYECTO:	RI "MODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y LIMPIEZA" Y AREA DE CALDERA, Y BOBENA, DEL LAS ORIGINARIAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	5
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION:	CHIHUAHUA	ALBAÑILERIA:	
		PARTIDA:		SUBPARTIDA:	
CLAVE	CORREPTO				
TEMP: 24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL				

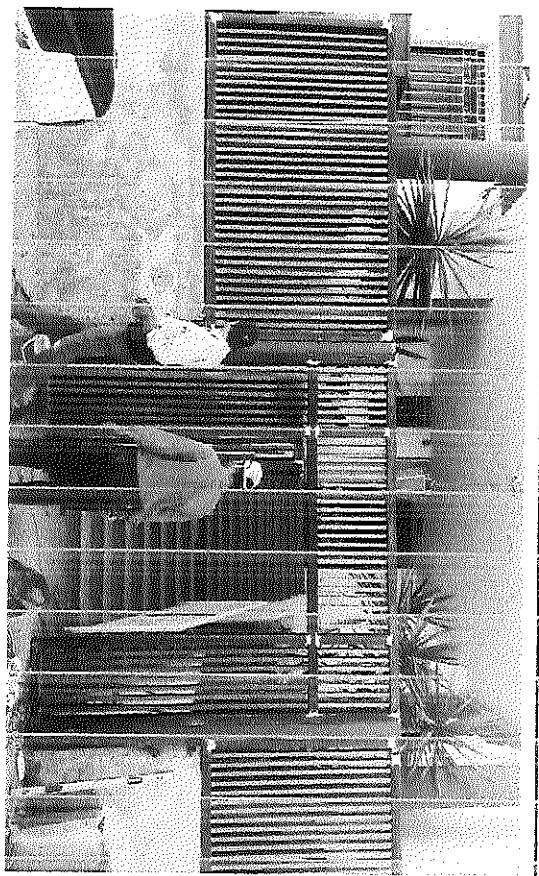


Elaboró

Auto: Ica

V. Bó.



 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Responsable de Obra


 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra


 Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcción Civiles S.A. de C.V. DICS

CRCQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.		DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE ALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS		CIUDAD	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTACTO:	PARTIDA:		CONSTRUCCION EXTERIOR	SUBPARTIDA:	ALBANELERIAS	DEL: 28/04/2020 AL: 15/05/2020
CLAVE	TEMP*24		SUPLIMIENTO Y COLOCACION DE BARANDAL		FECHA:	15/05/2020

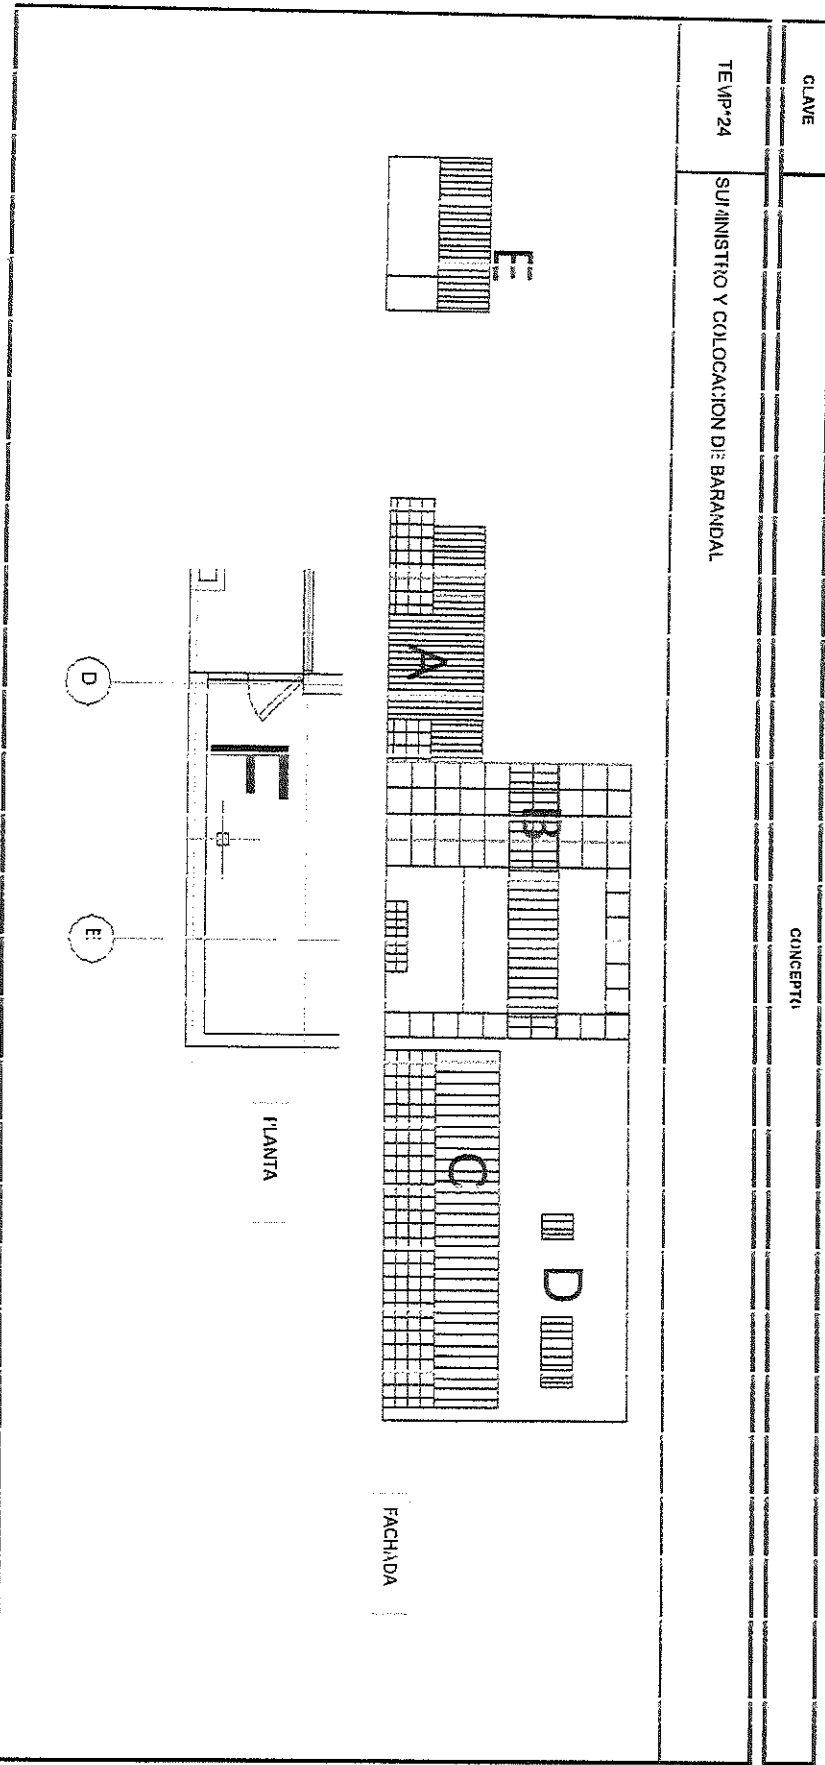

Elaboró

Autorizó

V.o. Bo.

Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega


[Signature]
Arq. Carlos Cijvas Silcero

[Signature]
Ing. José Luis Rodríguez Hernández

CIRCUIOS

CONT. Y ARTISTA:	1 IBEROS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZAICO			ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	Ciudad:	CHIHUAHUA	Municipio:	CHIHUAHUA	5
CONTRATO:	1/A	PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	INTERIOR	HOJA: 2	DEL: 28/04/2020
PARTE:					DE: 2	AL: 15/05/2020
SLAVE:						FECHA: 15/05/2020

1 EMP*3	DESMONTE Y DESCONEXION DE SISTEMAS ELECTRICOS
---------	---

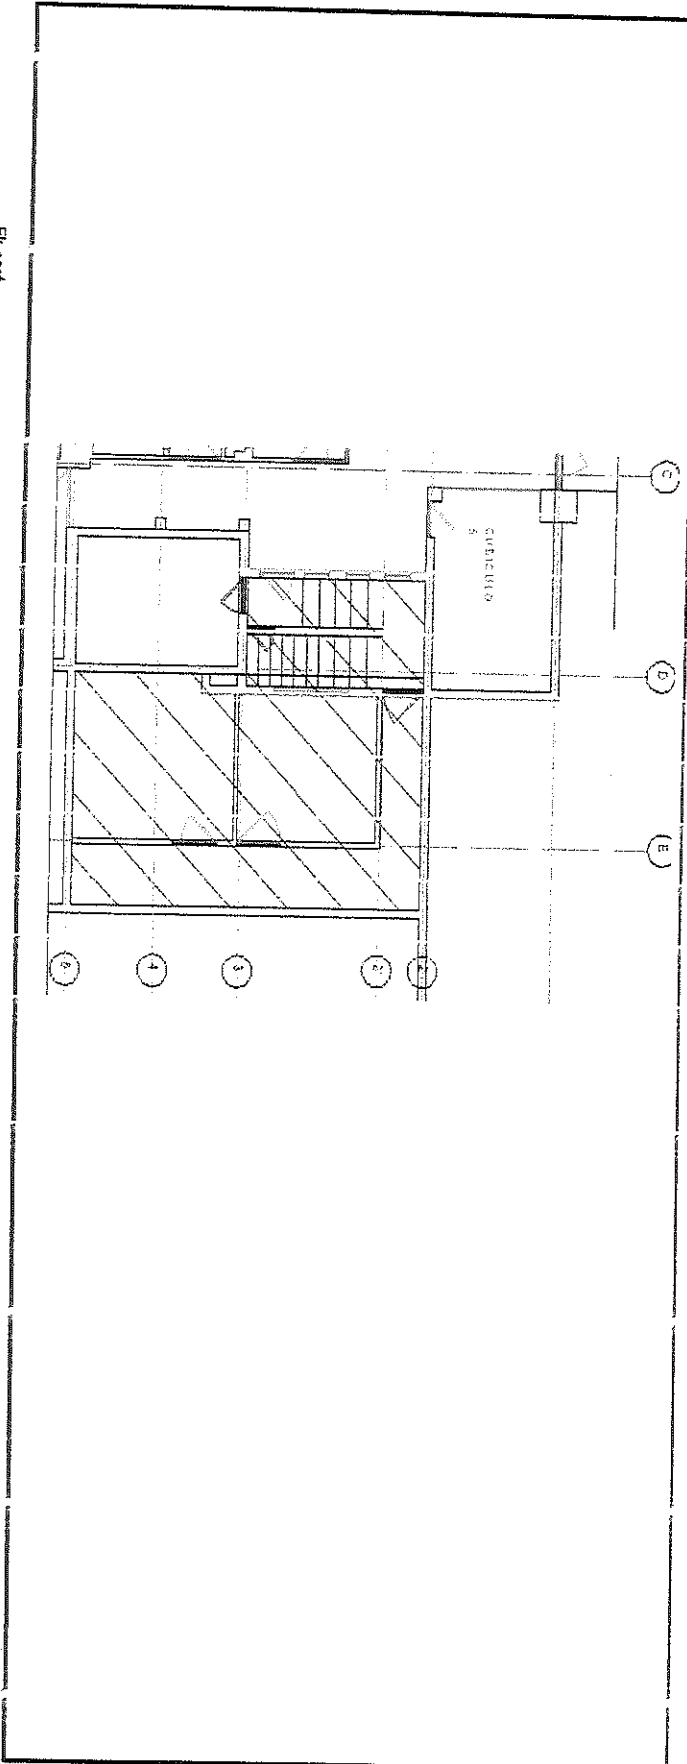

Elaborado

Autorizado

V. Ba.

Carlos Vargas

Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Carlos Clivas Silcodo

Arq. Carlos Clivas Silcodo
Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez


Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DCS

CROQUIS

CONT. DIBUJISTA:	1 SEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZAICO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BOVEDA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUBACEROSORIOS	CUIDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	5
	CONTRATO:	PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	INTERIOR	CHIHUAHUA
	1/A				HOLA: 2
					AL: 15/06/2020
					FECHA: 15/06/2020

CONCEPTO

CLAVE:	T: SMP-12
	QUITAR VENTANA

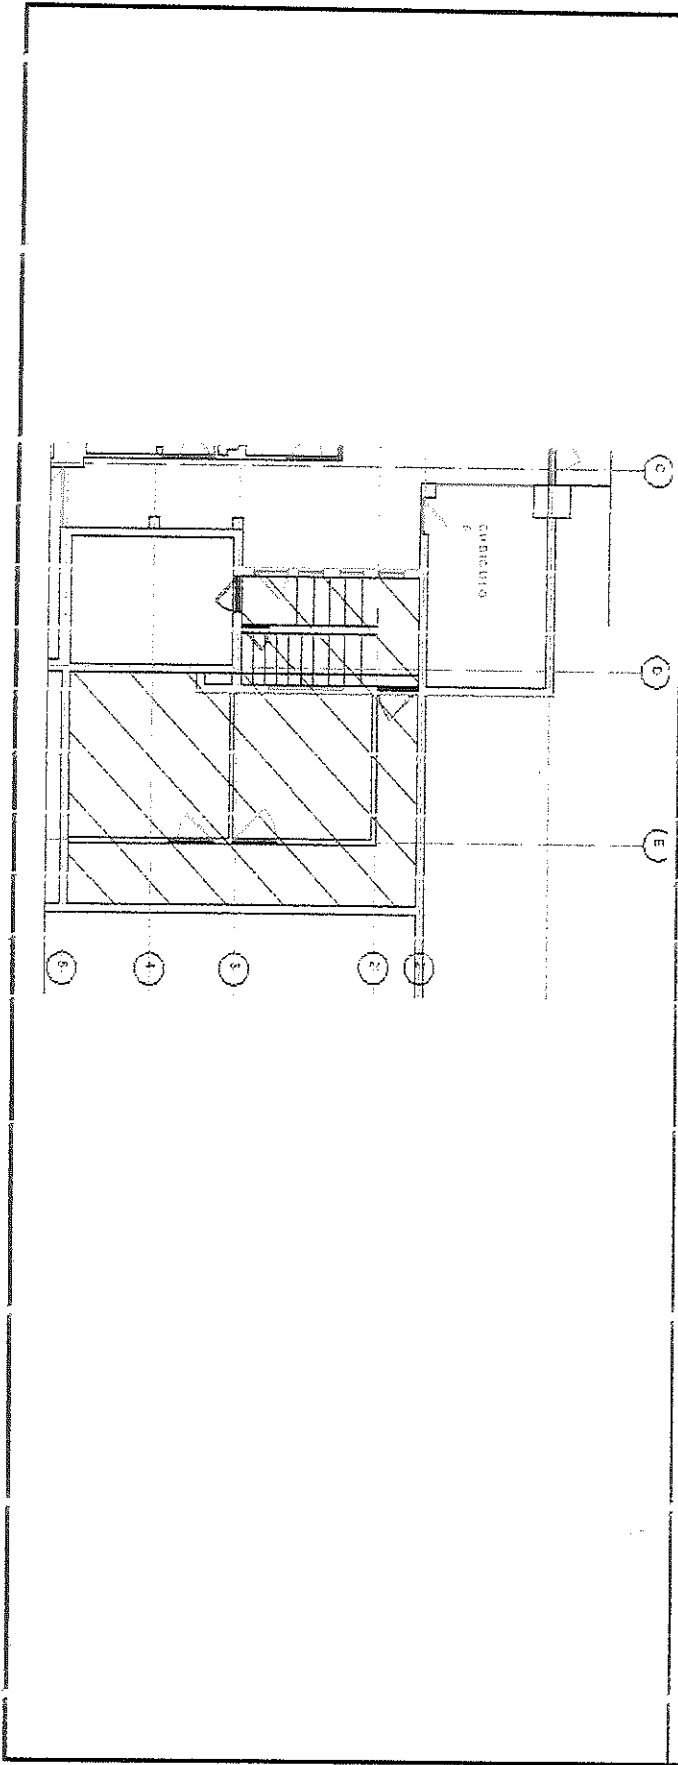

Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra


[Signature]
Arq. Carlos Cifuentes Silcero
Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis R. Irujo Hernandez
Diseños y Construcción Civiles S.A. de C.V. DICS

CROQUIS

CONT. ARTISTA:	I SEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZA... CO		ESTIMACION	5
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BOILERIA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUBACcesorios	Ciudad:	CHIHUAHUA	Municipio:	CHIHUAHUA	DEL: 28/04/2020
CONTRATO:	1/A	PRELIMINARES:	SUPARTIDA:	INTERIOR	HOJA: 3	AL: 15/05/2020
CLAVE:		CONCEPTO:				FECHA: 15/05/2020

T IMP°19 DESMANTELAMIENTO DE CALDERA

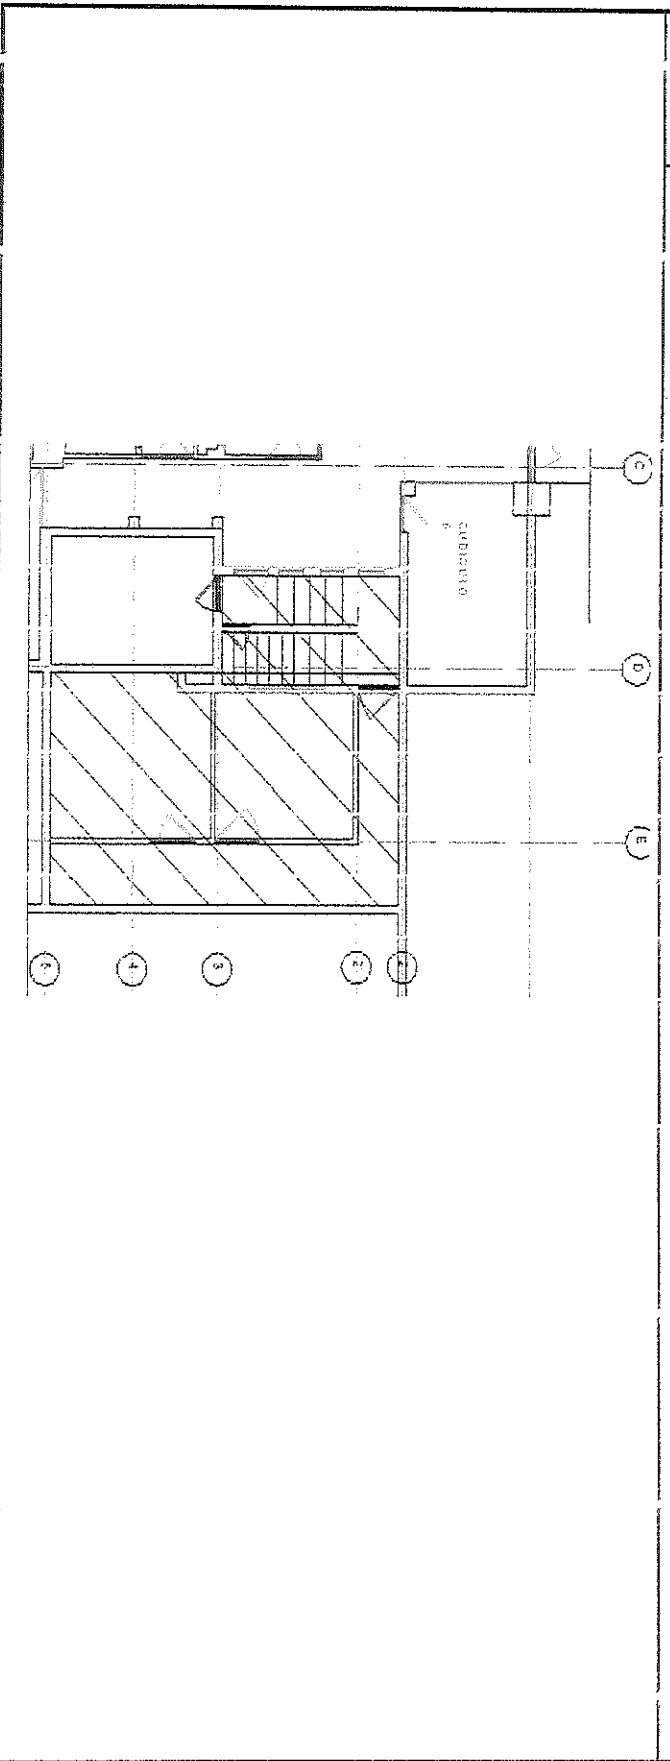

El 30/6

Aulvizo

Vc. Bo.


Carlos Vargas
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
 Arq. Carlos Cifuentes Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis R. Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcción Civiles S.A. de C.V. DICS

FOTOGRAFIA


CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. D.E.C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZAICO			ESTIMACION	5
OBRA N°:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN" Y QUEMAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES SUS ACCESORIOS			ESTADO:	CHIRIQUÍ				
CONTRATO:	N/A			PRELIMINARIS	SUBPARTIDA:				
CLAVE				PAJIDA:	INTERIOR				
				CC INCENT					
TEMP*19	DESMATELAMIENTO DE CALDERA					HOJA: 2		DEL: 28/04/2020	
						DE: 3		AL: 15/05/2020	
						FECHA: 15/05/2020			

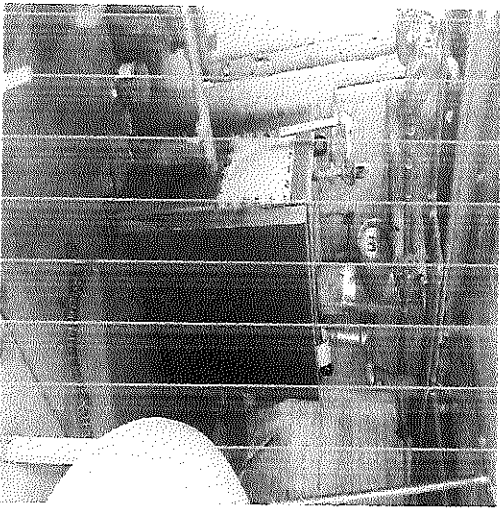


Labor

Autorizo

V. Bo.


 Arq. Carlo Vargas Ortega
 Residente de Obra



 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra


 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcción Civiles S.A de C.V. DICS

CROQUIS

CONT. RATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZAICO		ESTIMACION	5
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE VENTANAS Y QUEJIS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/06/2020
	CON. RATO:	PRELIMINARES:	SUBPARTIDA:	INTERIOR	HOJA: 2	AL: 15/06/2020
	1/A				DE: 2	FECHA: 15/06/2020
PLAVE:		CONCEPTO				

TI MP-002 DEMOLICION DE MUROS DE MALLAS DE TABLA ROCA

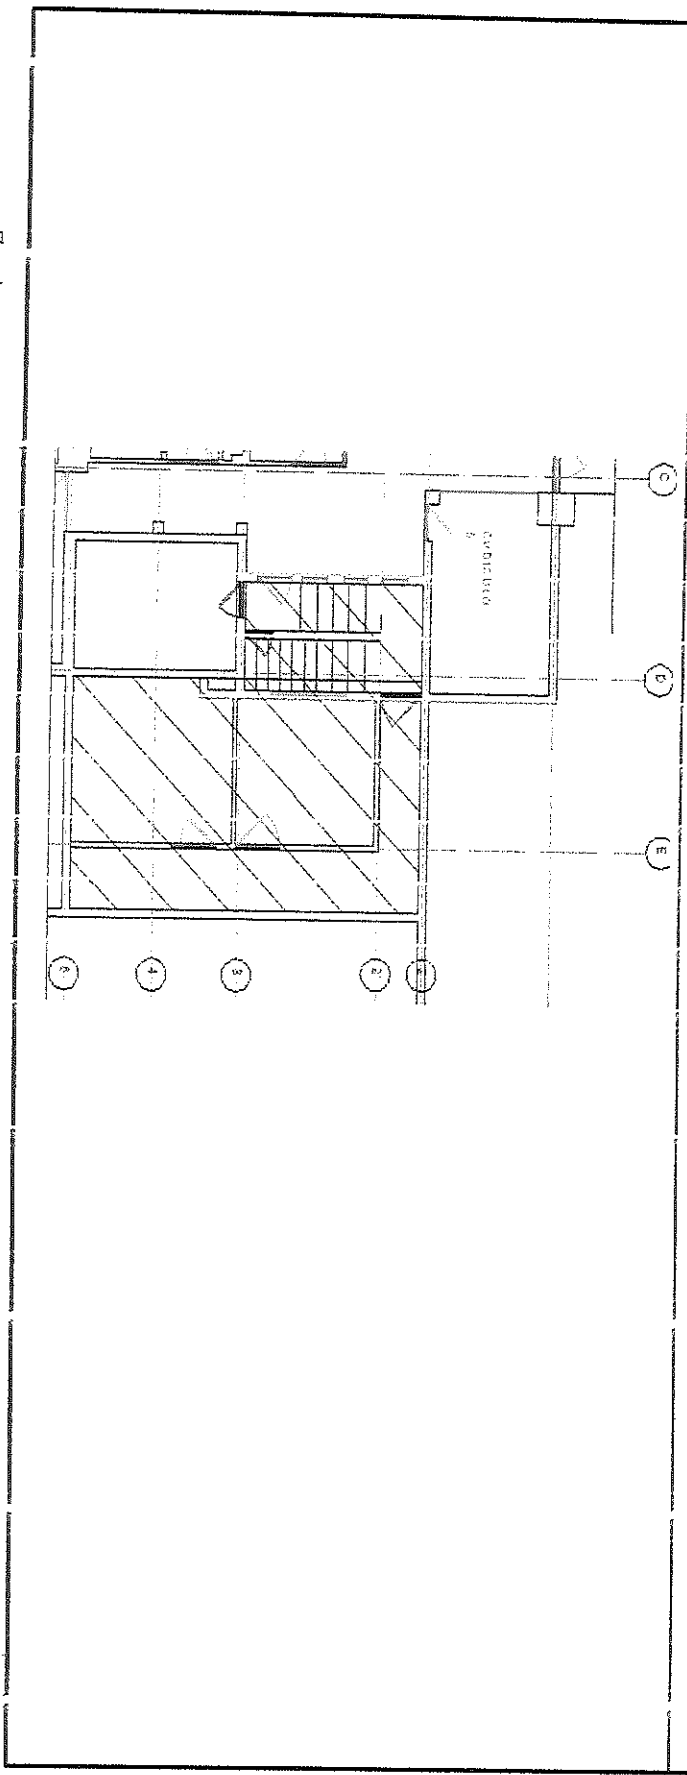

Eli. 30rd

Aut. Nizo

V. Ba.


Carlos Ortega
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
 Arq. Carlos Clivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICS

CRCQUIS

CONT. TATISTA:	I SEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.		DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZAHO		ESTIMACION	5
OBRA	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUBACcesorios		Ciudad	CHIHUAHUA	INICIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/04 2020
	CONTRATO:	1/A	PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	INTERIOR	HOJA: 3	AL: 15/05 2020
PLAVE	RETIRO DE MINISPLIT		CONCEPTO:		DE: 3	FECHA:	15/05 2020

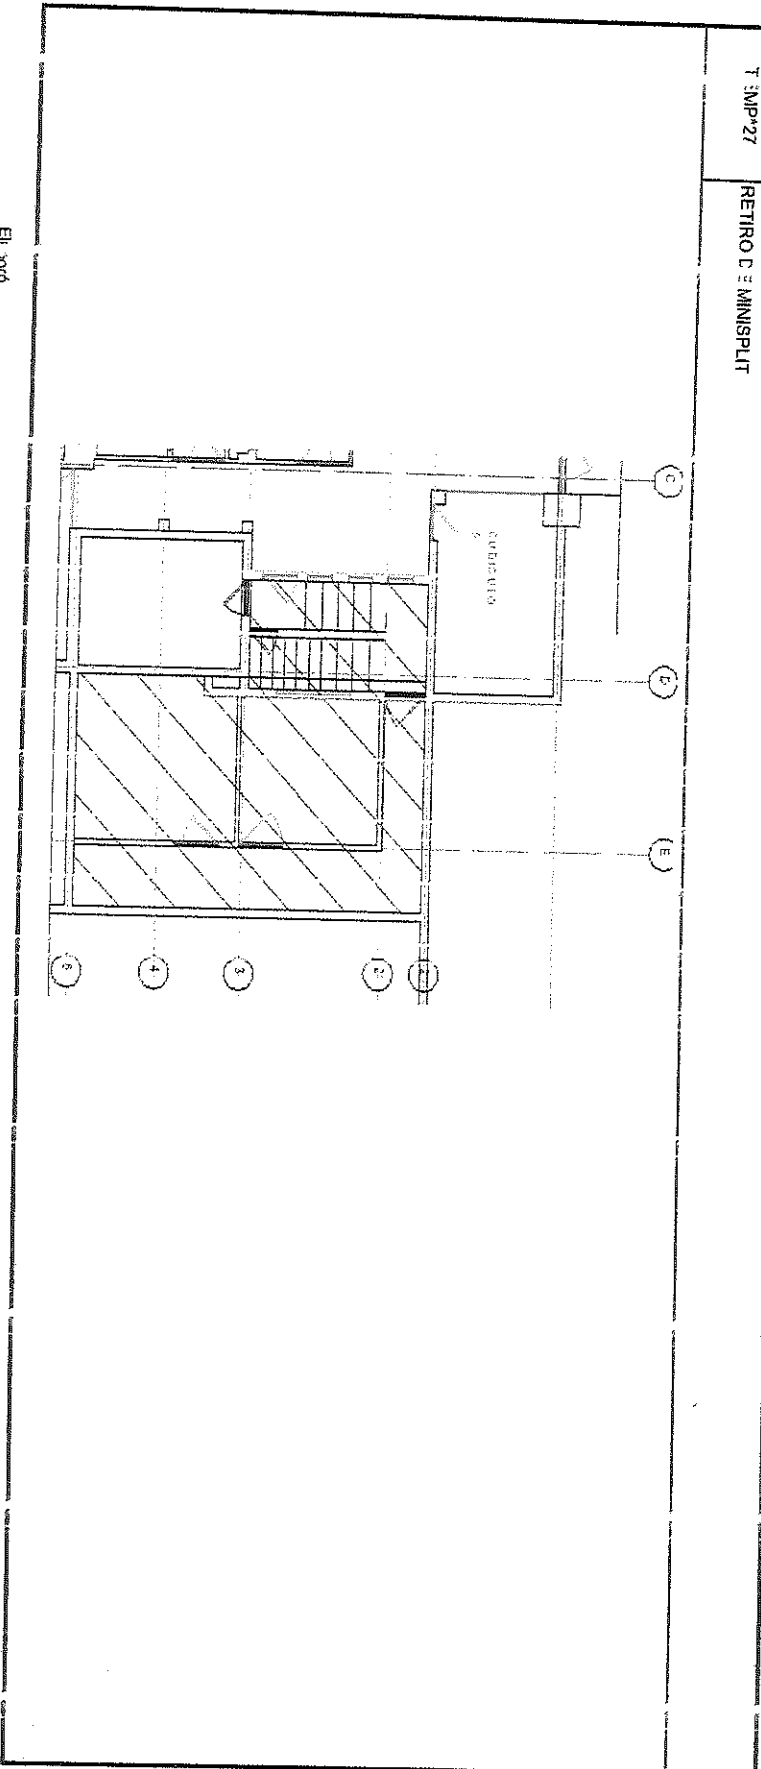

El Jefe

Autorizado

Vi. Bo.


Carlos Vargas
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de la Obra

[Signature]
 Arq. Carlos Cillivare Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis Roldan Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICS I

FOTOGRAFIA

CONTRATO:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. CARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "A TENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BOQUEA, DE LAS ORIGINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	5
	CONTRATO:	PRELIMINARES	SUPARTIDA:	INTERIOR	CHIHUAHUA
	CLAVE:			HOJA: 2	DE: 3
				FECHA:	15/05 2020
CONCEPTO					
TEMP 27	RETIRO DE MANGUILLAS				

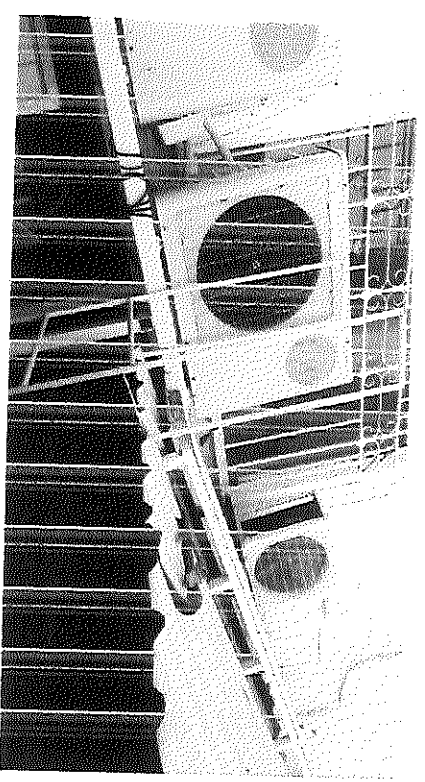

Elaboró

Autorizo

Vt. Bo.

Carlos Vargas
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
 Arq. Carlos Villegas Sánchez
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernández
 Diseños y Construcción: CIVILES S.A. DE C.V. DICSA

CRCQUIS

CONT. RATISTA:	I ISENOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.		DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZAICO		ESTIMACION	5
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS		CUIDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/04/2020
CON. RATO:	1/A	PARTIDA:	PREELIMINARES	SUBPARTIDA:	INTERIOR	HOJA: 2	AL: 15/05/2020
PLAVE:					DE: 2	FECHA:	15/05/2020

1 EMP*4 DESMONTE DE REJAS METALICAS

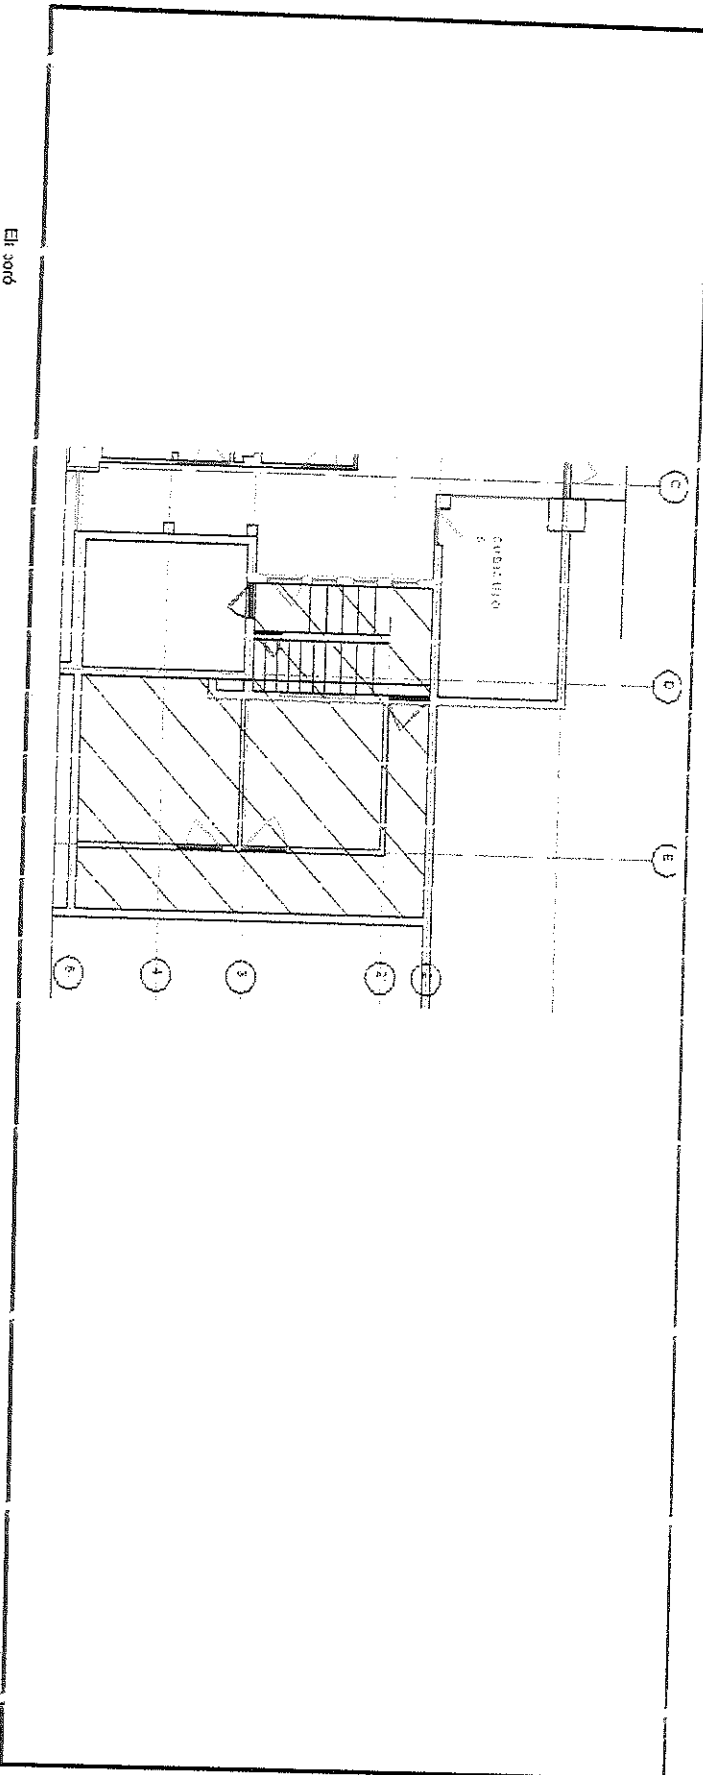

Carlos Vargas
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
 Arq. Carlos Cillaveas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICS

CIRCUIIS

CONT. Y ARTISTA:	I SERENOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO	ESTIMACION	
OBRA	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDEFA Y BODEGA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDAD	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
	CONTRATO:	PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	INTERIOR	HOJA: 3
	1/A				DE: 3
PLAVE					FECHA: 15/01/2020

TEMP#6	DESMONAR TECHUMBRE
--------	--------------------

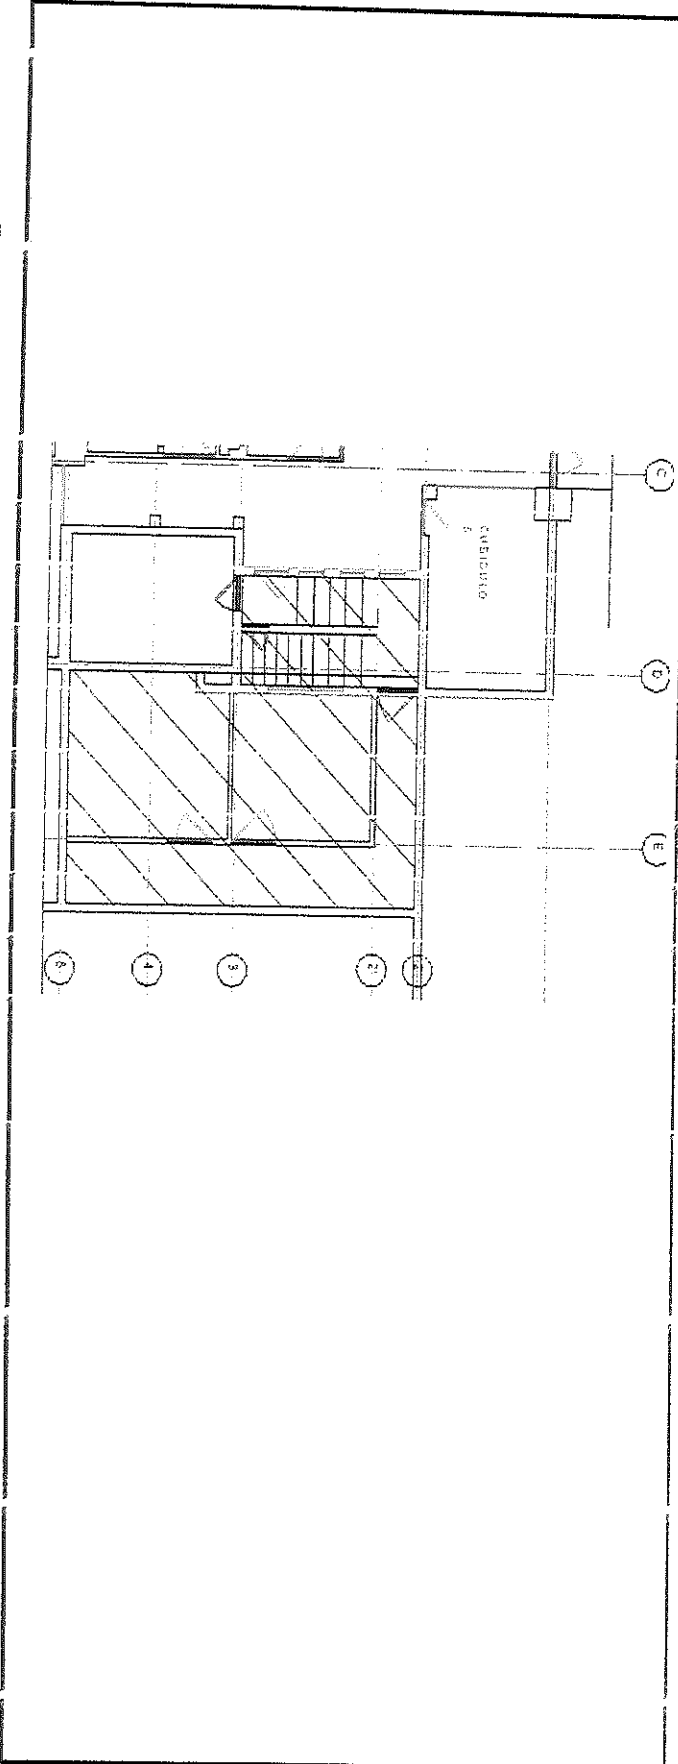

Eli: 2016
Aul: yfzo

Vr. Bo.


Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Arq. Carlos Jivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Ing. Jose Luis Riquelme Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICS I

FOTOGRAFIA


CONTRATO N.º:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. JARCO I# 2427 COL. ZAICO		ESTIMACION
OSRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	5
CONTRATO N.º:		PRELIMINARES	SUPARTIDA:	INTERIOR	CHIHUAHUA
CLAVES:				HOJA: 2	DE: 3
CONCEPTO					
TEMAS:	DESMONTAR ECHUMBRE				

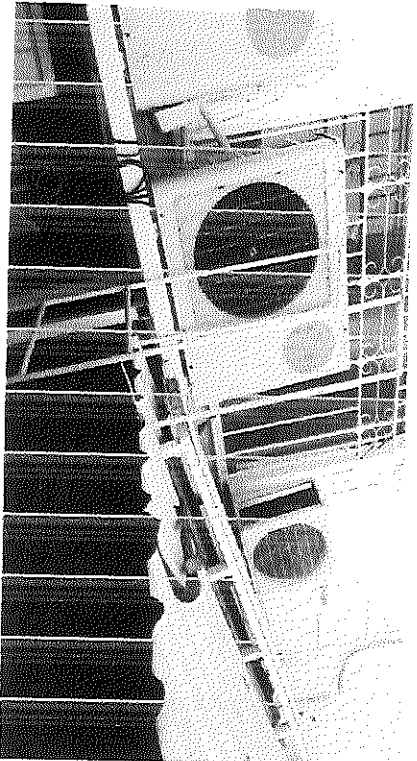



Elaboró

Autorizo

Vr. Bo.


Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra



Arq. Carlos Jilvas S. Jilado
 Supervisor de Obra


Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICE 1

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	5
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/04/2020
CONTRATO:				PREFINANES	SUBPARTIDA:	MUNOS, DALAS Y CASTILLOS	HOLA: 2	AL: 15/05/2020
N/A				PARTIDA:			DE: 3	FECHA: 15/05/2020
CONCRETO								
CLAVE								

LOSA CARC LOSA DE CONCRETO DE CONCRETO

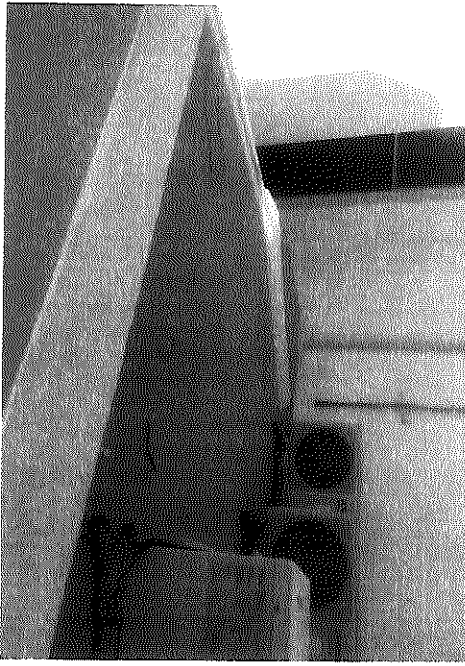

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Arturo Olivas Salcedo
Arq. Arturo Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROCQUIS

CONTRATANTE (A):	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZAHO			ESTIMACION
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DE: AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y HOGERA, EN LAS OFICINAS CENTRALES Y SUBACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	5
CONTRATO:		PREELIMINARES	SUBPARTIDA:	MUROS, DALAS Y CASTILLOS	HUJA: 3	DEL: 28/06/2020
					DE: 3	AL: 15/06/2020
CLAVI:						FECHA: 15/06/2020

LOSAS DE CONCRETO

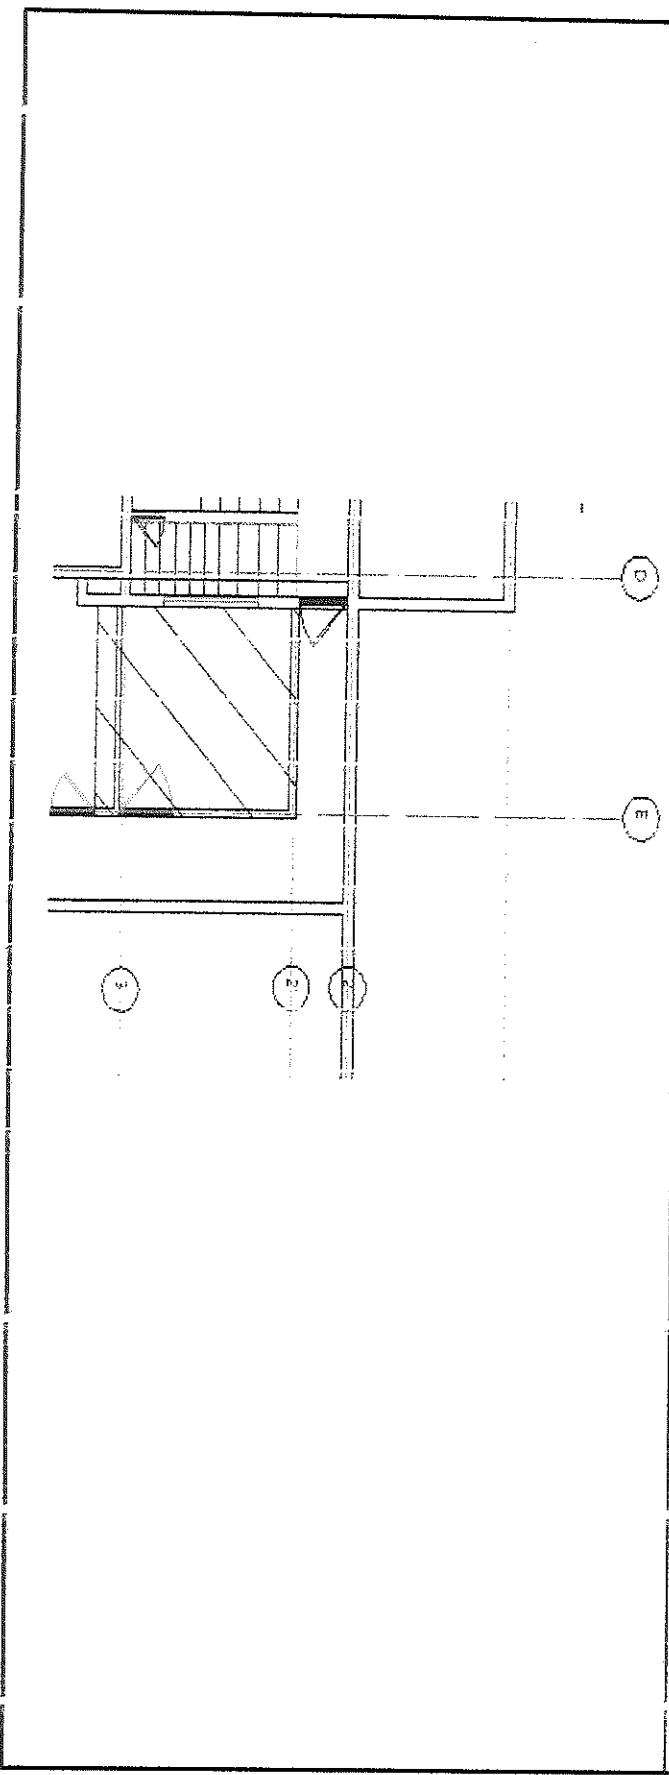

Elaboró

Autorizo

V. Bo.

Carlos Vargas
 Arq. Carlos Vargas Ojeda
 Residente de Obra

Carlos Olivas Salcedo
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcción Civiles S.A. de C.V. DICS

NÚMEROS GENERADORES

CONTRATISTA N°:	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, C.L. ZARCO	ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y REA DE CALDERA Y BOMBEO, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/04/2020
CONTRATO:	N/A	PRELIMINAR:	MUNICIPIO: CHIHUAHUA	AL: 15/05/2020
CLAVE:	CILICPTO	SUBPARTICION:	Muros, Dals y Castillos	FECHA: 15/05/2020
DAL CER: 0-1	DALA DE CERRAMIENTO CONCRETO DE 20 X 20 CM S. ARMADOS CON VRS. DEL #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 21 cms. CONCRETO f'c=200 kg/cm ²	LOGARIZACION:	HOLA: 1	
		EJE EJE: 2 Y 4	DE: 2	
		TRAMO:		
		LARGO:		
		ALCHO:		
		ALTO:		
		CANTIDAD:	12.30	M.
		UNIDAD:		12.30
		TOTAL:		

Elaboró

Autor H20

Vo.Bo

Arq. Carlos Vargas Jiruga
Residente de Obra



Arq. Carlos C. Ivas Salcedo
Supervisor de Obra



Ing. Jose Luis Rodriguez Torandé
Diseños y Construcciones Civiles S A de C.V. DICSA




CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	5
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS GENERALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/04/2020
CONTRATO:		PRELIMINARES	SUBPARTIDA:	MUROS, DALAS Y CASTILLOS	HOJA: 2	AL: 15/05/2020
PARTIDA:				DE: 2	FECHA:	15/05/2020
N/A						

CLAVE	CONCEPTO
-------	----------

DAL CER 20-1	DALA DE CERRAMIENTO CONCRETO DE 20 X 20 cms. ARMADOS CON 4 VRS. DEL #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @20 cms. CONCRETO f'c=200 kg/cm2
--------------	--

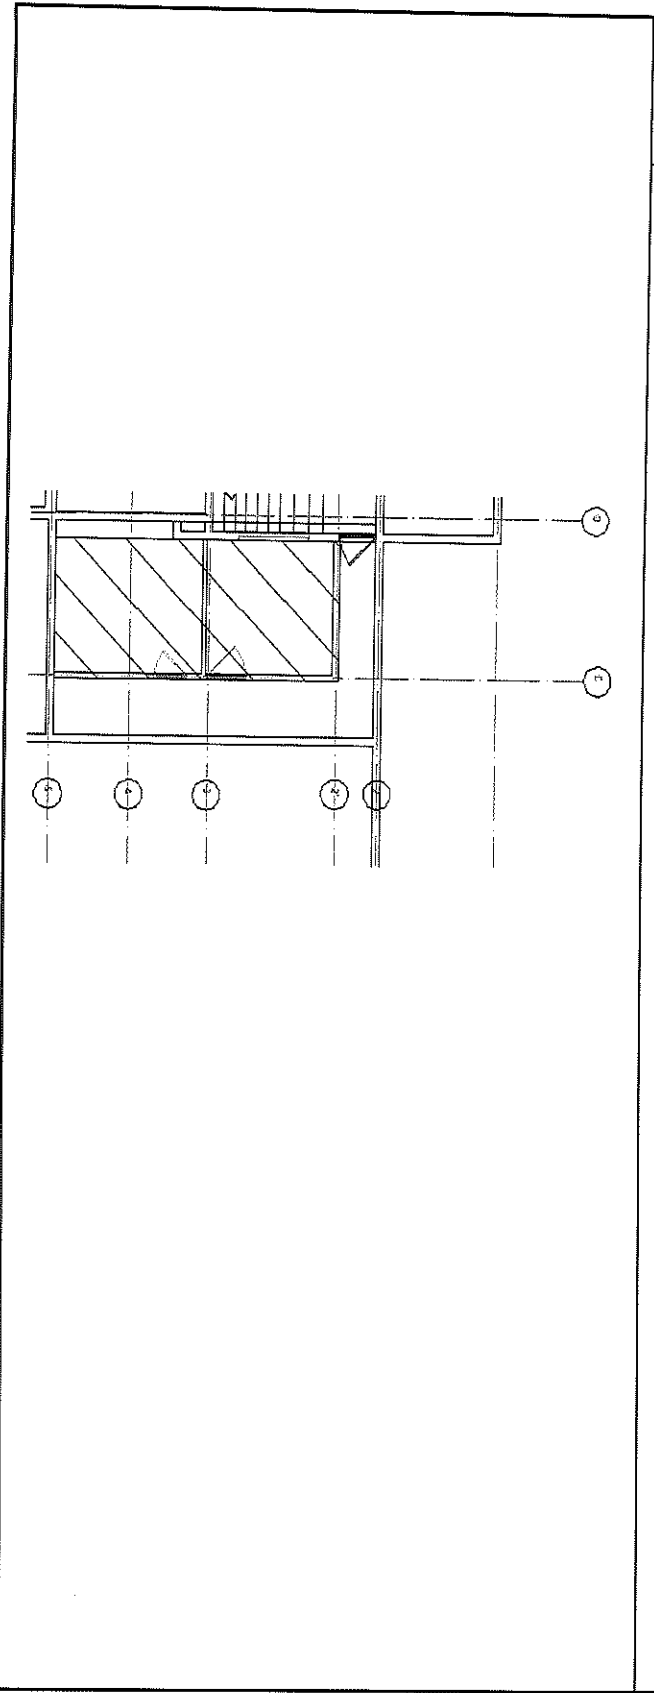

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivares Salcedo
Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodríguez Hernández
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZAHO			ESTIMACION	5	
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA DE LAS OFICINAS GENERALES Y SUS ACCESORIOS			CIUDAD:	CHIHUAHUA			DELI:	28/06/2020	
	CONTRATO:							ALI:	15/06/2020	
	M/A			PAUTIDA:	CONSTRUCCION INTERIOR			HOJA: 2		
CLAVE				DEPARTADA:	ACABADOS			FECHA: 15/06/2020		
CONCERTO										

OBRE MURO TABI: OBRE MURO DE TABI AROCA DE HOJA BLANCA

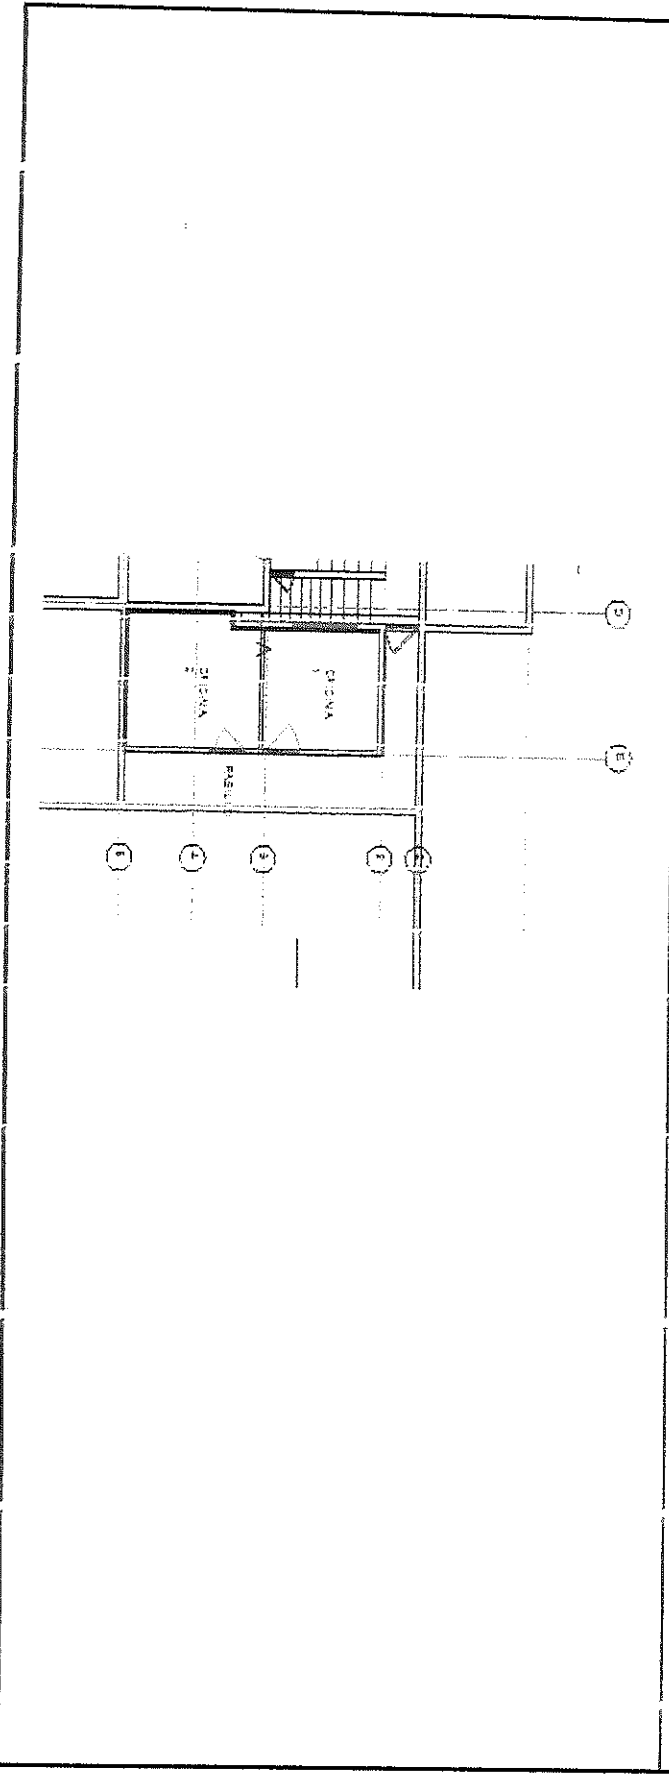

Elaboró

A. Jorizo

Vc. Ba.

Carlos Vargas Ortega
 A. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
 Aro. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis R. Arriaga Hernández
 Diseños y Construcción: Civiles S.A. de C.V. DICS

NÚMEROS GENERADORES

CONTRATISTA:	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, C. 1. ZARCO			ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y REPARACION DE CALDERA Y BOMBAS DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
CONTRATO:	N/A	PARTIDA:	SUBPARTIDA:	ACABADOS	HOLAS DE: 2	DEL: 28/04/2020
CLAVE:	C-INCEPTO	LOCALIZACION:	LARGO:	ANCHO:	ALTO:	FECHA: 15/05/2020
PLANO:	FALSO PLANO A BASE DE CANALISTON Y CAJALETA DE CARGA/SPORTADA CON LA ESTRUCTURA/ESPACIADA @2	D Y E:	3.80	1.63	29.10	UNIDAD: m ²
						TOTAL: 29.10

Elaboró

Autorizó

Va.Bo

Carlos Vargas Xiega
Atq. Carlos Vargas Xiega
Residente de Obra


[Signature]
Atq. Carlos C. Vas Salcedo
Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. José Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DCSA.

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S. A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZAICO	ESTIMACION	5	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATINGION Y QUEJAS" Y AREA DE ALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUB-ARTIDA:	ACABADOS	DE: 2	
	N/A				HOJA: 2	
CLAVE	CONCEPTO				FECHA:	15/05 2020

PLAFON H VERD PLAFON A BASE I E CANAL LISTON Y C: MALETA DE CARGA IMPORTADA DE LA ESTRUCTURA ESPACIADA @24"

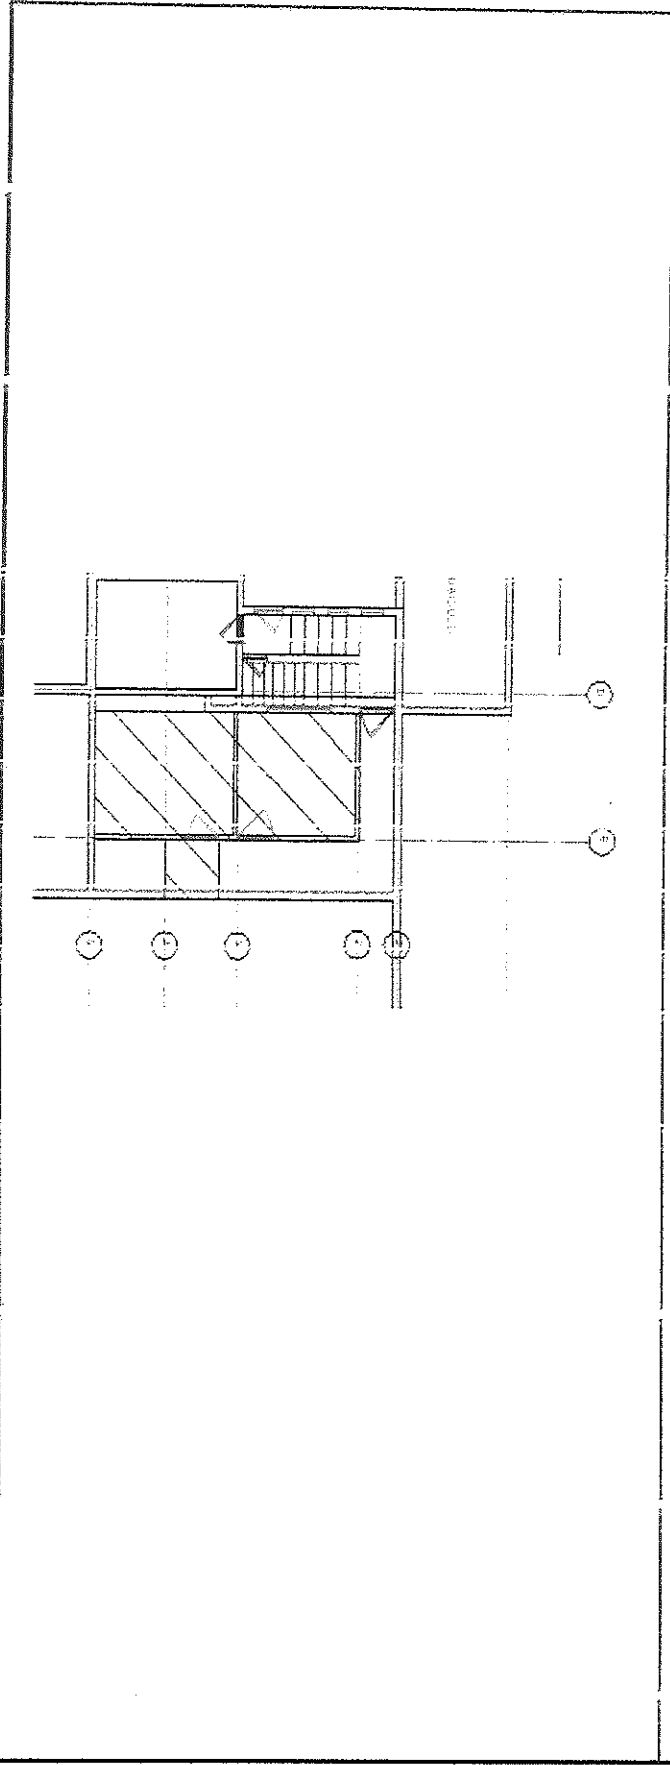

Elaboró

Autorizo

Vé Bn.


Carlos Vargas
 Atq. Carlos Vargas Ortega
 Responsable de Obra

[Signature]
 Atq. Carlos Olivares Salas
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Inq. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones: CIVILES S.A DE C.V. DICE 1

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE ZARCO N° 2427, C.O. ZARCO		ESTIMACION	5
CONTRATO:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BOILERIA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/04/2020
CLAVE:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	TRABAJOS EN BAÑO	HOLA: 2	AL: 15/05/2020
PUERT 1				DESCONTAR PUERTA EXISTENTE E INSTALAR PUERTA NUEVA DE MADERA		FECHA: 15/05/2020

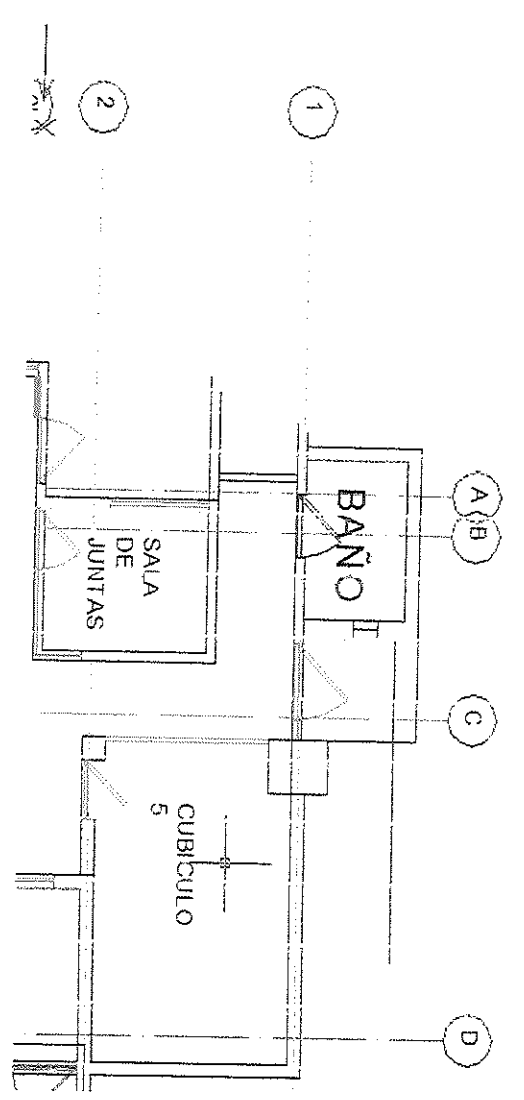

Elaboró

Autorizo

Vr. Ba.


Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis R. Rodriguez Hernández
Diseños y Construcción: CIVILES S.A. de C.V. DICS

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO		
CLAVE:	PUERTA DE 90'22C Y FILOC LATERAL DE 36'220 EN ALUMINIO DE 2° G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	CUIDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	SAUDA AUDITORIO	HOJA: 2
					DE: 2
					ESTIMACION
					5
					DEL: 28/04 2020
					AL: 15/02 2020
					FECHA: 15/02 2020

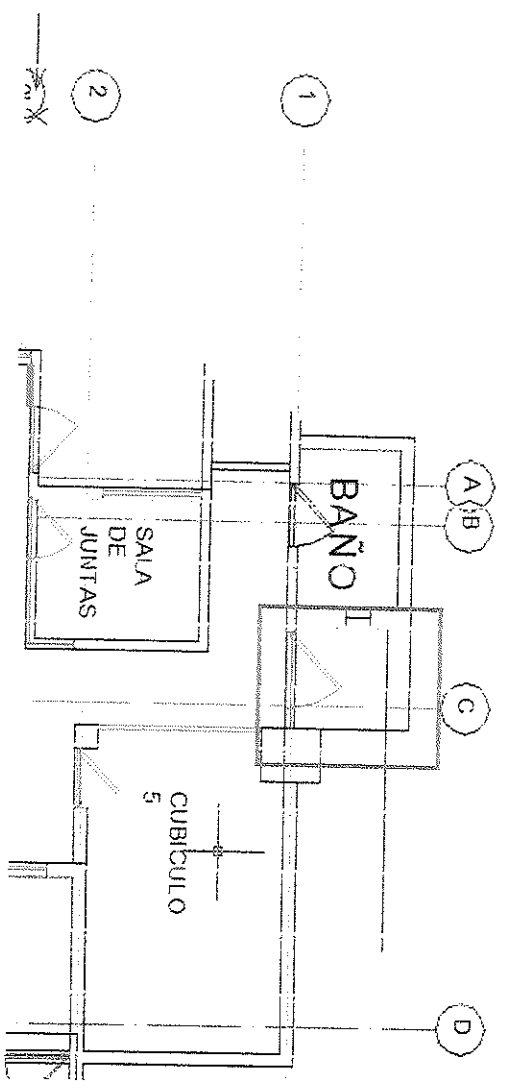

Elaboró

Autorizo

Vi. Bo.

Carlos Vargas
 Arq. Carlos Vargas Orta
 Responsable de Obra


[Signature]
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcción: CIVILES S.A. de C.V. DICS 1

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO			ESTIMACION	5
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	28/04/2020
	CONTRATO:			COSTRUCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ESCALERAS		AL:	15/05/2020
	M/A	PARTIDA:						FECHA:	15/05/2020
CLAVE	CONCEPTO								

PUERTAS 3 SU MINISTRO DE PUERTAS CON REJILLAS INFERIORES



Elaboró

Autorizo

V. Bo.


[Signature]
 Arq. Carlos Vargas Ortiga
 Responsable de Obra

[Signature]
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcción Civil S.A. de C.V. DICS

CROQUIS

CONTRUCTISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODILGA DE LAS ORQUINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ESCALERAS	DE: 3
CI AVE					FECHA: 15/05/2020
CONCEPTO					
PUNTO 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINADA PARA EXTERIOR				

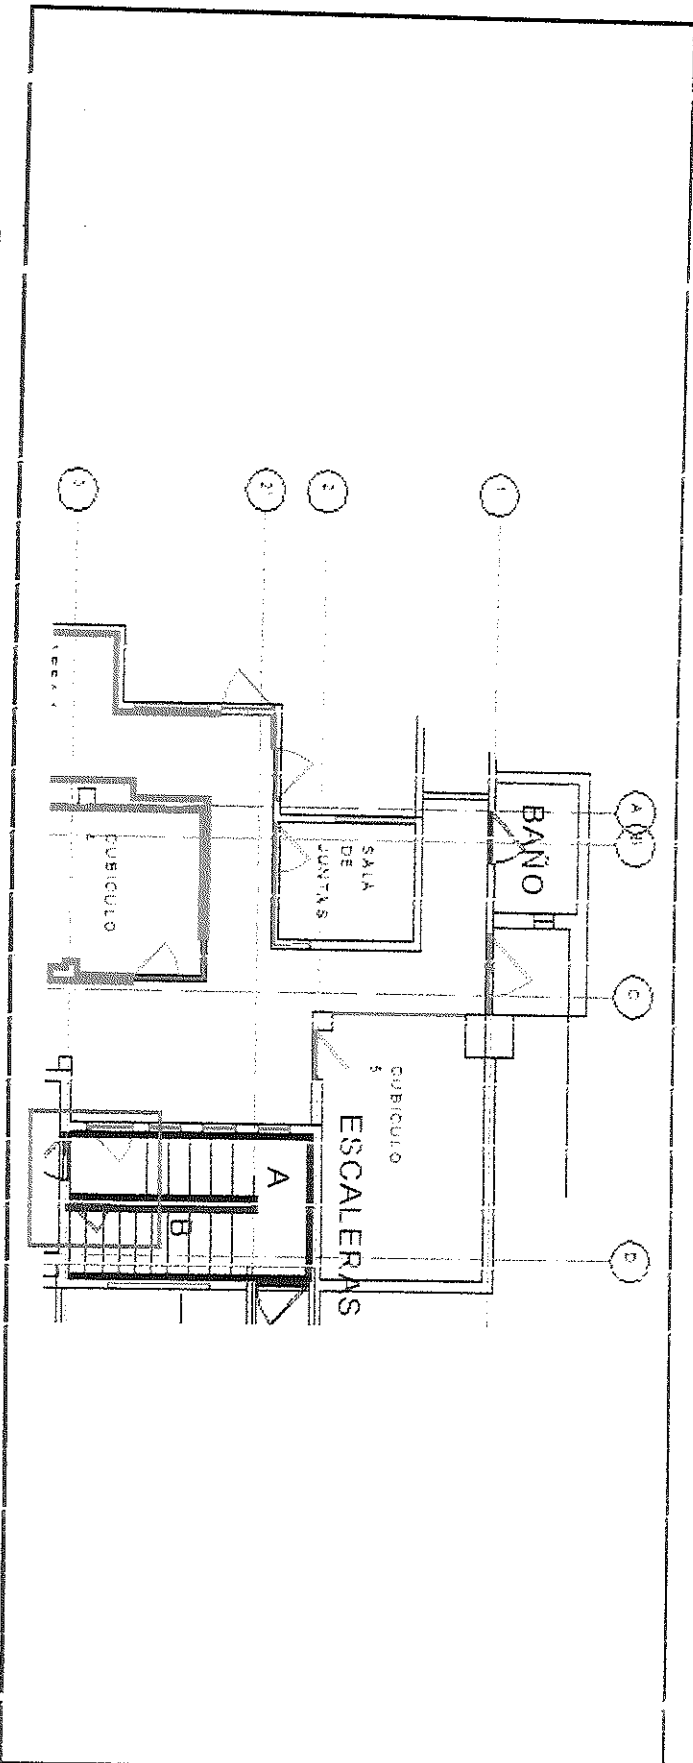

Elaborado por:

Autorizo:

Ve Bo.

Arq. Carlos Va gas Ortega
Residente de Obra

Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICS

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.		DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	5		
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS		ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	28/06/2020	
	CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ESCALERAS	HOJA:	2	AL:	15/06/2020
						DE:	3	FECHA:	15/06/2020
CLAVE	COVICENTO								

PUERT 4	SUMINISTRO Y COLCACION DE PUERTA AMINADA PARA EXTERIOR
---------	--



Elaboró

Autorizo

Vt. Bo.

Carlos Vargas
 Ing. Carlos Vargas Orfida
 Residente de Obra


[Signature]
 Atq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis R. Rodriguez Hernández
 Diseños y Construcción: Civiles S.A. de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTR. LISTA:	DIS EÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	5
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTR. T.O.:	N/A	PARTIDA:	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ESCALERAS
CI AVE				ESCALERAS	DE: 3
					HOJA: 3
					AL: 15/02/2020
					FECHA: 15/02/2020
					CON SEPTO

VENI ESC 1 SUMINISTRADO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2.00 X 1.00 DE VIDRIO DE 6MM.

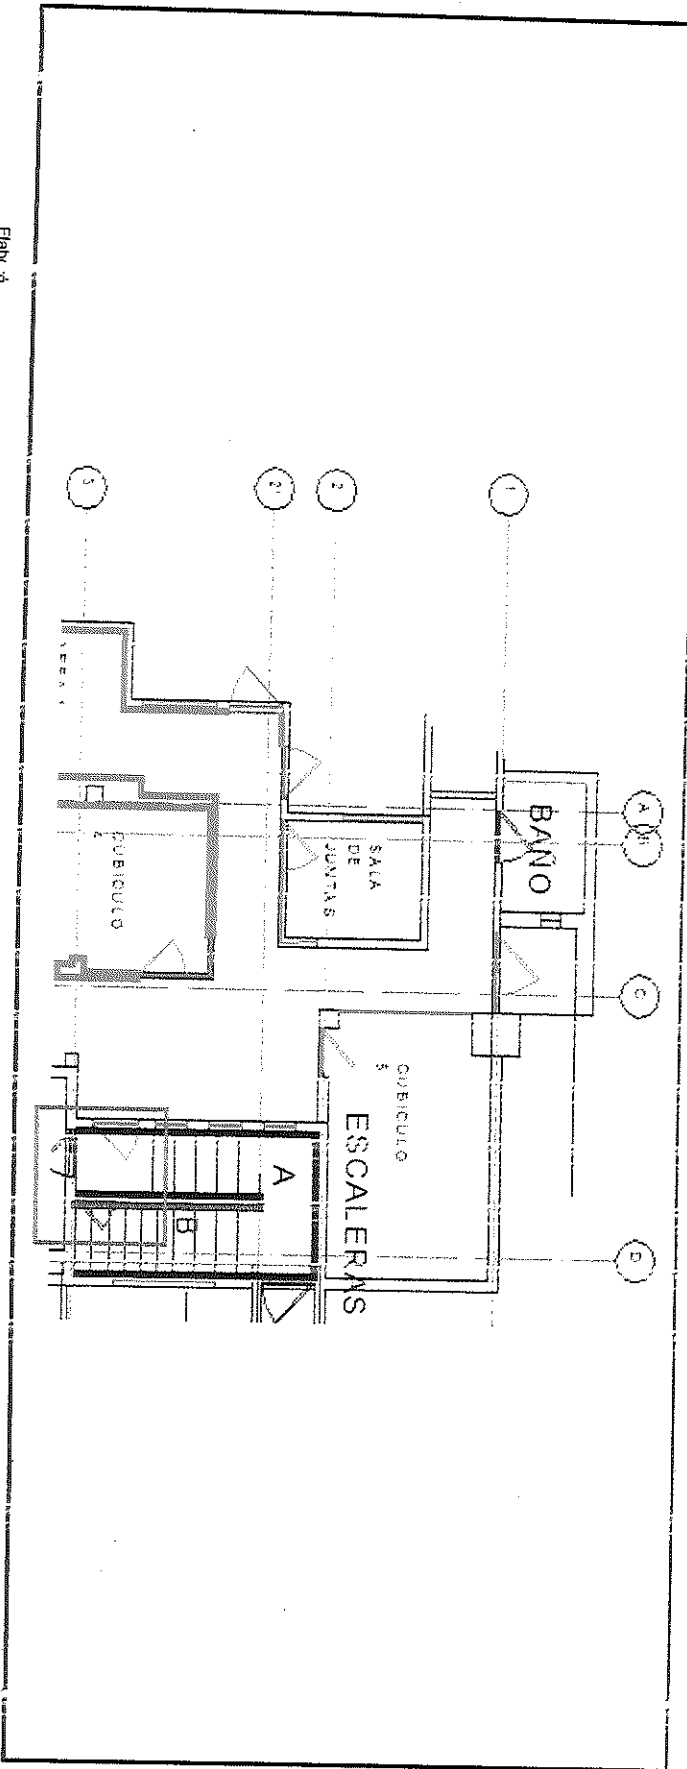

Elaboro

Autorizo

Vo. Bo.


Carlos Vergara
 Arq. Carlos Vañes Ortega
 Residente en Obra

[Signature]
 Arq. Carlos Ojeda Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICS

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S. A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BOILERIA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA		5
CONTRATO:		CONSTRUCCION	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
		INTERIOR	ESCALERAS		
CLAVE:		PARTIDA:	SUBPARTIDA:	HOLA: 2	DEL: 28/04/2020
				DE: 3	AL: 15/06/2020
					FECHA: 15/06/2020
COPIEPTO					
VENTANA: 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2.00 X 1.00 DE VIDRIO DE 6MM				

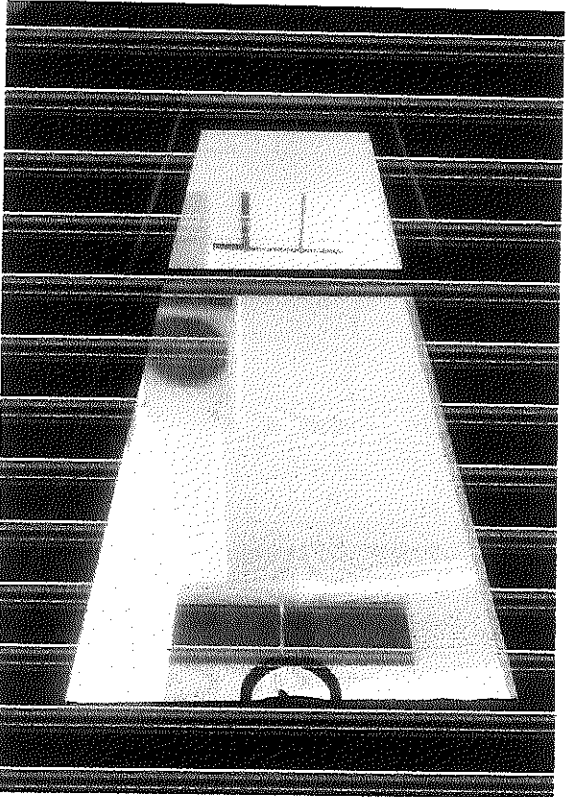

Elaboró

Autorizo

M. B.


Carlos Vargas C.
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de obra

[Signature]
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. José Luis R. Velázquez Hernández
 Diseños y Construcción Civiles S.A. de C.V. DICS

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONTROLACIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AV. ZARCO N° 2417, COL. ZAICO		ESTIMACION	5
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALIERA Y BODEGAS, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
CONTRATO:		CANCELERIA	SUBPARTIDA:			
CLAVE	N/A	PARTIDA:				
		CONCRETO				
TEMP:34	FA BRIGACION DE MUEBLE PARA RECEPCION DE MADERA DE MDF ACABADO MELAN MADO, MURO Y PLAFON DE MDF, PISO DE ALUMINIO DE 2" CON VITRINO DE GMA					

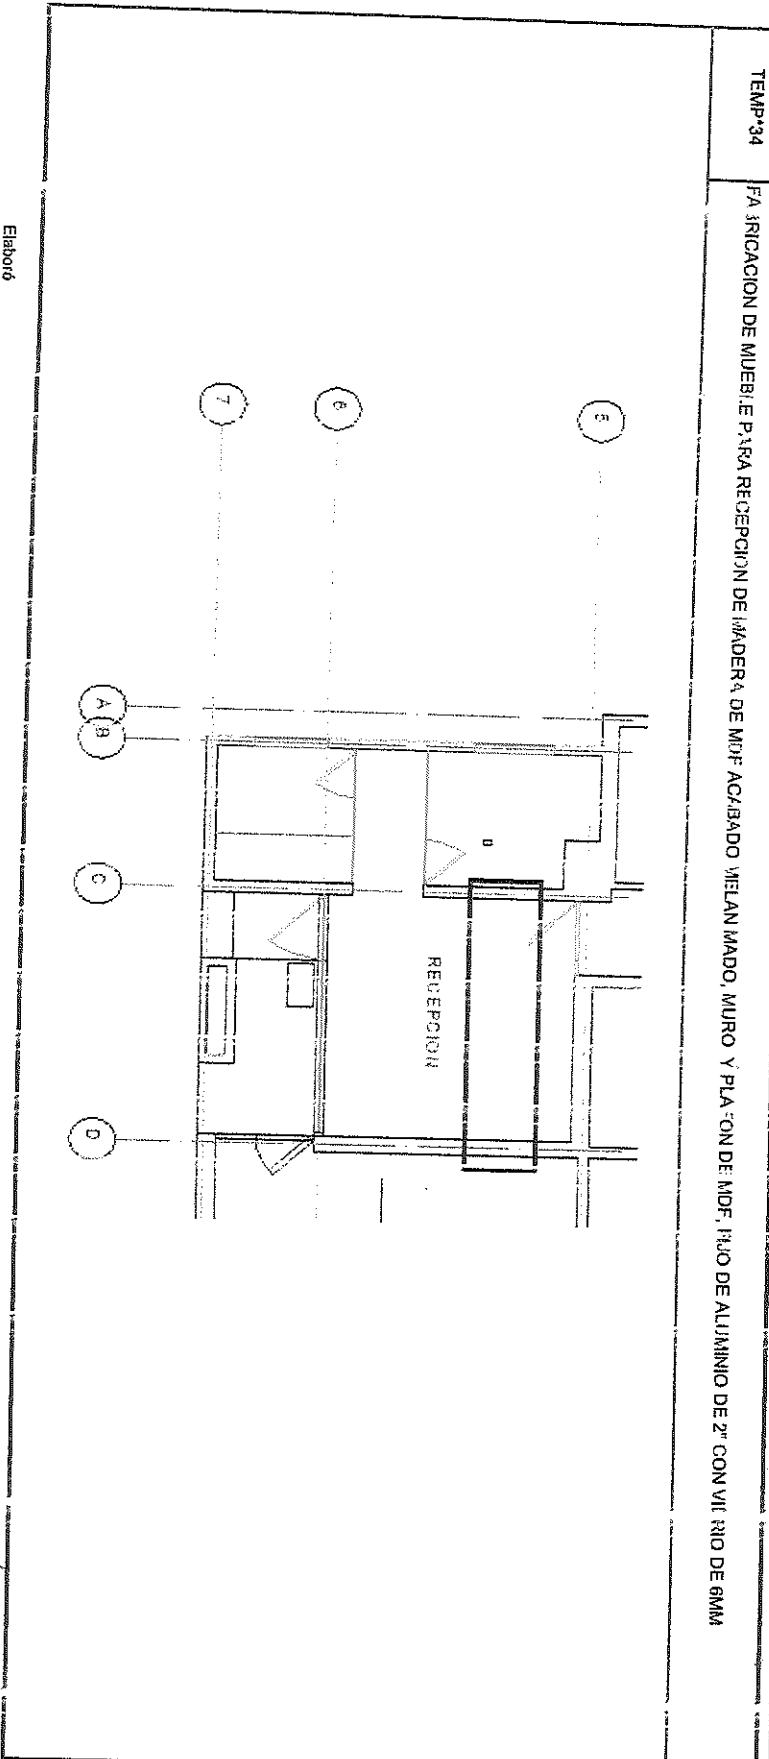

Elaboró

Autorizo

V. Ba.

Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega


[Signature]
Arq. Carlos Olivares Salcedo

Ing. Jose Luis R. Valenzuela Hernández

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZAHO		ESTIMACION
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE ALDERA Y BODEGA DE LAS ORQUINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	5
	CONTRATO:		CHIHUAHUA		DEL: 28/04/2020
	N/A	PARTIDA:		ACABADOS	AL: 15/02/2020
					FECHA: 15/02/2020
CLAVE	CONCEPTO				

MURO DUROCK MUÑO DE DUROCK 2 CALZAS

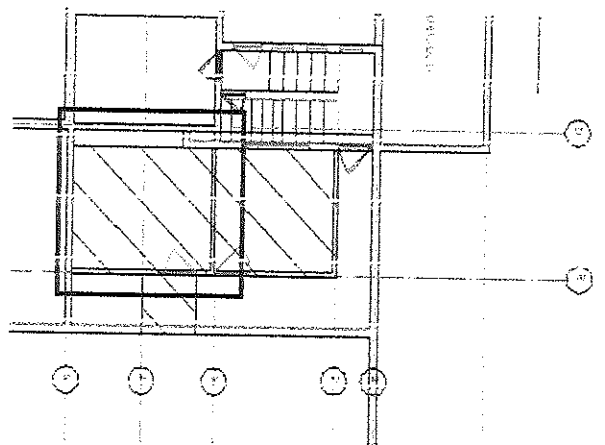

Elaboró

Autorizo

Vr. Ba.

Carlos Vargas Ortega
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Gerente de Obra


Carlos Olivas Salgado
 Arq. Carlos Olivas Salgado
 Supervisor de Obra

José Luis R. Arriaga Hernández
 Ing. José Luis R. Arriaga Hernández
 Diseños y Construcción: Civiles S.A. de C.V. DICS

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	5
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	DE: 2	FECHA: 15/05/2020
CONCRETO						

ASLANT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASLANTE R11 DE FIBRA DE VIDRIO
--------	---

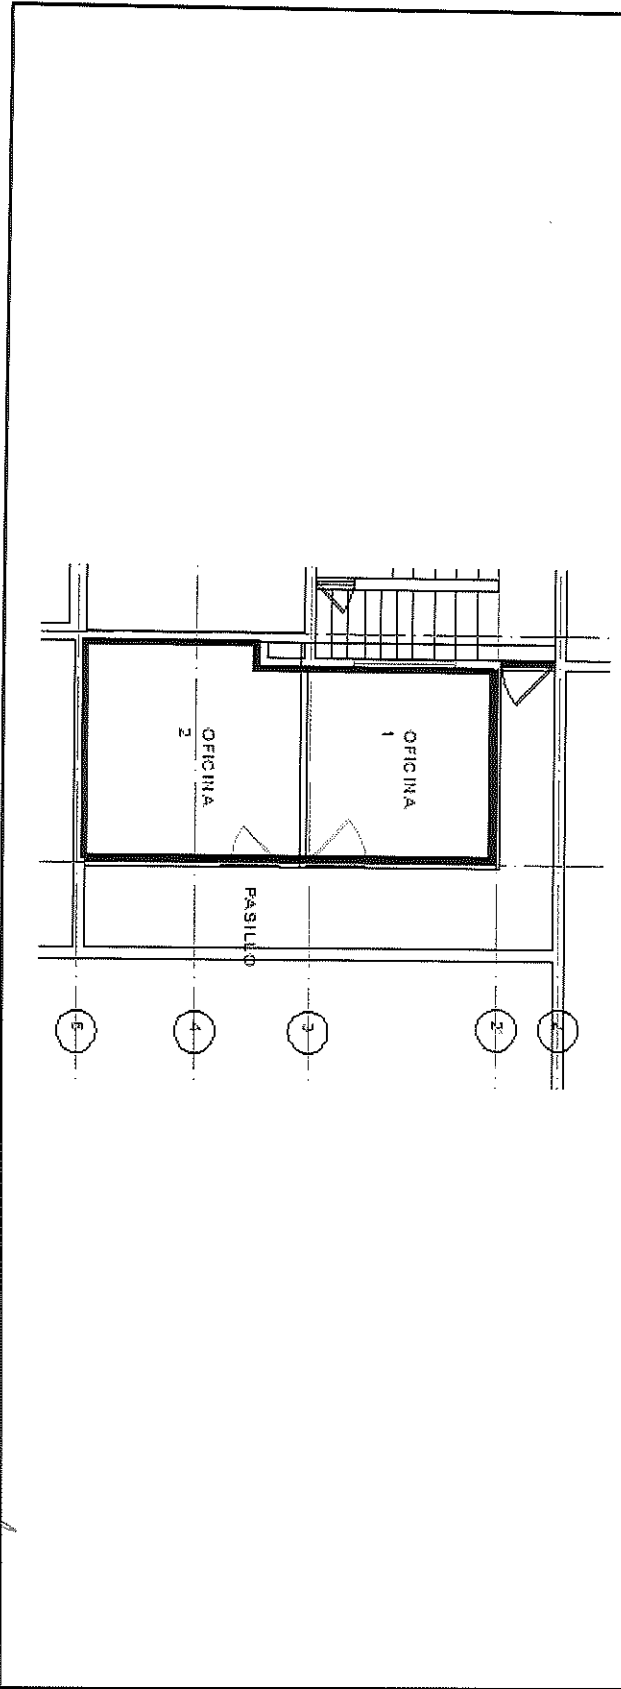

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.


Carlos Vargas Ortega
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Olivares Salcedo
 Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CRCQUIS

CONT. RATISTA:	ISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZAICO		ESTIMACION
OBRA	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUELIS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDAD	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	5
	CON. RATO:	CONSTRUCCION INTERIOR	CHIHUAHUA	ACABADOS	DEL: 28/02 2020
	1/A	PARTIDA:			AL: 15/02 2020
PLAVE					FECHA: 15/02 2020
CONCEPTO					
0	REMODELACION DE PISOS EXISTENTES				

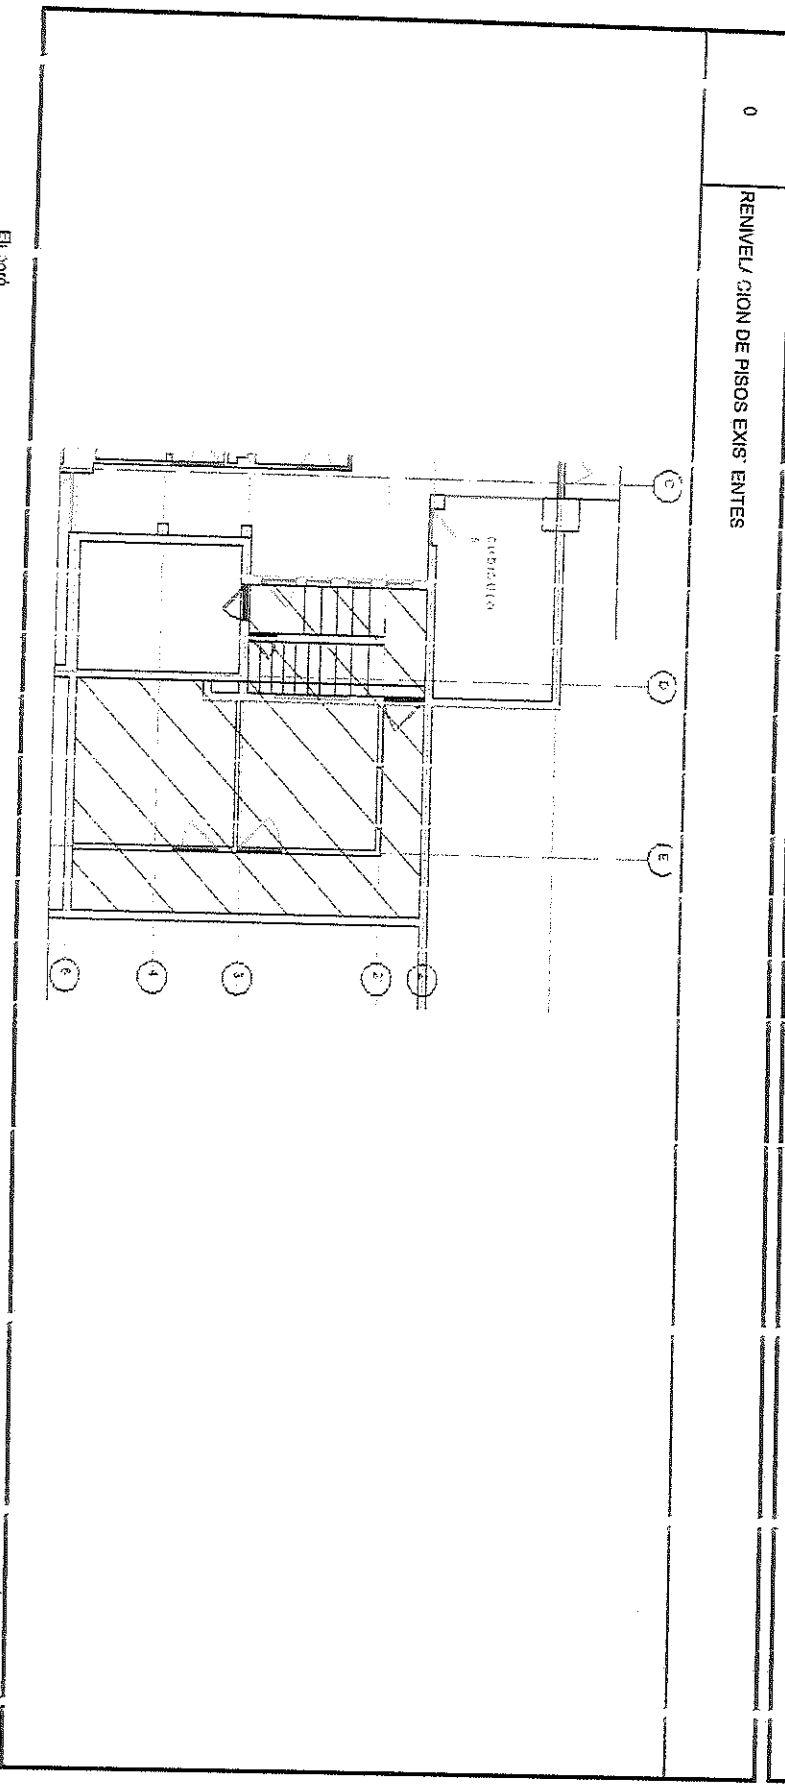

El: 30/01

Autorizo

Vr. Bo.

Carlos Vargas O.
 Arq. Carlos Vargas Océaga
 Residente de Obra


[Signature]
 Arq. Carlos Alvaras Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis R. Arriaga Hernandez
 Diseños y Construcción Civiles S.A de C.V. DICS 1

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZAICO
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "A" TERCIO Y QUE. AS" Y AREA DE CALDERA Y BOJEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	IA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CLAVE:	PARTIDA:	ACABADOS	HOJA: 2
			DE: 3
CONCEPTO			
CERAMICANVAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA			

ESTIMACION	5
DEL:	28/04 2020
AL:	18/05 2020
FECHA:	15/05 2020

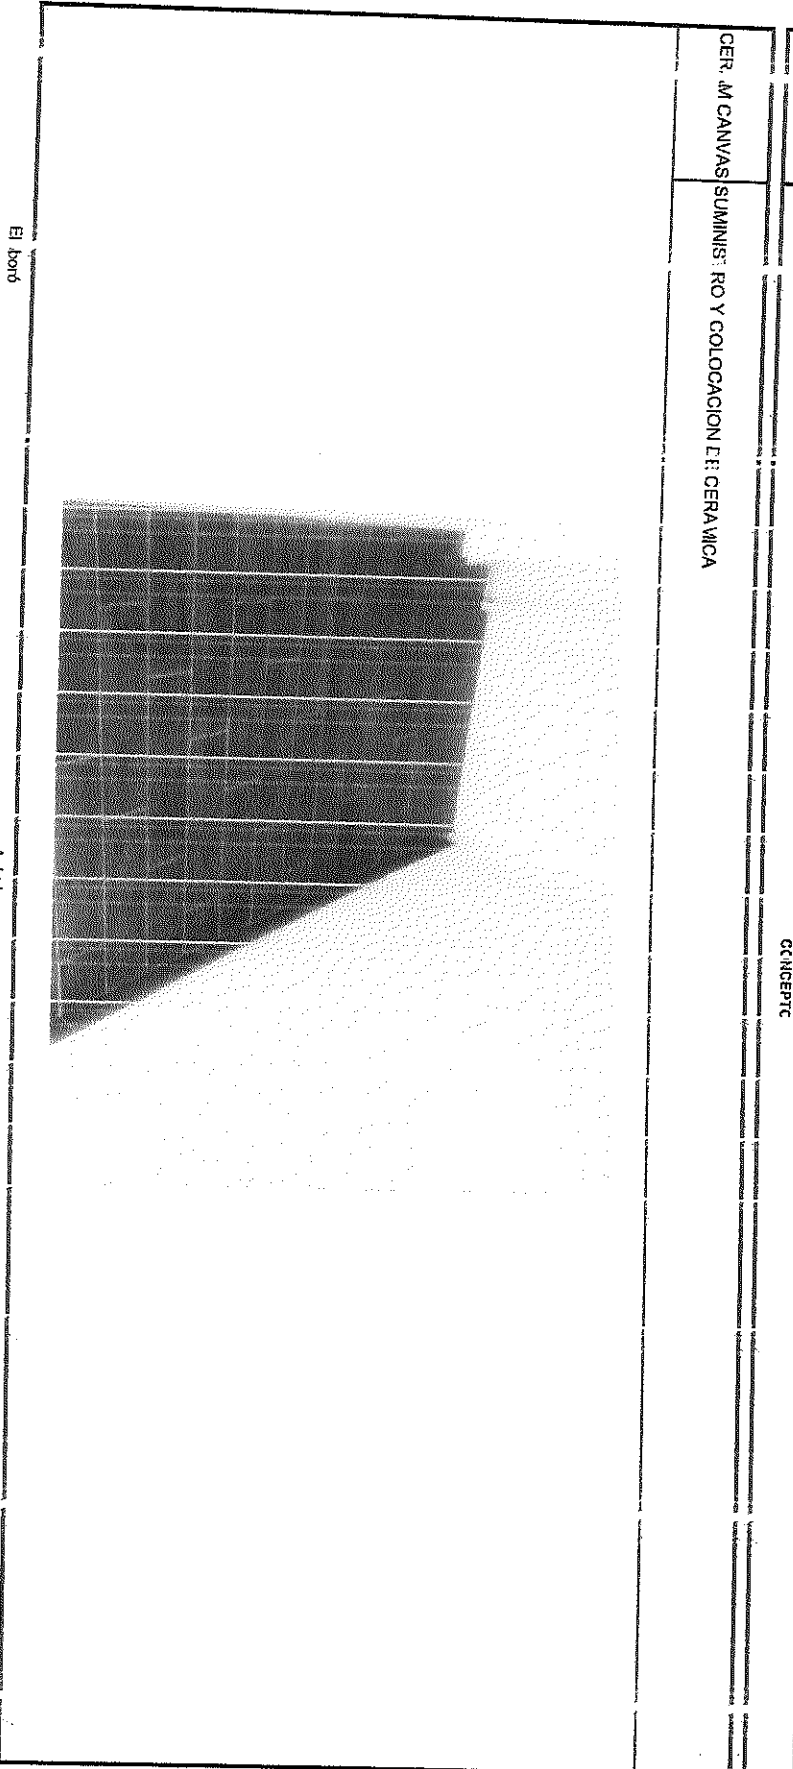

El borb

Aukizo

Vc Bo.

Carlos Vargas O.
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
 Arq. Valdes Clivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICS I

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	5
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DE: 28/04/2020
CONTRATO:						A: 15/05/2020
	N/A	PARTIDA:	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	FECHA: 15/05/2020
CONCEPTO						

CERAM CANVAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA

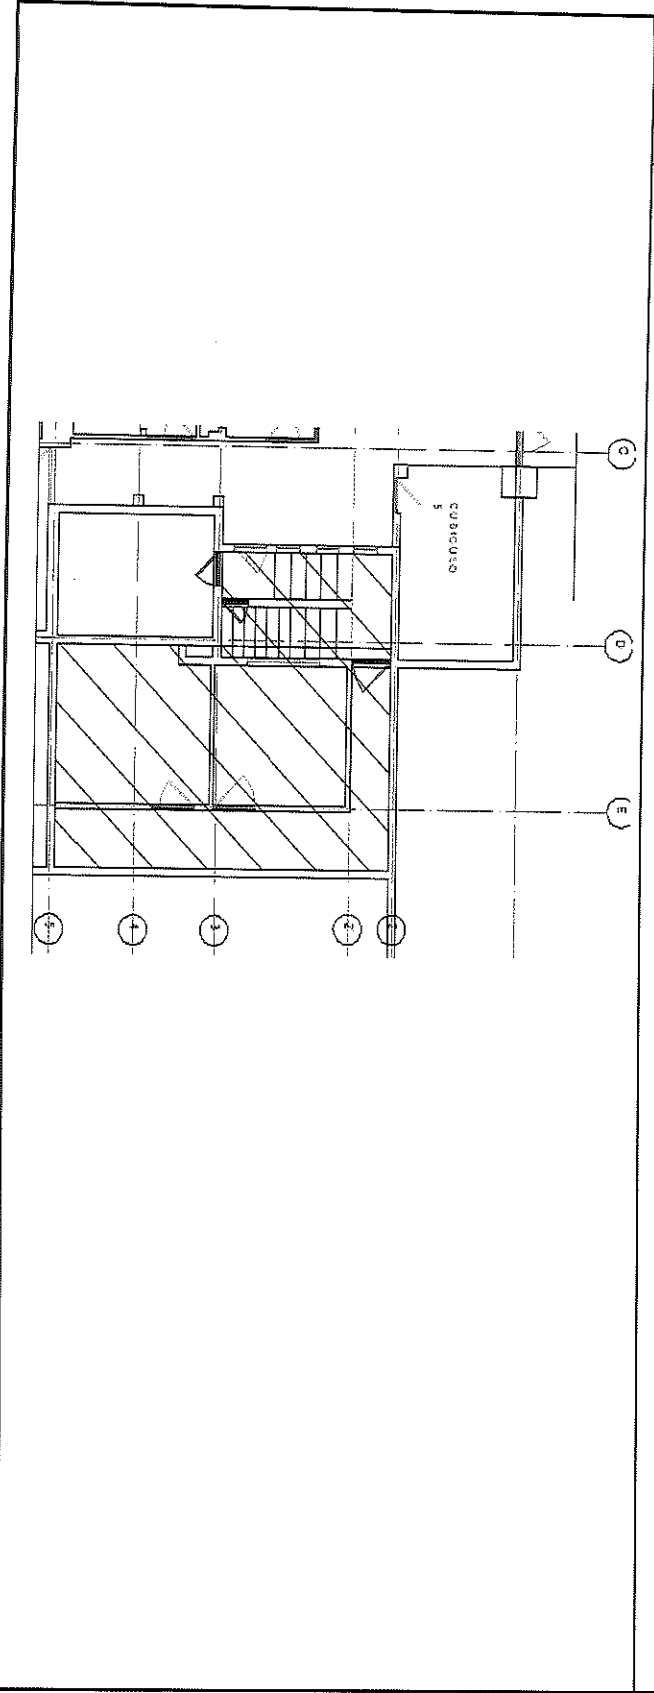

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.


Carla Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CRDOQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.		DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2421, COL. ZARCO		ESTIMACION	5
AREA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y (UEJAS" Y AREA DE CAJONERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS		CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DE: 28/04 2020
CONTRATO:	M/A	PARTIDA:	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ABRIGADOS	HOLA: 2	AL: 15/05 2020
CLAVE	ZOCLO 10		CONCEPTO		DE: 2		FECHA: 15/05 2020
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE CERAMICA DE 10 CM							

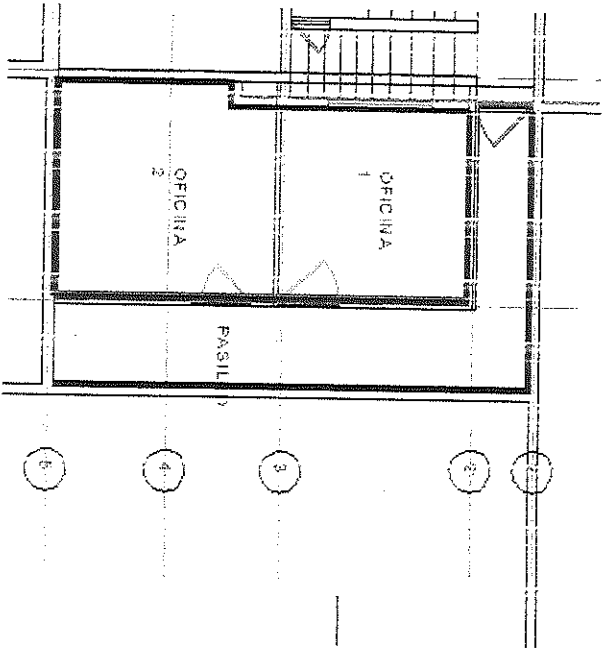

Elaboró

A. Cortizo

Vk. Bo.

Carlos Vargas C.
 Arq. Carlos Vargas C.
 Responsable de Obra


[Signature]
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis R. Arriaga Hernández
 Diseños y Construcción: CIVILES S.A. de C.V. DICS 1

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
						DEL:
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACABADOS	HORA:	AL:
N/A					DE:	FECHA:

CLAVE	CONCEPTO
1.36	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA

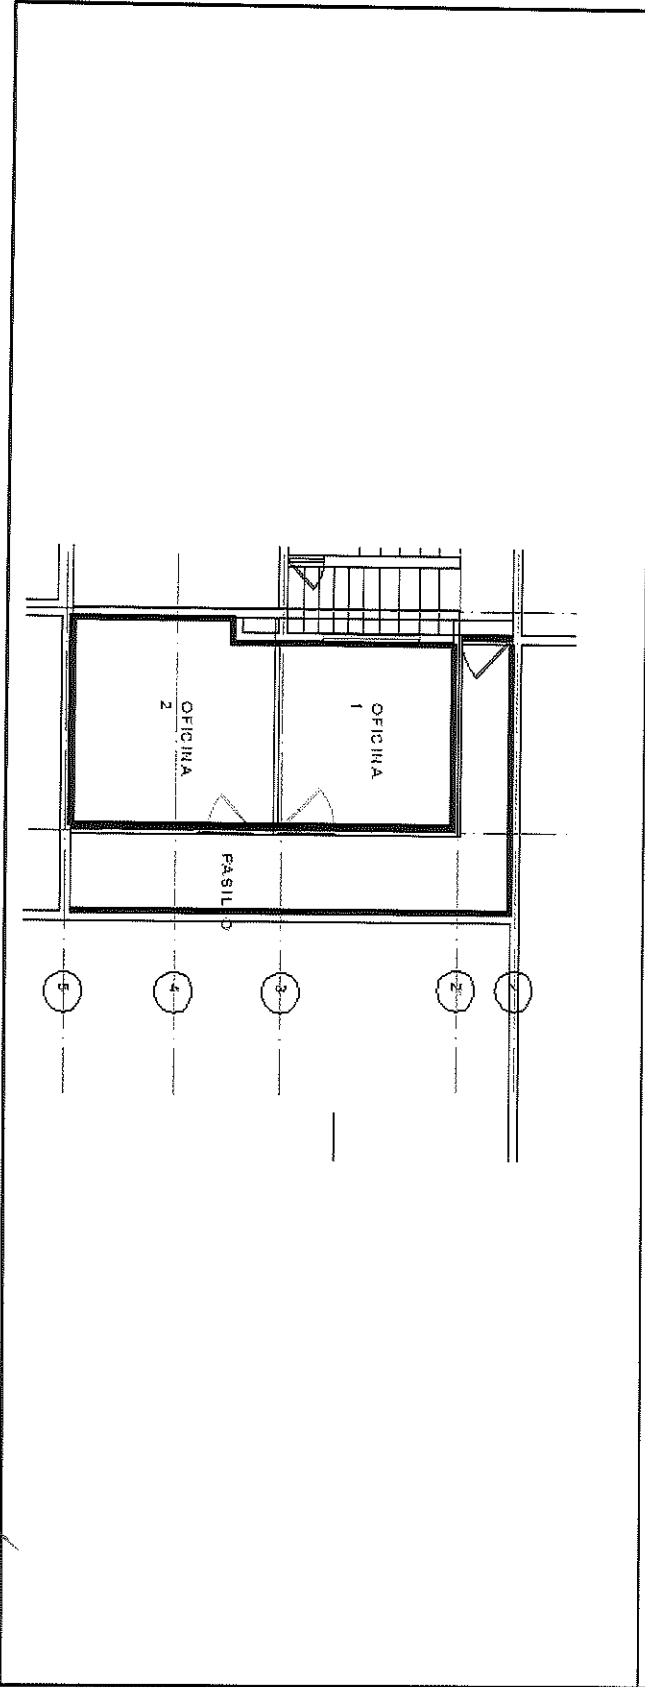

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas C.
Arq. Carlos Vargas O'Héga
 Residente de Obra

[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO			ESTIMACION	5	
OBRA:	REMEDIACION Y HABILITACION DEL AREA DE "ATELACION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			ESTADO:	CHIHUAHUA			DEL:	28/04 2020	
	CONTRATO:				MUNICIPIO:	CHIHUAHUA			AL:	15/06 2020
	N/A					HOJA: 2			FECHA:	16/06 2020
CLAVE				CONCEPTO						

TEMP#16	PUERTA DE 90"x240 Y MUJER LATERAL DE 38"x40 EN ALUMINIO DE 2" G3 CON VIDRIO CLARO DE 6 MM		
---------	---	--	--



Elaboró

Autorizó

Vc. Bo.

Carlos Vargas C.
 Ing. Carlos Vargas Ortega
 Responsable de Obra


[Signature]
 Sr. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Luis R. Arámbula Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICS 1

CRONOGRAMA

CONTRATISTA	DISEÑOS / CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZA YCO		ESTIMACION	5	
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DE LA AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BOILERIA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/05/2020	
CONTRATO:	M/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	CANALERIA	HOJA: 2	AL: 15/05/2020	
CLAVE	CONCRETO					FECHA:	15/05/2020

TEMP*20	VENTANA CORREJIZA DE 1*1 EN ALUMINIO DE 2" (32 CON VIDRIOS CLAROS DE 6MM
---------	--

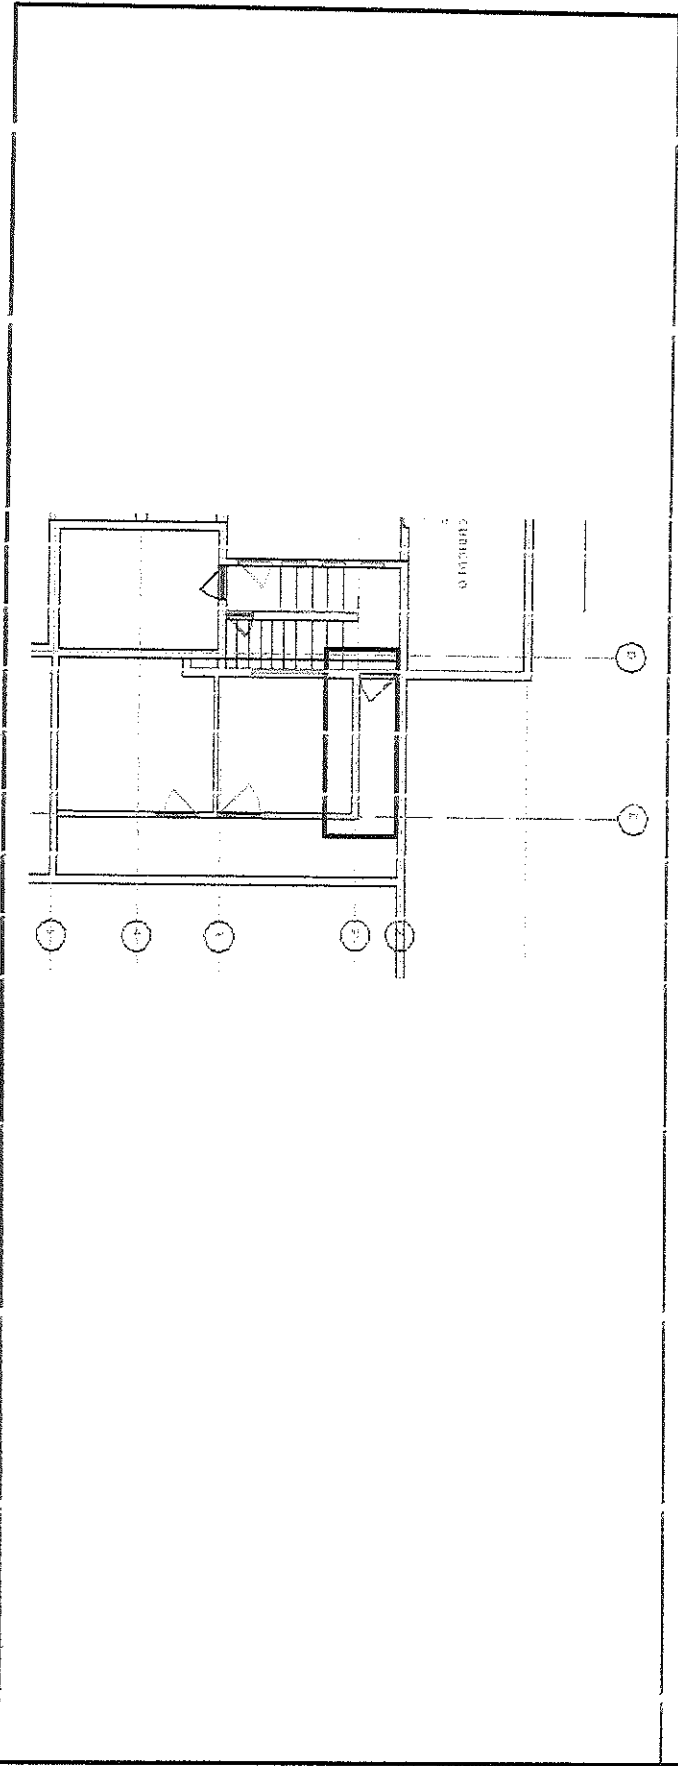

Elaboró

Autorizo

V. Ba.

Carlos Vargas O.
 Arq. Carlos Vargas O. Iaga


[Signature]
 Arq. Carlos Olivares Salcedo

[Signature]
 Ing. Jose Luis R. Oñigues Hernández

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO				ESTIMACION
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CIENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA		5
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ELECTRICO	HOJA: 2		DEL: 28/04 2020
CLAVE					DE: 2		AL: 15/05 2020
							FECHA: 15/05 2020

SAL TOMA SUMINISTRO Y COL. OCACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE

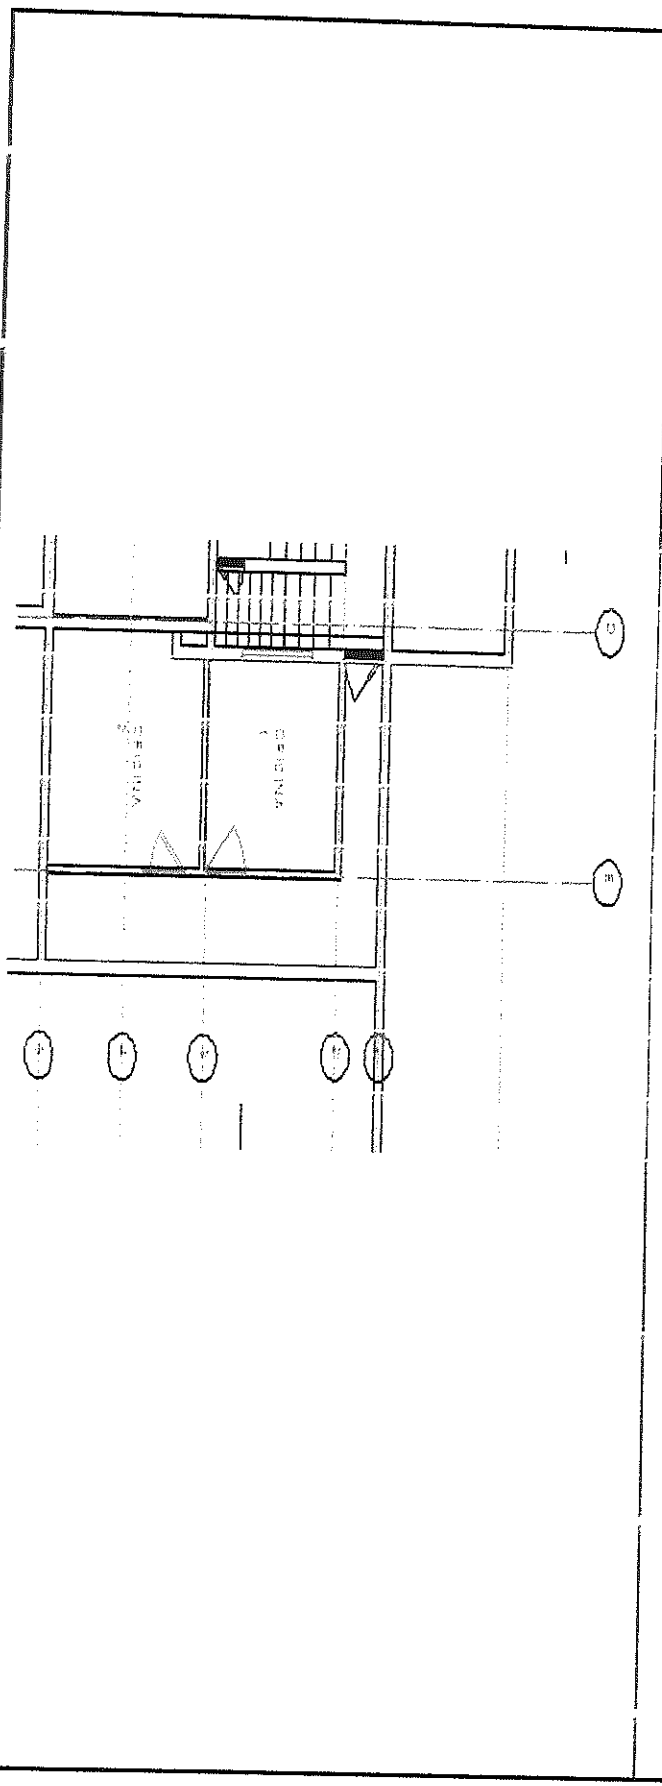

Elaboró

Autorizó

Vt. Ba.

Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortiz


[Signature]
Arq. Carlos Ortiz Salcedo

[Signature]
Ing. José Luis Rodríguez Hernández

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZAICO		
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS / AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		CONTRATO:	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	
CLASIFICACION:		CLASIFICACION:		FECHA:	15/06 2020
ESTIMACION:		ESTIMACION:	5	DEL:	28/06 2020
FECHA:		FECHA:	15/06 2020	AL:	15/06 2020
HORA:		HORA:	HOJA: 2	DE: 2	

SALIDA:	SUMINISTRO / COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION
CONCEPTO	

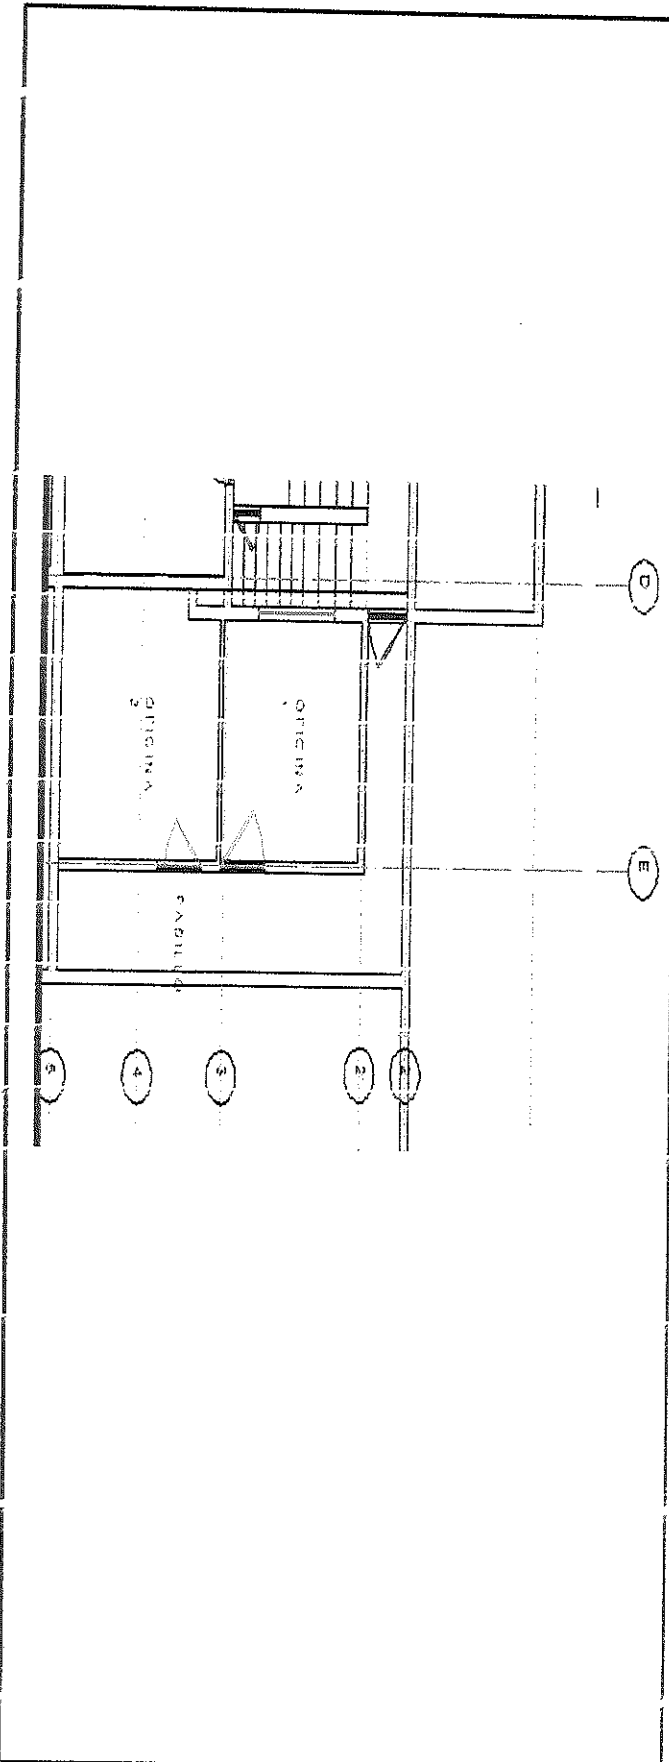

Elaboró:

Autorizó:

V. Bo.

Arq. Carlos Varrón Ortega

Arq. Carlos Olivares Salcedo

Ing. José Luis R. Arriaga Hernández

Carlos Varrón Ortega


Carlos Olivares Salcedo

José Luis R. Arriaga Hernández

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	5
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR		ELECTRICIDAD	HOLA: 2	DEL: 28/04/2020
CLAVE	N/A	PARTIDA:	SUBPARTIDA:	DE: 2	FECHA:	15/05/2020
CONCRETO						

LAMP SJUNT SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EN SALA DE JUNTAS CONSTRULITA RE8075BBCB

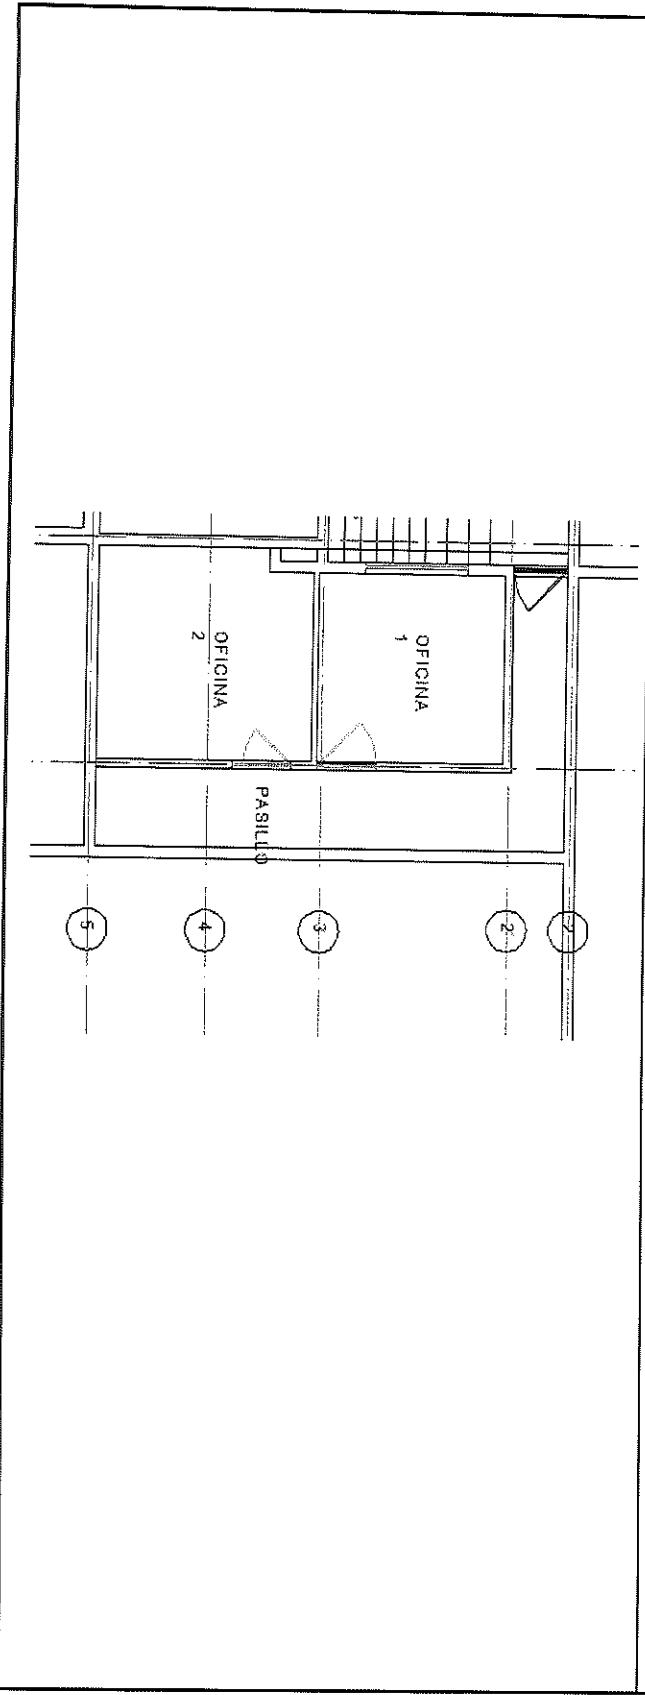

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.


Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega

[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernández

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTR. JCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.		DIRECCION:	AVE ZARCO N° 2427, C.O.L. ZARCO		ESTIMACION	5
C.SRA.:	REMODELACION Y REHAB LITACION DEL AREA DE: "ATENCIÓN Y C JEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRAL S Y SUS ACCESORIOS		CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/04 2020
	CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ELECTRICIDAD	HOJA: 2	AL: 15/06 2020
		PARTIDA:				DE: 2	FECHA: 15/06 2020
CLAVE	CONCERTO						
TEMP-29	SUMINISTRO DE SALIDA PARA MINISPLIT						

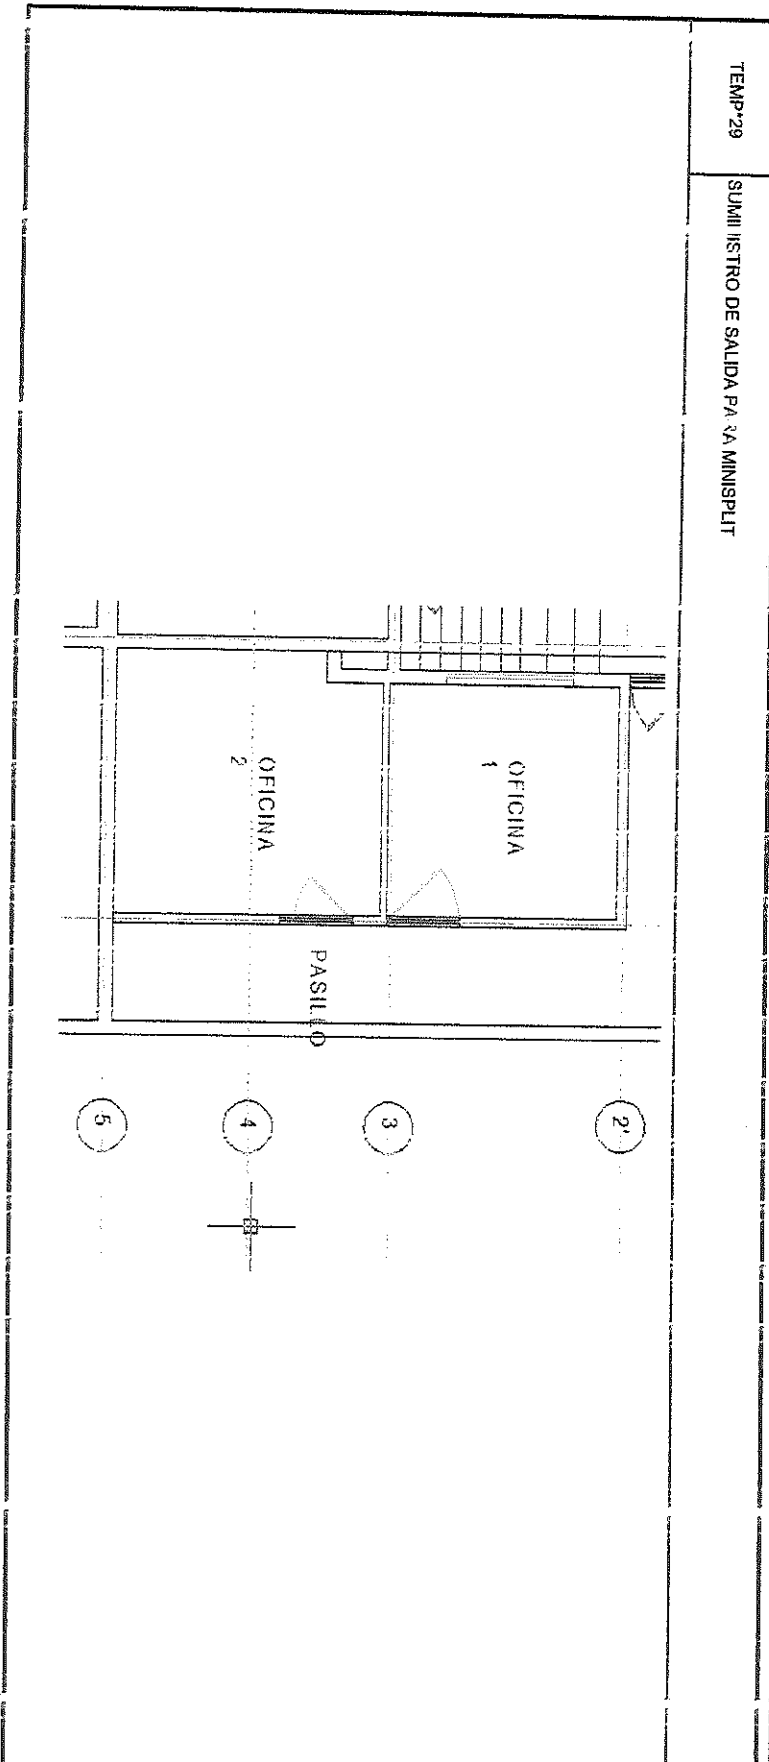

Elaboró

Auto 120

Vf. Bn.


Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortega

[Signature]
Arq. Carlos Olivares Salcedo

[Signature]
Ing. Jose Luis R. Figueroa Hernández

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 242, COL. ZARCO		ESTIMACION	5
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y EDEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/04/2020
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION:	INTERIOR	SUBPARTIDA:	VOZ Y DATOS	A.L: 15/05/2020
CLAVE:		CONCEPTO:	DE: 2			
SAL VOZ DAT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELEFONIA					

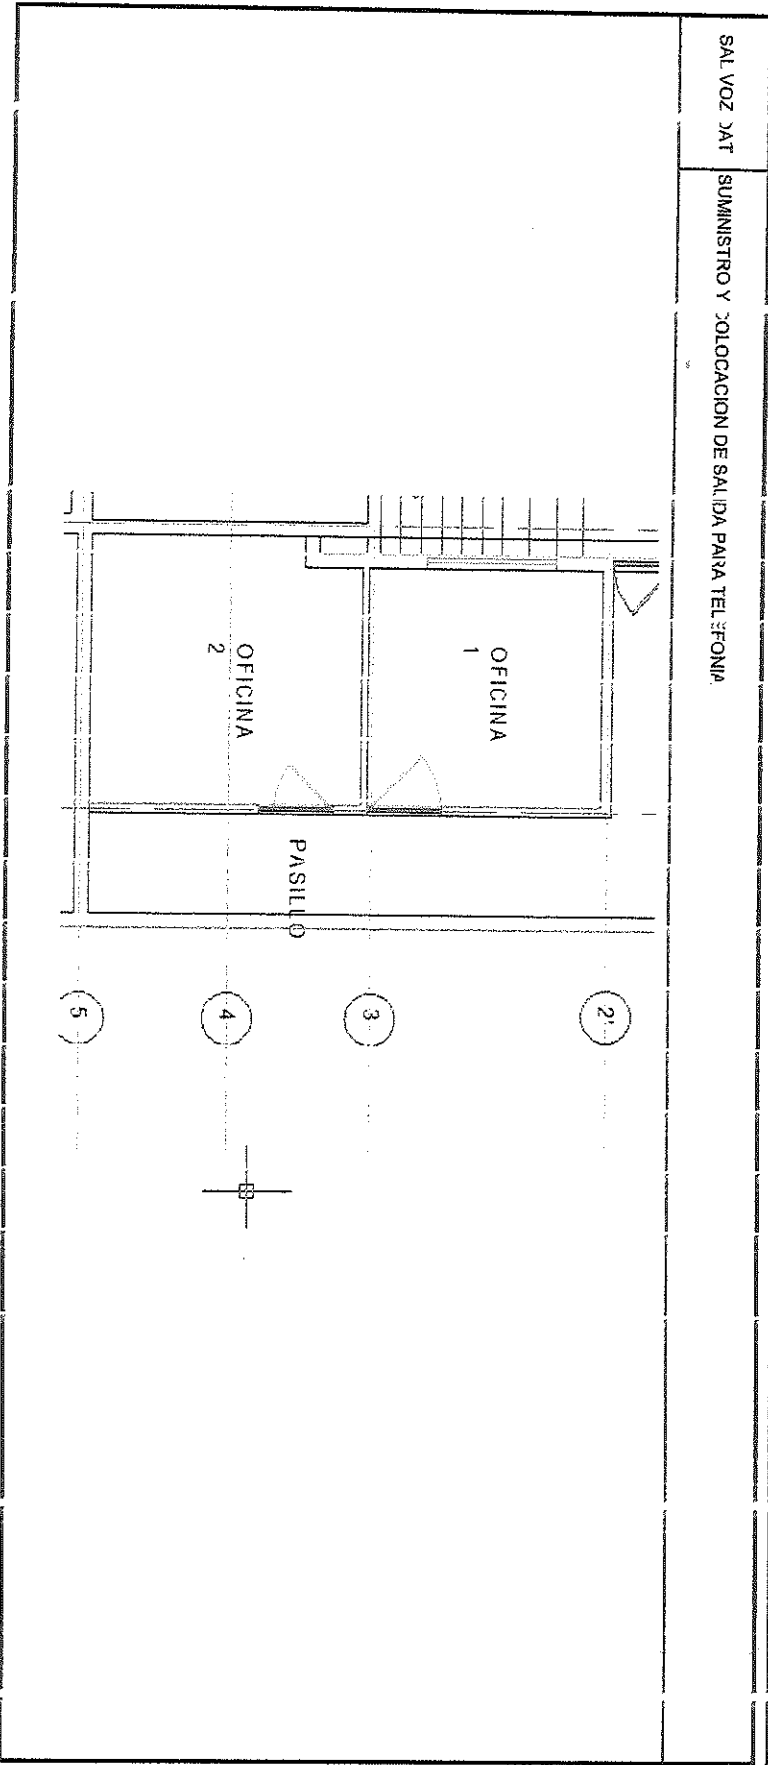

Elaboró

Autorizo

Vl. Bo.

Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega


Carlos Olivas
Arq. Carlos Olivas Sarcado

Jose Luis R. Arriaga
Ing. Jose Luis R. Arriaga Hernandez

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CO-INSTALACIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE ATENCION Y QUEJAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBMARTIDA	CLIMAS	HOJA: 2 DE: 2
CLAVE	N/A	PARTIDA:			DEL: 28/04/2020 AL: 15/08/2020 FECHA: 15/08/2020

TEMP-32 SUPLENIMIENTO E INSTALACION DE MINISPLIT 1 TON

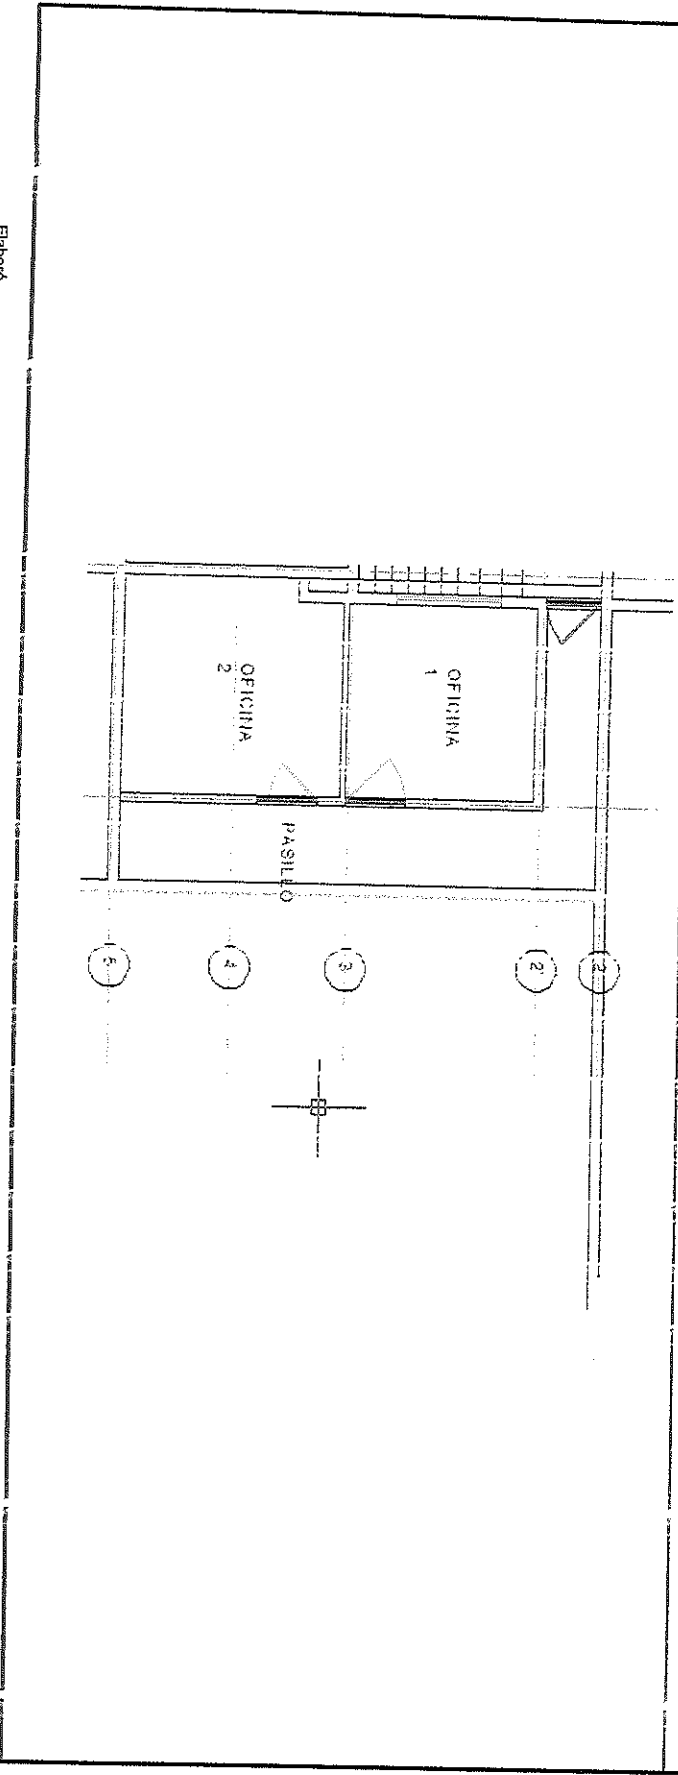

Elaboró Auto-izo
Vt. Bo.


Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega

[Signature]
Arq. Carlos Olivares Salcedo

[Signature]
Ing. Jose Luis R. Arriaga Hernandez

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION EXTERIOR	SUBPARTIDA:	HOJA: 2	DEL: 28/04/2020
CLAVE	CONCEPTO				
COL DUC 1	COLOCACION DE DUCTOS PARA VENTILACION DE CALDERA				



Elaboró

Autorizo

Va. Ba.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	5	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	28/04/2020
						AL:	15/05/2020
CONTRATO:		PARTIDA:	CONSTRUCCION EXTERIOR	SUBPARTIDA:		HOJAS:	
N/A						DE: 3	FECHA:
CONCRETO							

CLAVE	
COL DUC 1	COLOCACION DE DUCTOS PARA VENTILACION DE CALDERA

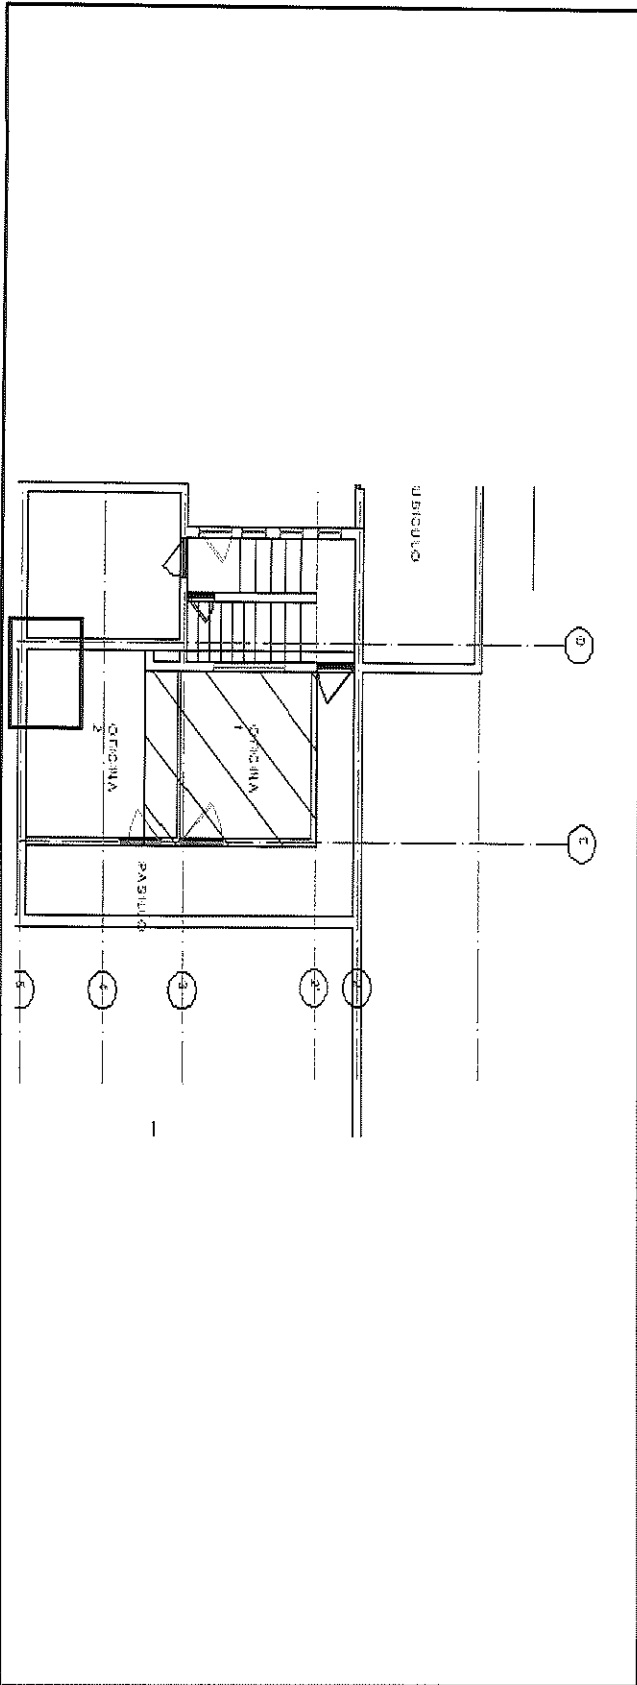

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.


Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	5
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS GENERALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 28/04/2020
CONTRATO:						AL: 15/05/2020
PARTIDA:		CONSTRUCCION EXTERIOR		SUBPARTIDA:		FECHA: 15/05/2020
N/A						DE: 2
CONCRETO						
CLAVE						
ESC MAR	ESCALERA MARINA					

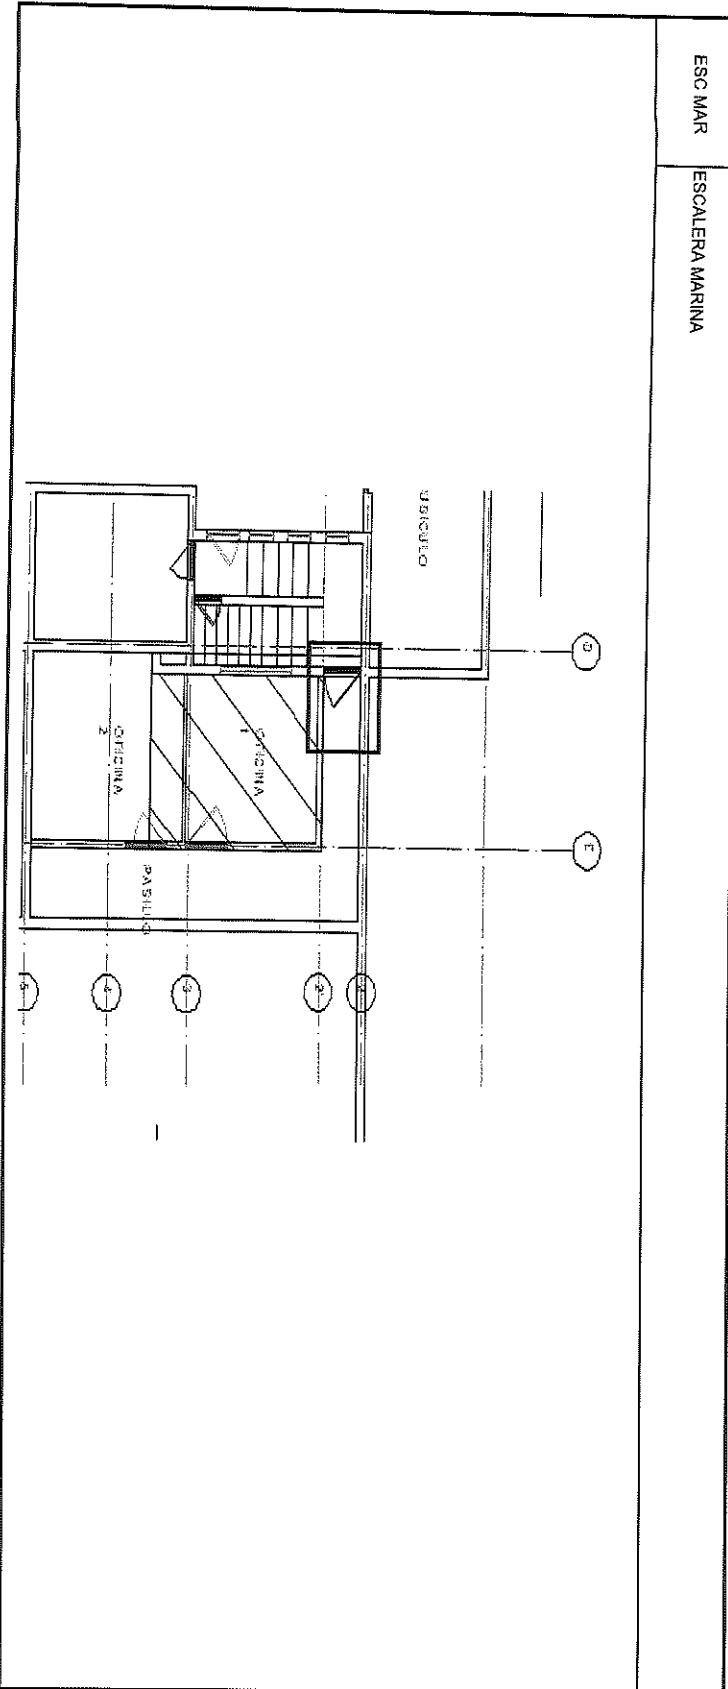

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

[Signature]
Arq. Carlos Olivares Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00677 Del 03/06/2020

Usr: DianaTreviso
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión
17/jun/2020 07:47 p.m.
Página 1

Concepto: 2971 - Obra Pública : REM/OFNAS/PRINC - REMODELACION OFICINAS PRINCIPALES C.E.D.H. Contrato : 2. GP Folio: 80

Beneficiario: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

Folio / Cheque : SPEI


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

0001	8270-110120-C0101-18-6223-2	Reconstrucion y remodelación por contr	\$294,027.53		GP Folio: 80
0002	8270-110120-C0101-18-6223-2	Reconstrucion y remodelación por contr	\$148,209.21		GP Folio: 80
0003	8260-110120-C0101-18-6223-2	Reconstrucion y remodelación por contr	\$294,027.53		GP Folio: 80
0004	8260-110120-C0101-18-6223-2	Reconstrucion y remodelación por contr	\$148,209.21		GP Folio: 80
0005	2113-000854	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVIL	\$442,236.74		GP Folio: 80
0006	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL	\$442,236.74		GP Folio: 80
Sumas iguales =>			884,473.48		
			884,473.48		



Miércoles 3 de Junio de 2020, 10:29 AM Centro de México

Otras cuentas		
<hr/>		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
<p>Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.</p>		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07 Usuario 08	PERLA I,RIVERA/O NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BANREGIO - 058150600168600110	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 442,236.74
	Fecha valor	03/06/2020
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	2971
	Concepto del pago	EST 6 REMODELACION OFNA CEDH CHIH
	Número de Autorización	027991
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31203
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 2971
Fecha: 1/6/2020 12:49:00

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5
Domicilio: Av. Zarco No. 2427, Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: 101 - Construcciones


Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad SAT, Concepto/ Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 72102900, 1.00, E48, Servicio - PAGO DE ESTIMACION No. 6...

Observaciones

importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 74/100

Subtotal: 381,238.57
Impuestos Traslados: 60,998.17
Total: 442,236.74

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408408629
Folio fiscal: 73949367-EB04-47B2-BA2F-858304904541
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 1 2020 - 13:49:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

k7MjMpcy8BTbXyWmXwHhI8G+Ov2yMt9KA6kdRsXWlvkPtkdKzoiMHOjgoQxpeRrWEEbbWSNz5e/6XEvrw7FEq
KTb93uYeGOQZtha+zIjsbxvs+pdpj1tuNtYMSUCUZVI/32vHYwhP2s0Kmszm/gpvfTrCP3vMbZJRyNANhCpFnV
LNIUDGLC7jbudZcE8jIcaqwSIXzv47yoqWnKYOjOerGJT/CWWjzi/4K9/rnnSSIQz61YHoapBMWtFTLNKeRpXc
FXieVLIhhYQgshSDUe9w1F7oek1ARKpfONFKR0ry58nf3h/IEDpdUWBAOEDH9cniH08wEo3UVFlt+GXihuA==

Sello del SAT

Nbjp8ISx1eT9G12yFDNFHxjWf8yxYJKZGo2b8qVqd9y9aP7Oa55cZEmpICGnElkLAW9S7AQLuYm+wjy4
ablq4I088yV/czdIhqua/QZ+wKtsg4FNlaurm8qvw4L7fb2pug+QmaeagwQmtMc55HxdIOegc7jbb6
zXNhsyM8bpZlax2bQXCXQrQX8AwUzrKAZUkjxvS9wsKLSZDMXnBUJc4y9p6VagAMtCO90j0gPpJbg1
36vNqwmSIKzbiXdMM8MPJskKSNZBNe0+q7Eo8VmrSk2Vc1gIvjRUJNBwFEF+ZvUx2FmgMl7PpPQZfv7
EqT10XG8ZQMCR3qzRzS9Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|73949367-EB04-47B2-BA2F-858304904541|2020-06-01T13:49:05|MAS0810247C0|k7Mj
Mpcy8BTbXyWmXwHhI8G+Ov2yMt9KA6kdRsXWlvkPtkdKzoiMHOjgoQxpeRrWEEbbWSNz5e/6XEvrw7FEq
EqKTb93uYeGOQZtha+zIjsbxvs+pdpj1tuNtYMSUCUZVI/32vHYwhP2s0Kmszm/gpvfTrCP3vMbZJRyN
ANhCpFnVLIUDGLC7jbudZcE8jIcaqwSIXzv47yoqWnKYOjOerGJT/CWWjzi/4K9/rnnSSIQz61YHoap
BMWtFTLNKeRpXcFXieVLIhhYQgshSDUe9w1F7oek1ARKpfONFKR0ry58nf3h/IEDpdUWBAOEDH9cniH0
8wEo3UVFlt+GXihuA==|00001000000404486074||

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTROL DE ESTIMACIONES**

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.

REMEDIACION OFICINAS

OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE PATRAGON Y QUEMAS Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTIMACION No.:	9
UBICACION:	AVE ZARCO N 2427 COL. ZARCO	PERIODO:	Del 16 al 20 de Junio del año 2020
CONTRATISTA:	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	FECHA:	Junio, 15 de Junio de 2020
		HORA:	
		ESTIMACION No.:	
		PERIODO:	
		FECHA:	
		HORA:	
		ESTIMACION No.:	
		PERIODO:	
		FECHA:	
		HORA:	

GLOBAL A LA FECHA					
CONCEPTO	CONTRATADO	PAGO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PAGO ACUMULADO	POR EJERCER
OBRA NORMAL:	\$ 1,638,367.83	\$ 1,297,129.28	\$ 381,238.57	\$ 1,638,367.83	\$ 0.00
MATERIALES	\$	\$	\$	\$	\$
CONTRATO FINAL	\$	\$	\$	\$	\$
OBRA EXCEDENTE:	\$	\$	\$	\$	\$
OBRA EXTRAORDINARIA:	\$	\$	\$	\$	\$
ESCALATORIA:	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL:	\$ 1,638,367.83	\$	\$ 381,238.57	\$ 1,638,367.83	\$ 0.00

ESTADO DE AVANCE		DATOS DEL ANTICIPO		RETENCIONES	
AVANCE PROGRAMADO:	100%	ANTICIPO OTORGADO	\$	IMPORTE RETENIDO ANTERIOR:	\$
AVANCE REAL:	23%	% DE I. V. A.	0.00	ESTA RETENCION:	\$
AVANCE ESTA ESTIMACION:		ANTICIPO OTORGADO	\$	RETENCION ACUMULADA:	\$
IMPORTE PAGADO ANTERIOR:	\$ 1,257,129.28	AMORTIZACION ACUMULADO ANTERIOR:	\$ 0.00	IMPORTE RETENIDO ANTERIOR:	\$
IMPORTE ESTIMACION:	\$ 381,238.57	AMORTIZACION ACUMULADO:	\$ 0.00	ESTA RETENCION:	\$
IMPORTE ACUMULADO:	\$ 1,638,367.83	AMORTIZACION ACUMULADO:	\$ 0.00	RETENCION ACUMULADA:	\$
IMPORTE POR PAGAR:	\$ 0.00	POS AMORTIZAR (SALUD):	\$ 0.00		

RESUMEN			
IMPORTE ESTA ESTIMACION:	\$ 381,238.57		
IVA:	\$ 60,996.17		
TOTAL A PAGAR:	\$ 442,236.74		

ELABORÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
 CARLOS VARGAS ORTEGA RESIDENTE DE OBRA	 CARLOS OLIVAS SALCEDO SUPERVISOR DE OBRA	 ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA


SUBMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	180,10	612,47	82284,35	100,10	100%	0%	100%	\$	82.284,35	\$	\$	82.284,35	\$	\$
SUBMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE CERAMICA DE 10CM	M4	105,40	102,19	1394,45	105,40	100%	0%	100%	\$	13.944,45	\$	-	13.944,45	\$	-
SUBMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	M2	366,50	65,32	2740,78	366,50	100%	0%	100%	\$	21.740,78	\$	-	21.740,78	\$	-
ITEMIZACION DE BARRIOS															
DESAMONTAR JUEGO DE SANTIAYOS	LOTE	1,00	590,00	590,00	1,00	100%	0%	100%	\$	590,00	\$	-	590,00	\$	-
INSTALACION DE SANTIAYOS	LOTE	1,00	1100,00	1100,00	1,00	100%	0%	100%	\$	1.100,00	\$	-	1.100,00	\$	-
SUBMINISTRO DE SANTIAYO	P2	1,00	850,00	850,00	1,00	100%	0%	100%	\$	850,00	\$	-	850,00	\$	-
SUBMINISTRO DE LAMBO, INC. MEZCLADORA	P2	1,00	1200,00	1200,00	1,00	100%	0%	100%	\$	1.200,00	\$	-	1.200,00	\$	-
SUBMINISTRO DE INHIBIDOR	P2	1,00	1190,00	1190,00	1,00	100%	0%	100%	\$	1.190,00	\$	-	1.190,00	\$	-
RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	M2	3,45	65,07	224,49	3,45	100%	0%	100%	\$	224,49	\$	-	224,49	\$	-
SUBMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	3,45	632,47	2182,02	3,45	100%	0%	100%	\$	2.182,02	\$	-	2.182,02	\$	-
REINSTALAR PUERTA EXISTENTE E INSTALAR PUERTA NUEVA DE 10CM	LOTE	1,00	4000,00	4000,00	1,00	100%	0%	100%	\$	4.000,00	\$	-	4.000,00	\$	-
SALA ACOMODAR															
RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	M2	2,70	65,07	175,69	2,70	100%	0%	100%	\$	175,69	\$	-	175,69	\$	-
SUBMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	2,70	632,47	1707,67	2,70	100%	0%	100%	\$	1.707,67	\$	-	1.707,67	\$	-
PUERTA DE 80X20 Y HUECO LATERAL DE 80X20 EN ALUMINIO DE 2" GZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	P2	1,00	936,58	936,58	1,00	100%	0%	100%	\$	936,58	\$	-	936,58	\$	-
PUERTA CERAMICA EXISTENTES	P2	30,00	80,00	2400,00	30,00	100%	0%	100%	\$	2.400,00	\$	-	2.400,00	\$	-
COLOCACION DE CERAMICAS	P2	30,00	80,00	2400,00	30,00	100%	0%	100%	\$	2.400,00	\$	-	2.400,00	\$	-
AREA DE ESCALERAS															
RETIRO DE PAPEL TAPIZADO Y LUBROS	LOTE	1,00	2000,00	2000,00	1,00	100%	0%	100%	\$	2.000,00	\$	-	2.000,00	\$	-
TERMINACION DE FINOS CON APAYAMDO DE YESO	M2	82,40	45,00	3768,00	82,40	100%	0%	100%	\$	3.768,00	\$	-	3.768,00	\$	-
MODIFICACION DE BARRIALDA	LOTE	1,00	3800,00	3800,00	1,00	100%	0%	100%	\$	3.800,00	\$	-	3.800,00	\$	-
SUBMINISTRO DE PUERTAS CON REJILLAS INTERIOR	P2	2,00	4520,00	9100,00	2,00	100%	0%	100%	\$	9.100,00	\$	-	9.100,00	\$	-
SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINADA PARA EXTERIOR	P2	1,99	4000,00	4000,00	1,99	100%	0%	100%	\$	4.000,00	\$	-	4.000,00	\$	-
SUBMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN ESCALERAS	LOTE	1,00	8600,00	8600,00	1,00	100%	0%	100%	\$	8.600,00	\$	-	8.600,00	\$	-
SUBMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	M2	82,40	58,33	4817,97	82,40	100%	0%	100%	\$	4.817,97	\$	-	4.817,97	\$	-
SUBMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 240 X 140 DE VIDRIO DE 6MM	P2	1,00	6000,00	6000,00	1,00	100%	0%	100%	\$	6.000,00	\$	-	6.000,00	\$	-
ACCESOS															
SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BARRIALDA PARA DISCIPULANTAS	LOTE	1,00	6000,00	6000,00	1,00	100%	0%	100%	\$	6.000,00	\$	-	6.000,00	\$	-
SUBMINISTRO Y COLOCACION DE MICROPERFORADO EN CUBIERTA	LOTE	1,00	5500,00	5500,00	1,00	100%	0%	100%	\$	5.500,00	\$	-	5.500,00	\$	-
SUBMINISTRO Y COLOCACION DE MICROPERFORADO EN CUBIERTA	LOTE	1,00	4841,72	4841,72	1,00	100%	0%	100%	\$	4.841,72	\$	-	4.841,72	\$	-
SUBMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA DE ACERO METALICA	LOTE	1,00	4584,00	4584,00	1,00	100%	0%	100%	\$	4.584,00	\$	-	4.584,00	\$	-
OTROAS ECUACIONES															
CAMBIO DE ORO DE PUERTA (en cambio de hierro, Inicial de vidrio y colocacion de aluminio)	LOTE	1,00	2438,00	2438,00	1,00	100%	0%	100%	\$	2.438,00	\$	-	2.438,00	\$	-
SUBMINISTRO DE PAPEL ABRIGADO EN PUERTAS	LOTE	2,00	1310,00	2620,00	2,00	100%	0%	100%	\$	2.620,00	\$	-	2.620,00	\$	-
SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PAPEL ABRIGADO EN VENTANAS	LOTE	2,00	1810,00	3620,00	2,00	100%	0%	100%	\$	3.620,00	\$	-	3.620,00	\$	-
CERCA PERIM															
VALA DE JUNTAS															
FILO CLARO DE 8X120 EN ALUMINIO DE 2" GZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	P2	1,00	6119,95	6119,95	1,00	100%	0%	100%	\$	6.119,95	\$	-	6.119,95	\$	-
FILO CLARO DE 7X120 EN ALUMINIO DE 2" GZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	P2	1,00	6272,96	6272,96	1,00	100%	0%	100%	\$	6.272,96	\$	-	6.272,96	\$	-
FILO DE 80X20 EN ALUMINIO DE 2" GZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	P2	1,00	8650,50	8650,50	1,00	100%	0%	100%	\$	8.650,50	\$	-	8.650,50	\$	-
CUBIERTA															
FILO DE 80X120 EN ALUMINIO DE 2" GZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	P2	1,00	12770,00	12770,00	1,00	100%	0%	100%	\$	12.770,00	\$	-	12.770,00	\$	-
PUERTA DE 80X20 EN ALUMINIO DE 2" GZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	P2	1,00	8650,50	8650,50	1,00	100%	0%	100%	\$	8.650,50	\$	-	8.650,50	\$	-
FIBRONO 4															


[Handwritten signature]


	VENTANA DE 80x220 EN ALUMINIO DE 2º QZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	578,00	676,00	1,00	1,00	0%	100%	\$	-	\$	5.788,00	\$	-
	PIERNA DE 80x220 Y FILO LATERAL DE 8x220 EN ALUMINIO DE 2º QZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	1038,58	1038,58	1,00	1,00	0%	100%	\$	-	\$	10.385,58	\$	10.385,58
	CONCLUSIONES														
	PIERNA DE 80x220 Y FILO LATERAL DE 8x220 EN ALUMINIO DE 2º QZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	1089,69	1089,69	1,00	1,00	0%	100%	\$	-	\$	10.380,69	\$	10.380,69
	PARALELO														
	PIERNA DE 80x220 Y FILO LATERAL DE 6x220 EN ALUMINIO DE 2º QZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	1028,58	1028,58	1,00	1,00	0%	100%	\$	-	\$	10.380,69	\$	10.380,69
	PIERNA DE 80x220 EN ALUMINIO DE 2º QZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	869,70	869,70	1,00	1,00	0%	100%	\$	-	\$	8.659,70	\$	8.659,70
	CONCLUSIONES														
	PIERNA DE 80x220 Y FILO LATERAL DE 1522x81 EN ALUMINIO DE 2º QZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	1547,10	1547,10	1,00	1,00	0%	100%	\$	-	\$	15.477,10	\$	15.477,10
	CONCLUSIONES														
	PIERNA DE 80x220 Y FILO LATERAL DE 1522x81 EN ALUMINIO DE 2º QZ CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PZ	1,00	1547,10	1547,10	1,00	1,00	0%	100%	\$	-	\$	15.477,10	\$	15.477,10
	RESEPCION														
	VENTANA CORRENZA DE 1250x40 EN ALUMINIO DE 2º QZ CON VIDRIOS CLAROS DE 6MM	PZ	2,00	1081,20	3564,40	2,00	2,00	0%	100%	\$	-	\$	3.564,40	\$	3.564,40
	VENTANA FILO DE CRISTAL TEMPLADO DE 8xmm 40x220	PZ	1,00	6789,00	5789,00	1,00	1,00	0%	100%	\$	-	\$	57.890,00	\$	57.089,00
	RELOCAR PIERNA DE 1522x81	PZ	3,00	1310,00	3930,00	3,00	3,00	0%	100%	\$	-	\$	3.930,00	\$	3.930,00
	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PAPER, ARREDO EN VENTANAS	PZ	7,00	1316,90	9119,00	7,00	7,00	0%	100%	\$	-	\$	9.170,00	\$	9.170,00
	ELECTRICIDAD														
	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TONACORRENTE	PZ	28,00	537,44	15055,76	28,00	28,00	0%	100%	\$	-	\$	15.055,76	\$	15.055,76
	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION	PZ	33,00	591,44	17335,52	33,00	33,00	0%	100%	\$	-	\$	17.335,52	\$	17.335,52
	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA GENERAL ELECTRIC INTERIOR CASI LED 150x300x5054004	PZ	6,00	2011,79	12070,74	6,00	6,00	0%	100%	\$	-	\$	12.070,74	\$	12.070,74
	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EN SALA DE JUNTAS CONSTRUCTIVA RE991898C	PZ	1,00	2031,79	2031,79	1,00	1,00	0%	100%	\$	-	\$	2.031,79	\$	2.031,79
	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT INTERIOR	PZ	28,00	1028,84	28799,84	28,00	28,00	0%	100%	\$	-	\$	28.799,84	\$	28.799,84
	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA LAMPARA	PZ	11,00	2436,39	26800,29	11,00	11,00	0%	100%	\$	-	\$	26.800,29	\$	26.800,29
	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINIPRINT EN AREA DE ADOBE	PZ	1,00	1272,31	1272,31	1,00	1,00	0%	100%	\$	-	\$	1.272,31	\$	1.272,31
	VOZ 1 INSTANTOS														
	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELEFONIA	PZ	13,00	427,59	5559,74	13,00	13,00	0%	100%	\$	-	\$	5.559,74	\$	5.559,74
	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA FOXCORRENTE	PZ	2,00	537,44	1074,88	2,00	2,00	0%	100%	\$	-	\$	1.074,88	\$	1.074,88
	CTV														
	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CCTV	PZ	3,00	690,09	2070,27	3,00	3,00	0%	100%	\$	-	\$	2.070,27	\$	2.070,27
	GRANIS														
	INSTALACION DE MINIPRINT EXISTENTE	PZ	2,00	6497,84	12995,68	2,00	2,00	0%	100%	\$	-	\$	12.995,68	\$	12.995,68
	SUBMINISTRO E INSTALACION DE MINIPRINT DE 3TON	PZ	1,00	21071,00	21071,00	1,00	1,00	0%	100%	\$	-	\$	21.071,00	\$	21.071,00
	SUBMINISTRO E INSTALACION DE MINIPRINT DE 179H	PZ	8,00	21207,69	170381,46	8,00	8,00	0%	100%	\$	-	\$	170.381,46	\$	170.381,46
	DELETION DE PASO Y SUBMINISTRO DE TUBERIAS PARA CONSERVADOS	LOIE	1,00	2850,00	2850,00	1,00	1,00	0%	100%	\$	-	\$	2.850,00	\$	2.850,00
	CONCRETERIA														
	FABRICACION DE LUMBRER PARA RECEPCION DE MADERA DE JUNGLE ACABADO EN PINTURA Y REVESTIMIENTO EN MDF, FILO DE ALUMINIO DE 2º CON VIDRIO DE 6MM	LOIE	1,00	70620,00	70620,00	1,00	1,00	0%	100%	\$	-	\$	70.620,00	\$	70.620,00
	CONSTRUCCION EXTERIOR														
122	ALBAÑILERIAS														
	CANTILLO DE CONCRETO DE 18x18 cms. ARMADOS CON 4 VRS. DE 4 y 1 VRS. DE 14 @ 10cms (VRS. DE 3 @ 10cms)	ML	9,00	420,76	3787,02	9,00	9,00	0%	100%	\$	-	\$	3.787,02	\$	3.787,02
	LANA DE PIR EN LANTAS DE CONCRETO DE 20x20 cms. CONCRETO MAS DENS. Y VRS. DE 14 @ 20 cms. RESULTANTE DE MUDOS DE BLOCC	ML	6,00	338,85	1951,10	6,00	6,00	0%	100%	\$	-	\$	1.951,10	\$	1.951,10

[Handwritten signature]

Suministro y colocación de estalote RT11 de 10m de ancho	M2	64,80	60,34	626,63	64,80	64,80	100%	0%	100%	\$	5.206,03	\$	-	\$	5.206,03	\$	-
REVELACION DE PISOS EXISTENTES	M2	47,00	160,00	709,60	47,00	47,00	100%	0%	100%	\$	7.050,00	\$	-	\$	7.050,00	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA	M2	47,00	632,47	297,60	47,00	47,00	100%	0%	100%	\$	297,60	\$	-	\$	297,60	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCOS O A BASE DE CERAMICA EN PISO	M2	77,00	133,46	1020,13	77,00	77,00	100%	0%	100%	\$	1020,13	\$	-	\$	1020,13	\$	-
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	M2	126,00	89,32	744,32	126,00	126,00	100%	0%	100%	\$	744,32	\$	-	\$	744,32	\$	-
CANALERIA																	
PERFORACION DE 20x20 Y FIO LATERAL DE 30x20 EN ALUMINIO DE 2"32 CON VORBO CLARO DE 50x4 VORBO CLARO DE 60x4	PZ	2,00	936,88	1873,16	2,00	2,00	100%	0%	100%	\$	1873,16	\$	-	\$	1873,16	\$	-
VERIFICACION DE 1" EN ALUMINIO DE 2"32 CON VORBO CLARO DE 60x4	PZ	1,00	1883,20	1883,20	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	1.883,20	\$	-	\$	1.883,20	\$	-
ELECTRICIDAD																	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TUBO	PZ	6,00	67,44	322,64	6,00	6,00	100%	0%	100%	\$	322,64	\$	-	\$	322,64	\$	-
TUBO ACCORRETE	PZ	3,00	57,44	161,32	3,00	3,00	100%	0%	100%	\$	161,32	\$	-	\$	161,32	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMINIO	PZ	2,00	261,19	629,58	2,00	2,00	100%	0%	100%	\$	629,58	\$	-	\$	629,58	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EN SALA DE SERVICIOS	PZ	1,00	1028,84	1028,84	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	1.028,84	\$	-	\$	1.028,84	\$	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT INTERIOR	PZ	2,00	203,39	467,78	2,00	2,00	100%	0%	100%	\$	467,78	\$	-	\$	467,78	\$	-
PISO Y PAREDES																	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELEFONO	PZ	6,00	427,88	2567,88	6,00	6,00	100%	0%	100%	\$	2.567,88	\$	-	\$	2.567,88	\$	-
CELANOS																	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANSIN LT DE 1TON	PZ	2,00	2169,68	4299,37	2,00	2,00	100%	0%	100%	\$	4.299,37	\$	-	\$	4.299,37	\$	-
CONSTRUCCION EN FERRO																	
INFORMALIZACION A BASE DE PAPEL MINERALIZADO	M2	16,00	188,32	2824,80	16,00	16,00	100%	0%	100%	\$	2.824,80	\$	-	\$	2.824,80	\$	-
APLACADO A BASE DE MARMOL ACABADO PISO	M2	18,00	178,18	3218,04	18,00	18,00	100%	0%	100%	\$	3.218,04	\$	-	\$	3.218,04	\$	-
COLOCACION DE DUCTOS PARA VENTILACION DE CALDERA	LOTE	1,00	1050,00	10500,00	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	10.500,00	\$	-	\$	10.500,00	\$	-
ESCALERA MARINA	LOTE	1,00	6970,95	6970,95	1,00	1,00	100%	0%	100%	\$	6.970,95	\$	-	\$	6.970,95	\$	-
MANEJO																	
LUBRICA GRUESA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA	M2	47,30	49,28	2046,20	47,30	47,30	100%	0%	100%	\$	2.046,20	\$	-	\$	2.046,20	\$	-
RETIRO DE ESCORRO PRODUCIDO DE LA OBRA	VALE	3,00	1653,78	6661,34	3,00	3,00	100%	0%	100%	\$	6.661,34	\$	-	\$	6.661,34	\$	-
TOTALES			\$	1.630.367,63						\$	1.637.419,26	\$	381.238,67	\$	1.630.367,63	\$	0,20%
			\$	76,73%						\$	23,27%			\$	1.630.367,63	\$	-


 Echebur
 Asesor
 Av. Carlos Vargas Ochoa
 Residente de O'Higgins


 Asesor
 Av. Carlos O'Higgins Salas
 Supervisor de O'Higgins


 V.o. Bo.
 Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Chilas S.A. de C.V. DICSA

FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	6
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CLAVE	CONCEPTO			
	PARTIDA:	SUBPARTIDA:	ACCESO	HOLA: 2
				DEL: 16/05/2020
				AL: 26/08/2020
				FECHA: 26/08/2020

SUM BAR 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL PARA DISCAPACITADOS



Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas
 Arq. Carlos Vargas Ortégua
 Residente de Obra


[Signature]
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	6		
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	16/05/2020	
CONTRATO:						AL:	26/06/2020	
PARTIDA:		CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACCESO	DE:	3	FECHA:	26/06/2020

CLAVE	CONCEPTO
SUM BAR 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL PARA DISCAPACITADOS

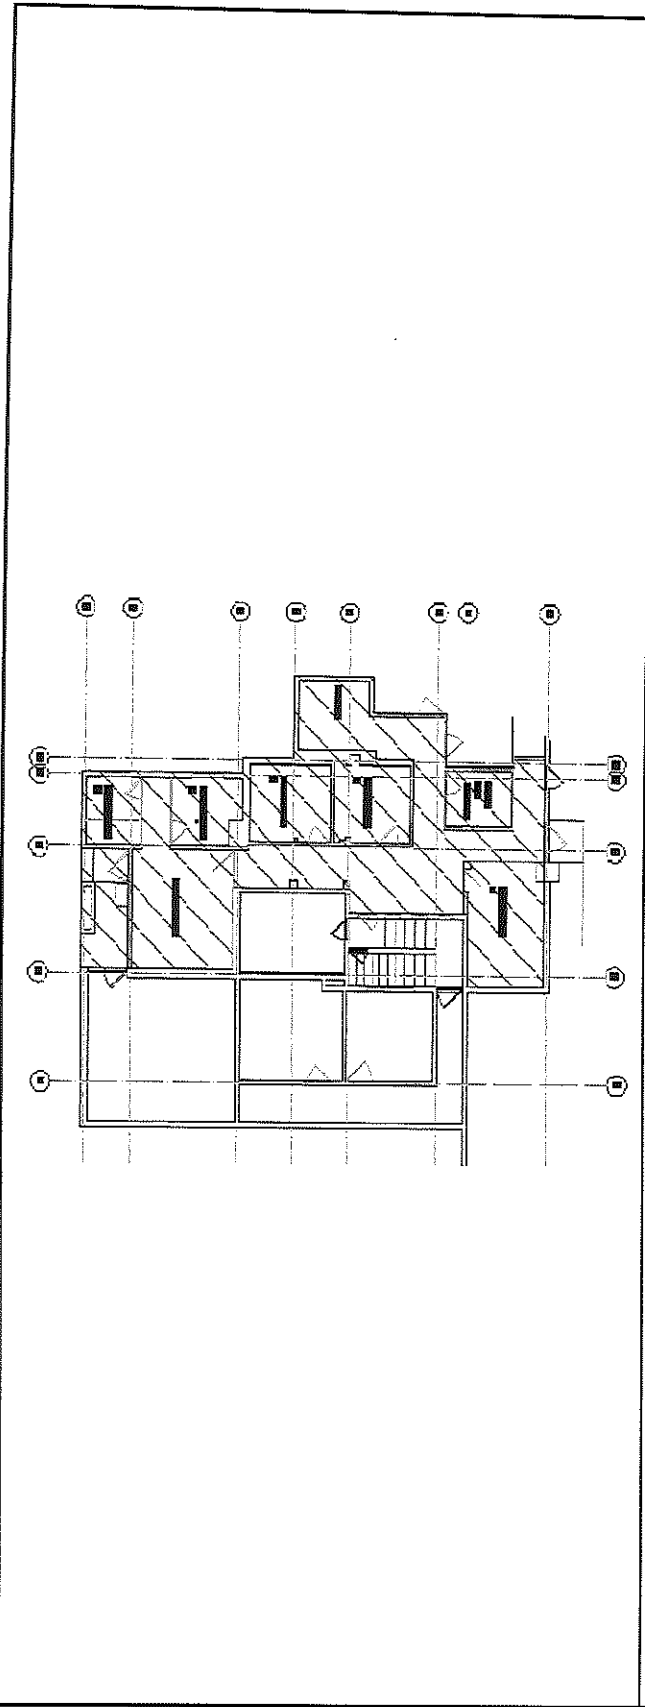

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivas Salcedo
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR		SUBPARTIDA:	
N/A		PARTIDA:		ACCESO	
		HOLAS:		DE: 3	
		AL:		FECHA:	
				28/06/2020	

CLAVE	CONCEPTO
SUM MICR 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROPERFORADO EN COLOR DORADO

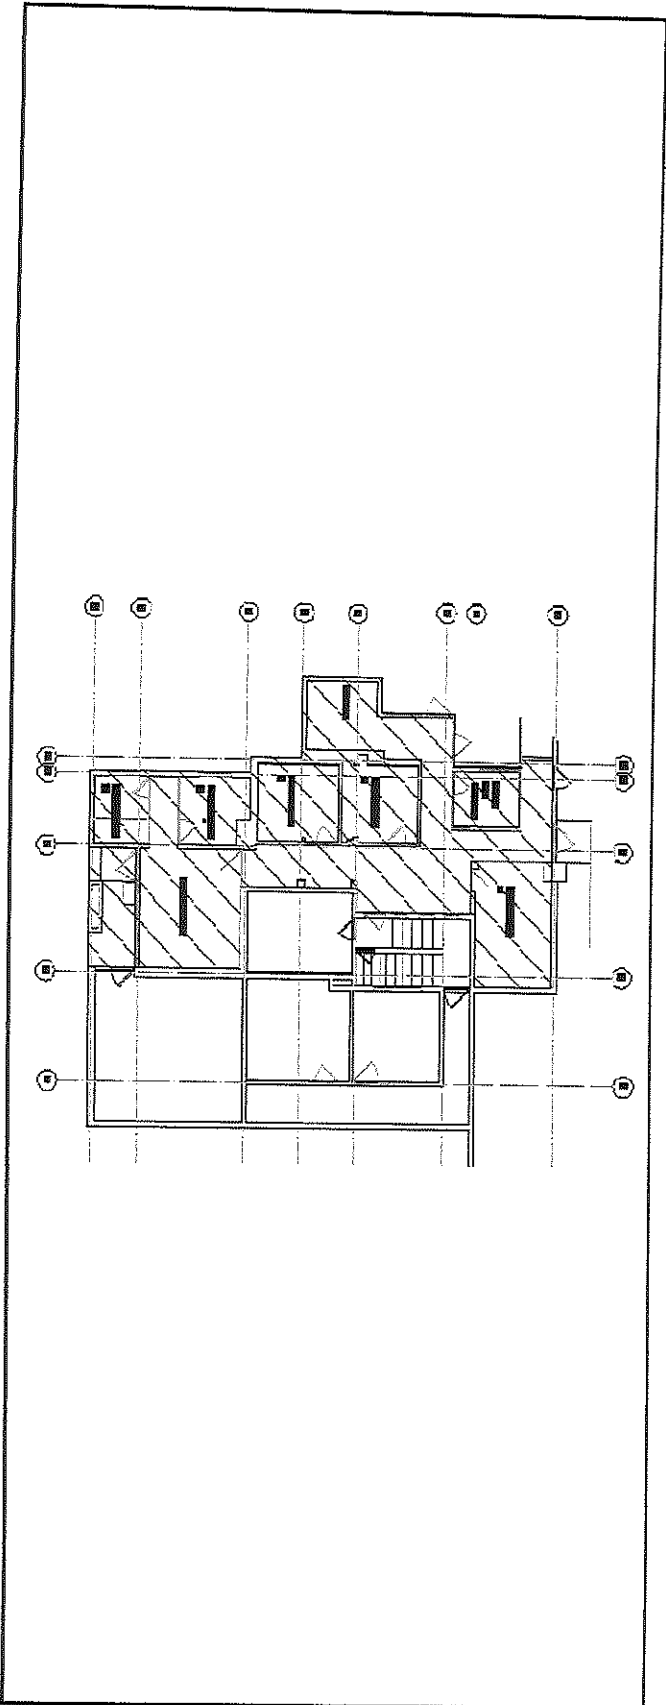

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.


Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACCESO	DE: 6
CLAVE	CONCEPTO				
SUM MICR 2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROPERFORADO EN COLOR ROJO				

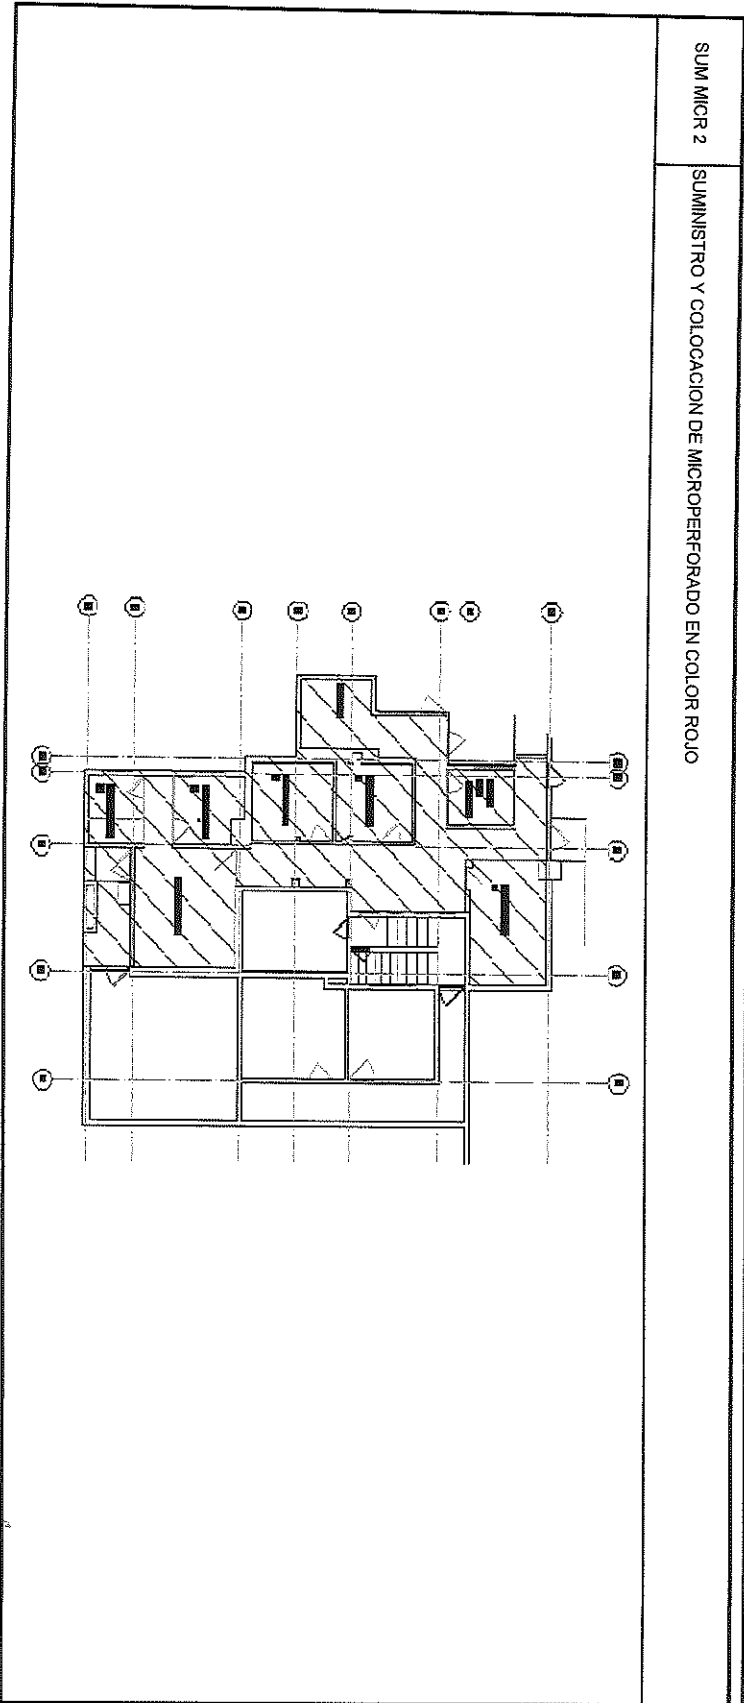

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Otega
Arq. Carlos Vargas Otega
Residente de Obra


[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		HOJA: 2		AL:	28/06/2020
PARTIDA:		ACCESO		FECHA:	28/06/2020
N/A		CONSTRUCCION INTERIOR		DE: 2	

CLAVE	CONCEPTO
SUM CORT 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE ACERO METALICA

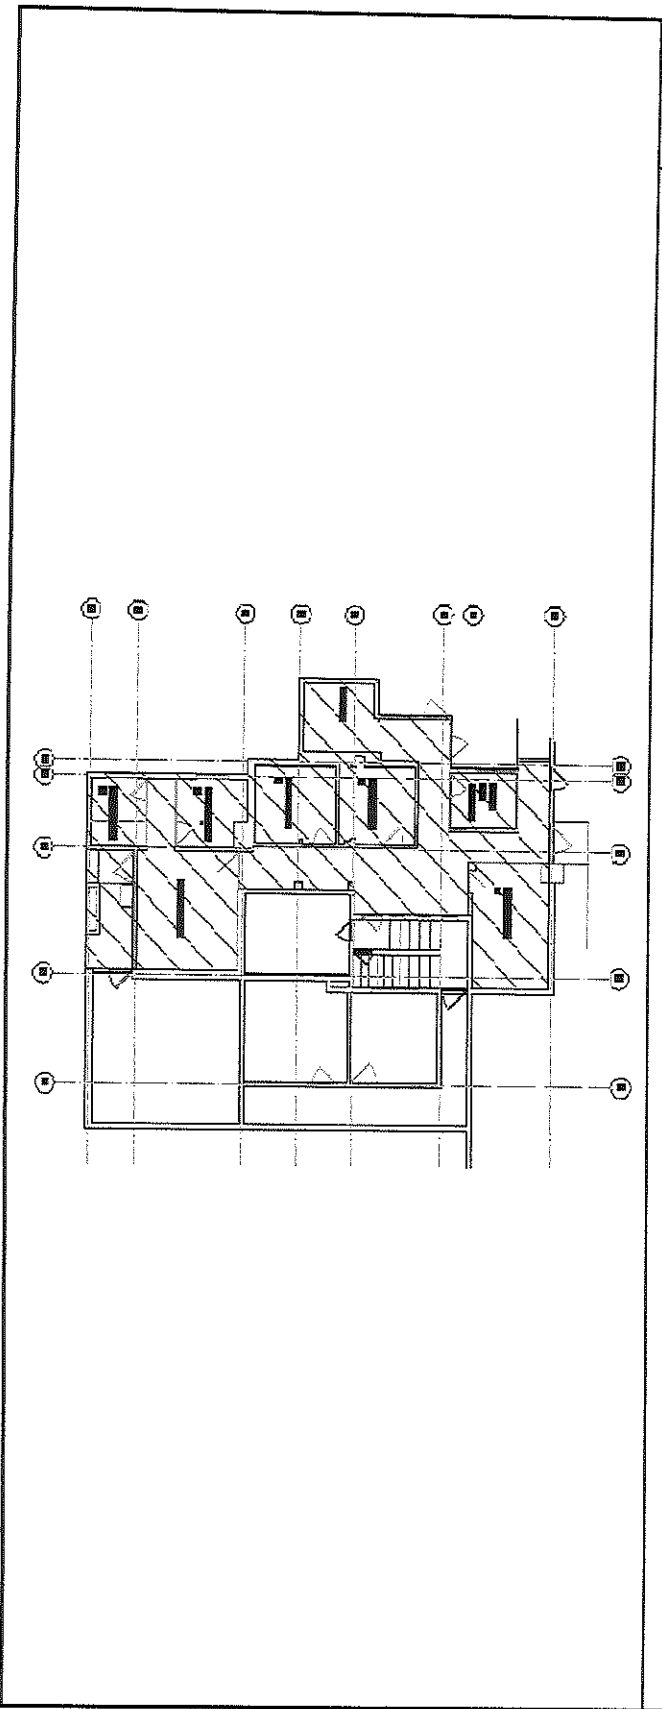

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


[Signature]
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Edgar Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. D/CSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		CONSTRUCCION INTERIOR		DE: 19/06/2020	
N/A		SUBPARTIDA:		AL: 28/06/2020	
PARTIDA:		ACCESO		FECHA: 28/06/2020	
CLAVE		CONCEPTO			

AD 1 CAMBIO DE GIRO DE PUERTA (Ine cambio de marco, recorte de vidrio y colocacion de ceramica)

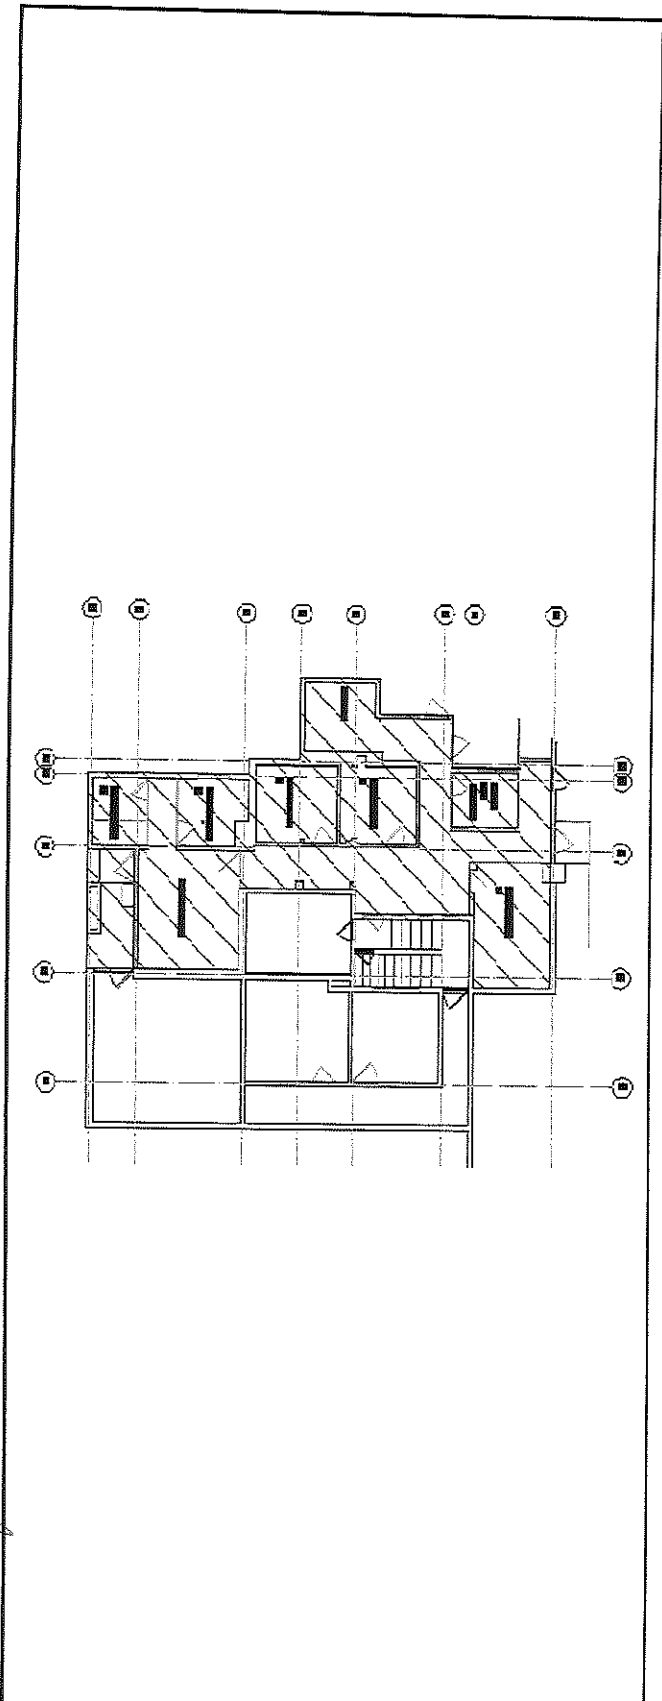

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

J. N. A.
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

[Signature]
 Ing. Jose Lilia Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA


CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	8
CONTRATO:						DEL: 18/05/2020
						A.L: 28/08/2020
PARTIDA:		CONSTRUCCION INTERIOR		ACCESO		FECHA: 28/06/2020
M/A		SUBPARTIDA:		DE: 2		

CLAVE

CONCEPTO

AD 2 SUMINISTRO DE PAPEL ARENADO EN PUERTAS

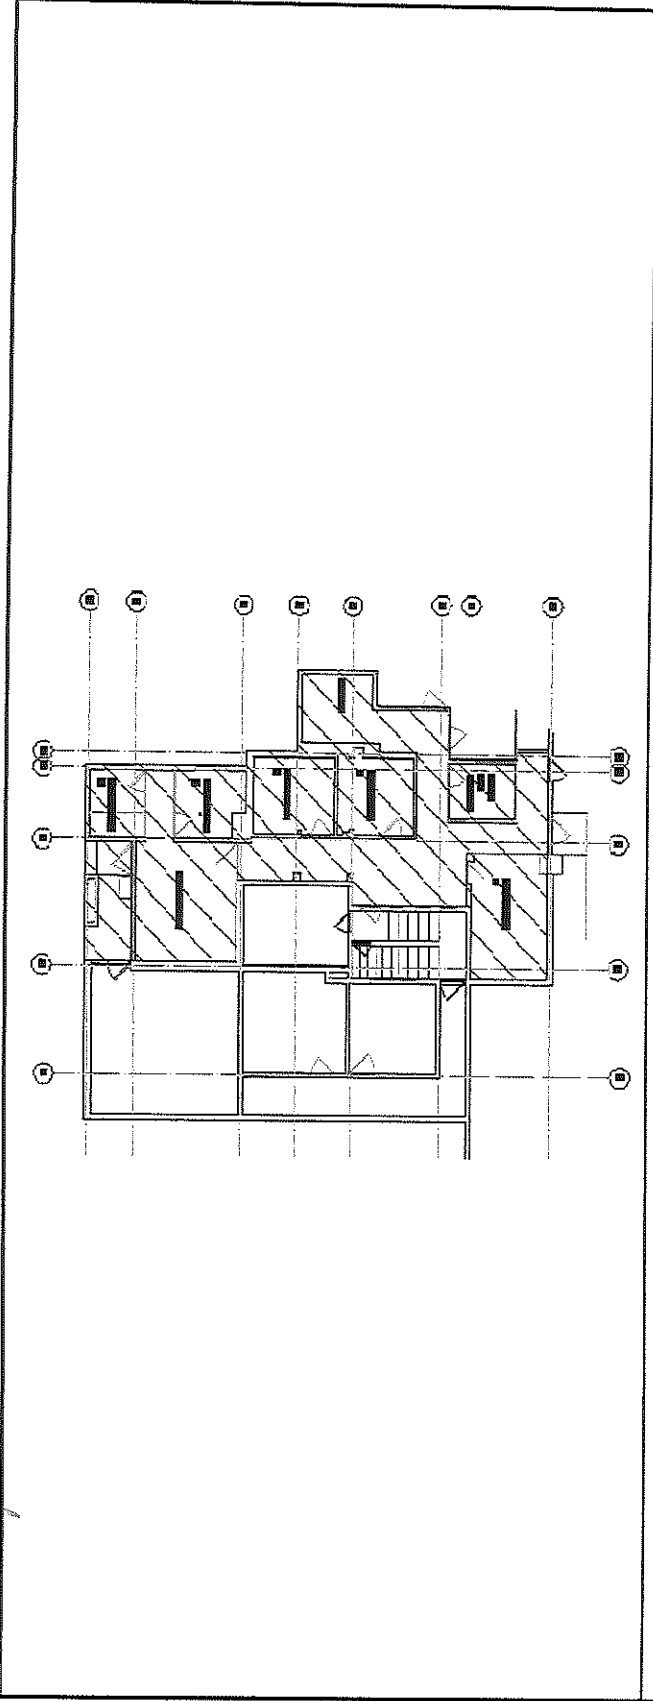

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra


Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

Ing. Jose LUIS Rodriguez Hernandez
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFIA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	6
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	CONSTRUCCION INTERIOR	SUBPARTIDA:	ACCESO	HOJA: 2 DE: 3
CLAVE	CONCEPTO				

AD 3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPEL ARENADO EN VENTANAS
------	--

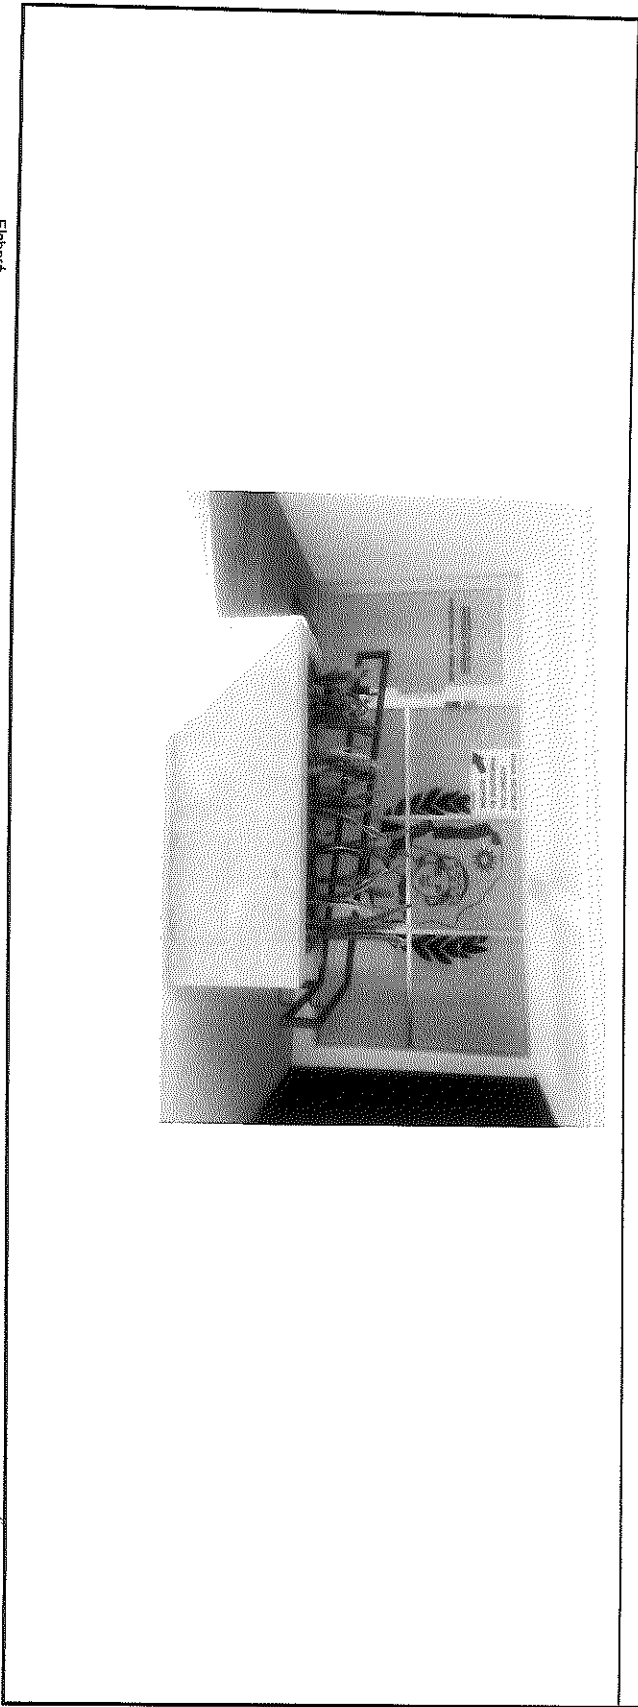



Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.



 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra


 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		PARTIDA:		ACCESO	
N/A		CONSTRUCCION INTERIOR		SUBPARTIDA:	
CLAVE		CONCEPTO		DE: 3	
AD 3		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPEL ARENADO EN VENTANAS		DEL: 18/05/2020	
				AL: 26/06/2020	
				FECHA: 26/06/2020	

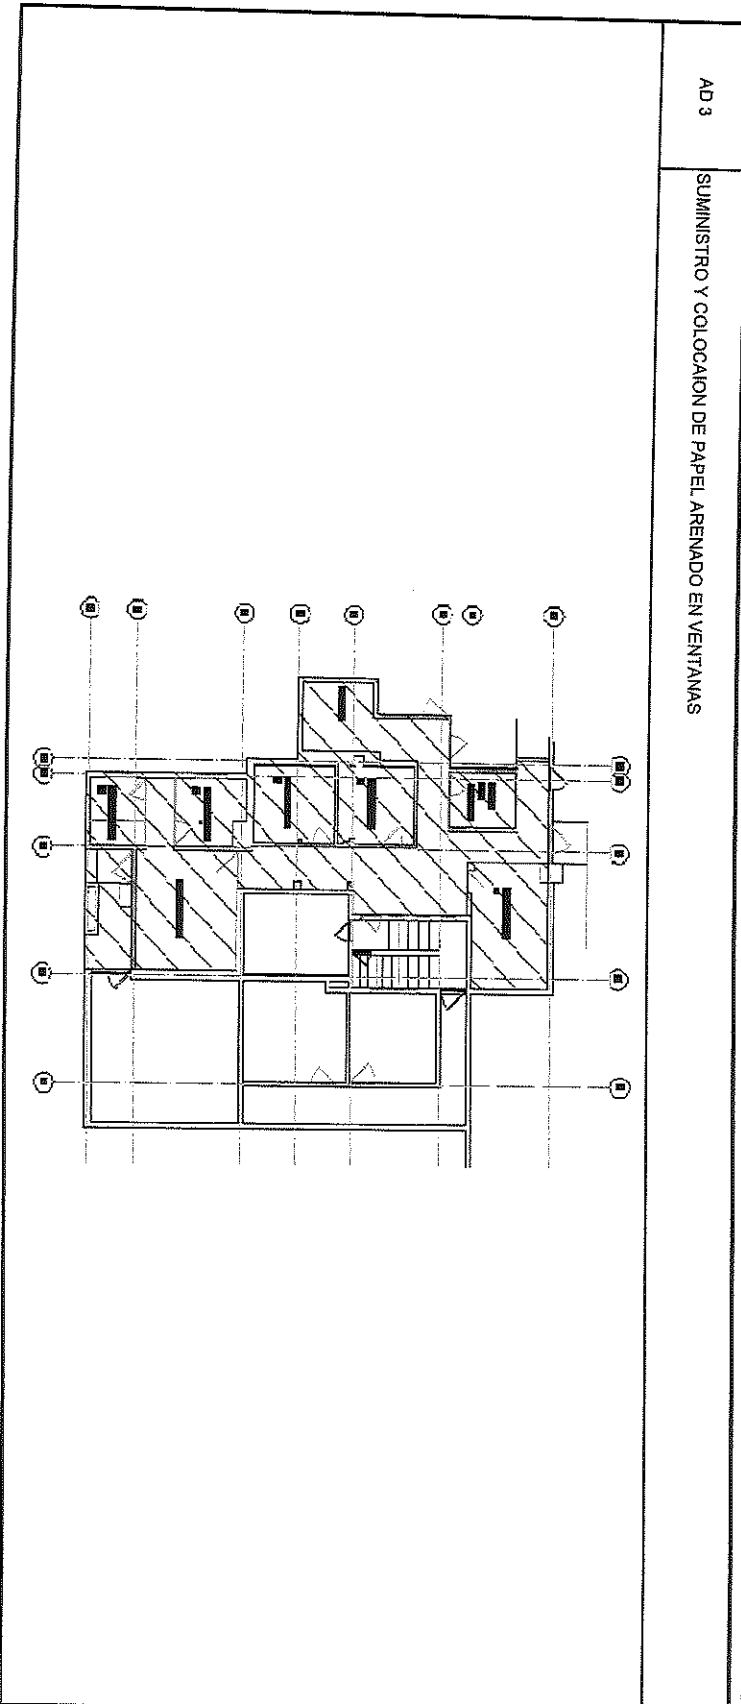

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo

Carlos Vargas Ortega
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Olivares Salgado
 Arq. Carlos Olivares Salgado
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
 Diseños y Construcciones Civiles S.A. de C.V. DICSA

FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	6
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		CANCELERIA	SUBPARTIDA:	SALA DE JUNTAS	DE: 3
CONTRATO:		PARTIDA:		HOJA: 2	AL:
CONTRATO:		PARTIDA:		DE: 3	FECHA:
CONTRATO:		PARTIDA:		26/06/2020	26/06/2020

CONCEPTO


TEMP*13	FLUJO CLARO DE 98*220 EN ALUMINIO G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM
---------	--



CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	6
CONTRATO:		MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 18/06/2020
PARTIDA:		SUBPARTIDA:	DE: 3	AL: 28/06/2020
N/A		CANCELERIA	SALA DE JUNTAS	FECHA: 26/06/2020

CLAVE	CONCEPTO
TEMP*13	FLUJO CLARO DE 98*220 EN ALUMINIO G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM

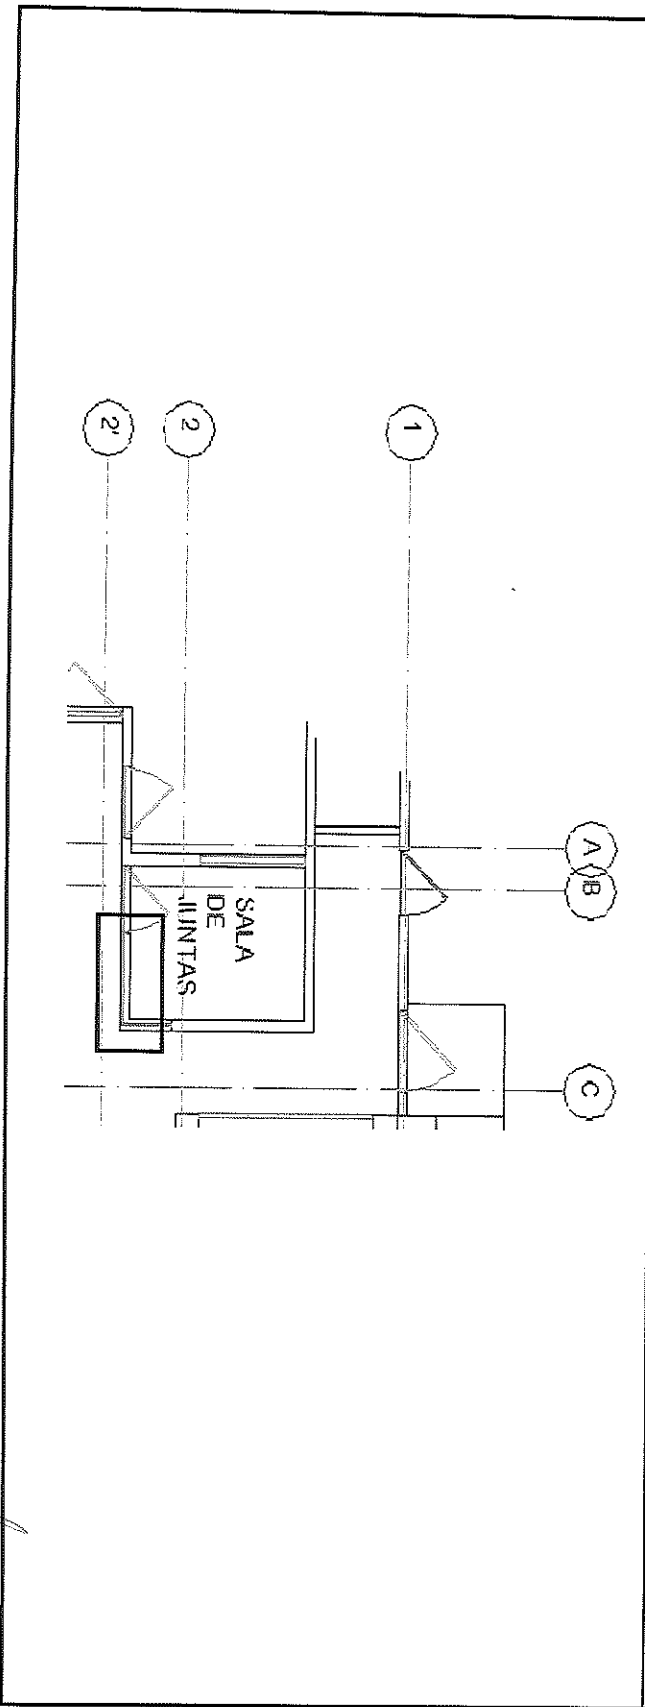

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.


Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO	ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS ORIGINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	6
CONTRATO:	N/A	CANCELERIA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CLAVE	CONCEPTO			
TEMP*14	FLUO CLARO DE 79*240 EN ALUMINIO G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PARTIDA:	SUBPARTIDA:	SALA DE JUNTAS
				HOLA: 2
				DE: 3
				DEL: 28/08/2020
				AL: 28/08/2020
				FECHA: 28/08/2020

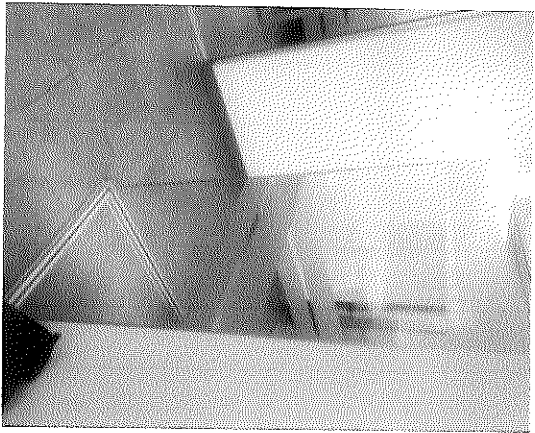

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO	ESTIMACION	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS AGCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	CANCELERIA	SUBPARTIDA:	SALA DE JUNTAS	DE: 3
				DEL:	19/06/2020
				A.L:	28/06/2020
				FECHA:	28/06/2020

CLAVE	CONCEPTO
TEMP*14	FLUJO CLARO DE 79*240 EN ALUMINIO G2 CON VIDRIO CLARO DE 6MM

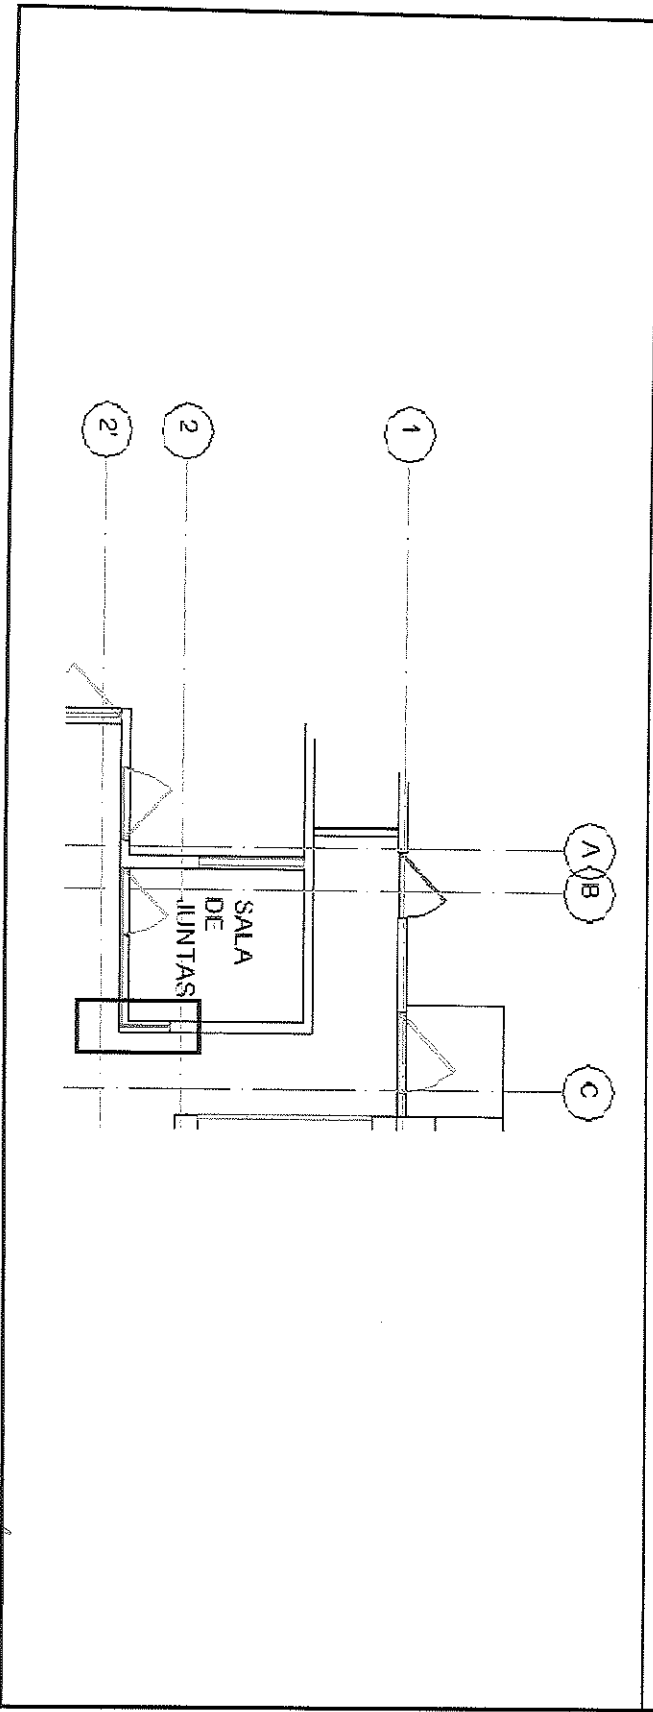

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

Jose Lelis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Lelis Rodriguez Hernandez
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

NÚMEROS GENERADORES

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.				DIRECCION:				AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO				ESTIMACION									
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS				ESTADO:				CHIHUAHUA		MUNICIPIO:		CHIHUAHUA									
CONTRATO:	N/A				PARTIDA:				CANCELERIA		SUBPARTIDA:		PASILLO									
CLAVE	CONCEPTO				LOCALIZACION				LARGO		ANCHO		ALTO		PZAS		UNIDAD					
TEMP-38	PUERTA DE 80*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6 MM				C Y D				2' Y 3		0.80 MT		0.1016 MTS		2.20 MTS		1.00		PZA		1.00	
Elaboró																						
Autorizo																						
Vo.Bo																						
TOTAL															PZA		1,00					

Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra



Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra




Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A da C.V. DICSA



CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO	ESTIMACION	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS ORIGINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		CANCELERA	SUBPARTIDA:	PASILLO	DE: 3
PARTIDA:					
N/A					
CLAVE		CONCEPTO			

TEMP*38	PUERTA DE 80*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6 MM
---------	--

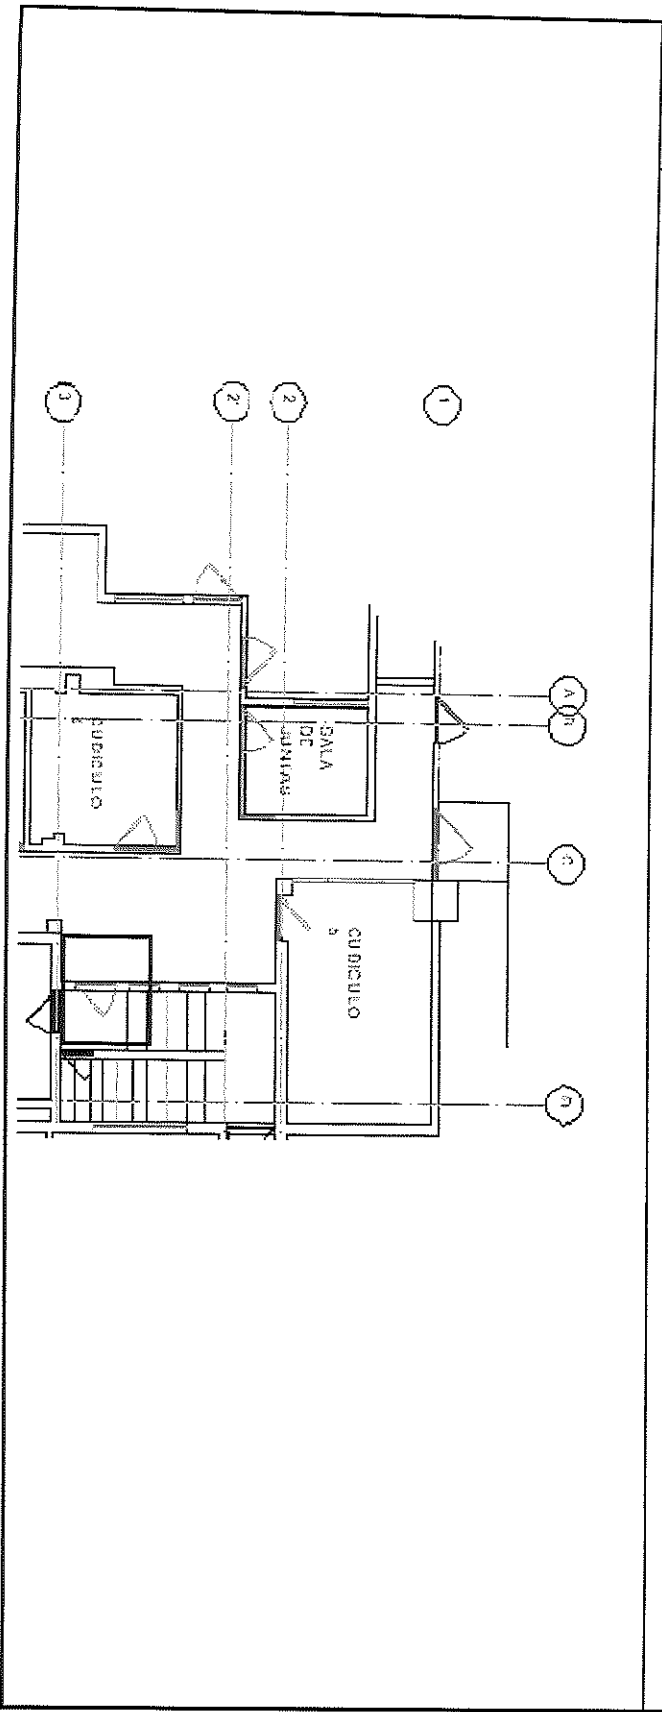

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega

Carlos Olivas Salcedo

Jose Luis Rodríguez Hernández

Arq. Carlos Vargas Ortega

Arq. Carlos Olivas Salcedo


Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández

FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	6
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	PARTIDA:		SUBPARTIDA:	
		CANCELERIA		PASILLO	
				HOLA: 2	DEL: 18/05/2020
				DE: 3	AL: 28/06/2020
				FECHA:	28/06/2020

CONCEPTO

TEMP*38 PUERTA DE 80*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6 MM

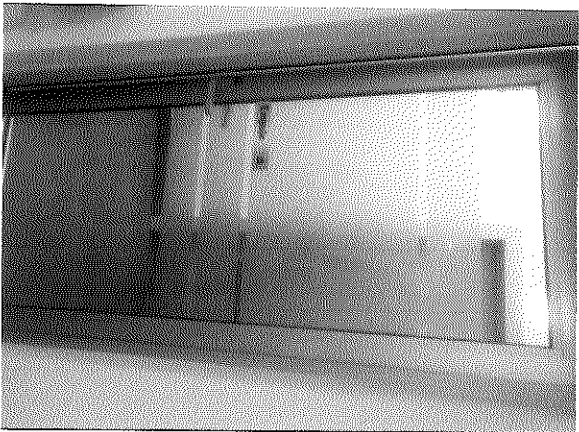

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Atq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra


Carlos Olivas Salcedo
Atq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

José Luis Rodríguez Hernández
Ing. José Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	8
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	18/05/2020
CONTRATO:	N/A			CANCELERIA	SUBPARTIDA:	CUBICULO 6	HOLA:2	28/06/2020
CLAVE	CONCEPTO			DE: 3			FECHA:	28/06/2020

TEMP:37	FLUJO DE 283*220 Y FLUJO LATERAL EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6 MM
---------	--

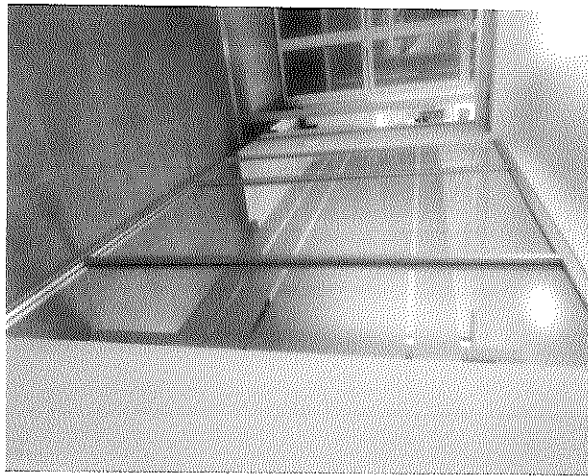

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Otega

Arq. Carlos Vargas Otega
Residente de Obra

Carlos Olivas Salcedo


Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

Jose Luis Rodriguez Hernandez

Ing. José Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	CANCELERIA	SUBPARTIDA:	CUBICULO 5	DEL: 16/05/2020 AL: 28/05/2020
CLAVE	CONCEPTO				
TEMP*37	FIJO DE 283*220 Y FIJO LATERAL EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6 MM				

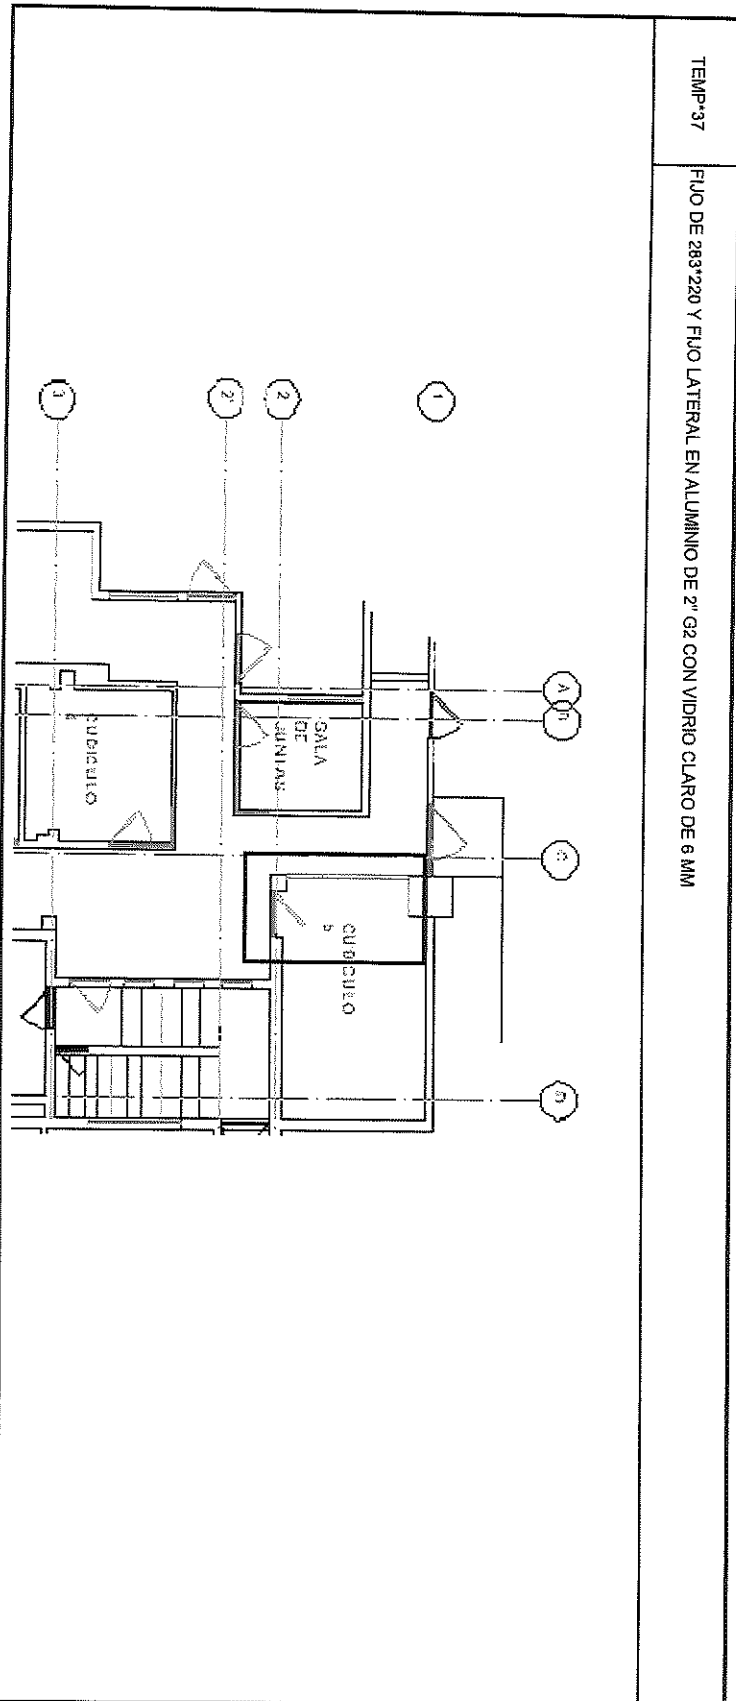

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Arq. Carlos Vargas Ortega


Arq. Carlos Olivás Salcedo

Ing. José Luis Rodríguez Hernández

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA DE LAS OFINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		CANCELERIA	SUBPARTIDA:	CUBICULO 5	DEL: 16/05/2020
PARTIDA:				HORA: 2	AL: 28/06/2020
M/A				DE: 2	FECHA: 28/06/2020

CLAVE	CONCEPTO
TEMP-38	PUERTA DE 80*240 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6 MM

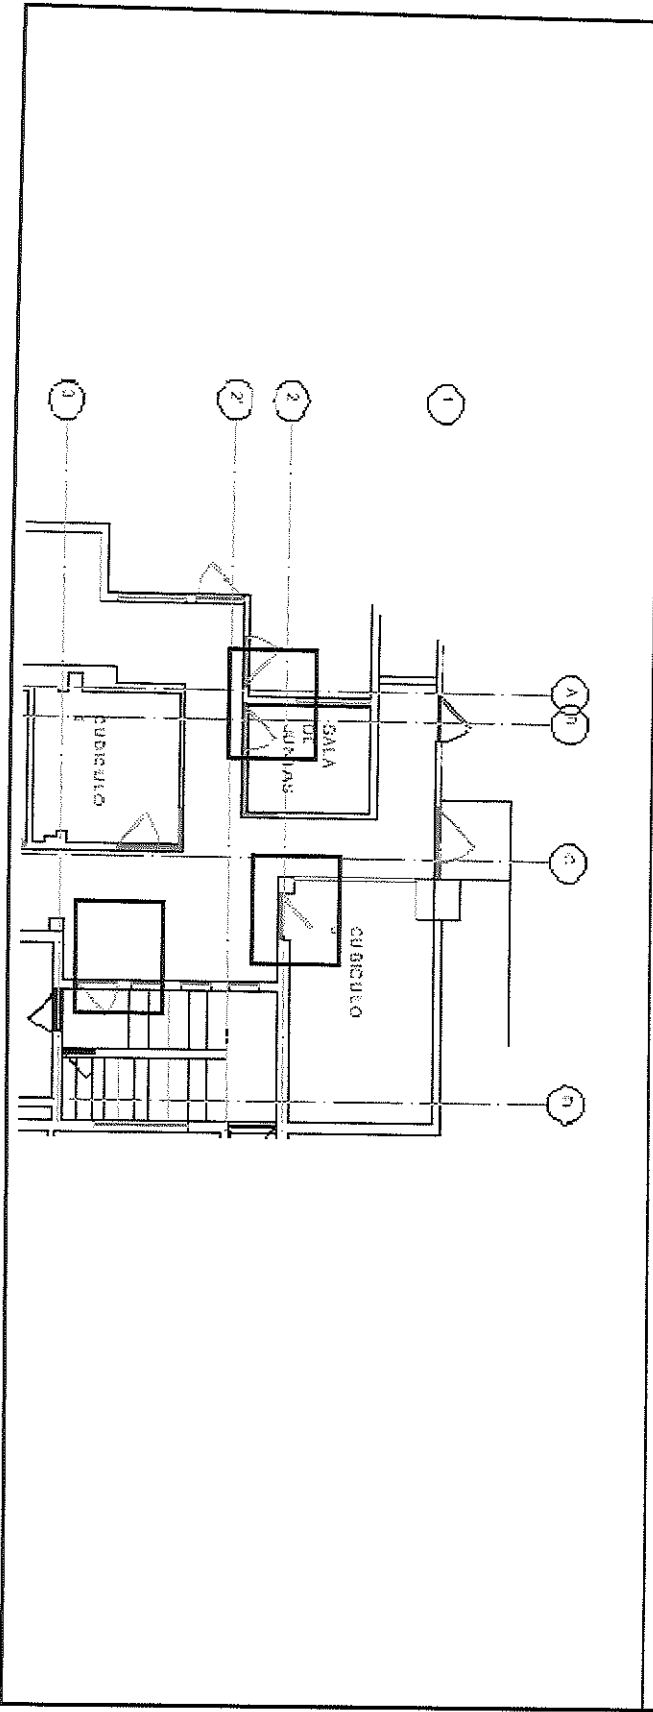

Elaboró

Autorizo

Vo. Ba.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega

Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo

José Luis Rodríguez Hernández
Ing. José Luis Rodríguez Hernández

FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.		DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO		ESTIMACION	6	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS		ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	18/05/2020
	CONTRATO:		CANCELERIA	SUBPARTIDA:	CUBICULO 4	HOLA: 2	AL:	28/06/2020
		PARTIDA:				DE: 3	FECHA:	28/06/2020
CLAVE	CONCEPTO							

TEMP+15 VENTANA FIJA DE 90*220 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6 MM



Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra

Carlos Olivas Salcedo
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra


José Luis Rodríguez Hernández
 Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	6
	CONTRATO:	CANCELERIA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
	N/A	SUBPARTIDA:	CUBICULO 4	DE: 2
				AL: 28/09/2020
				FECHA: 28/09/2020

CONCEPTO

TEMP*16 PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 36*240 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6 MM

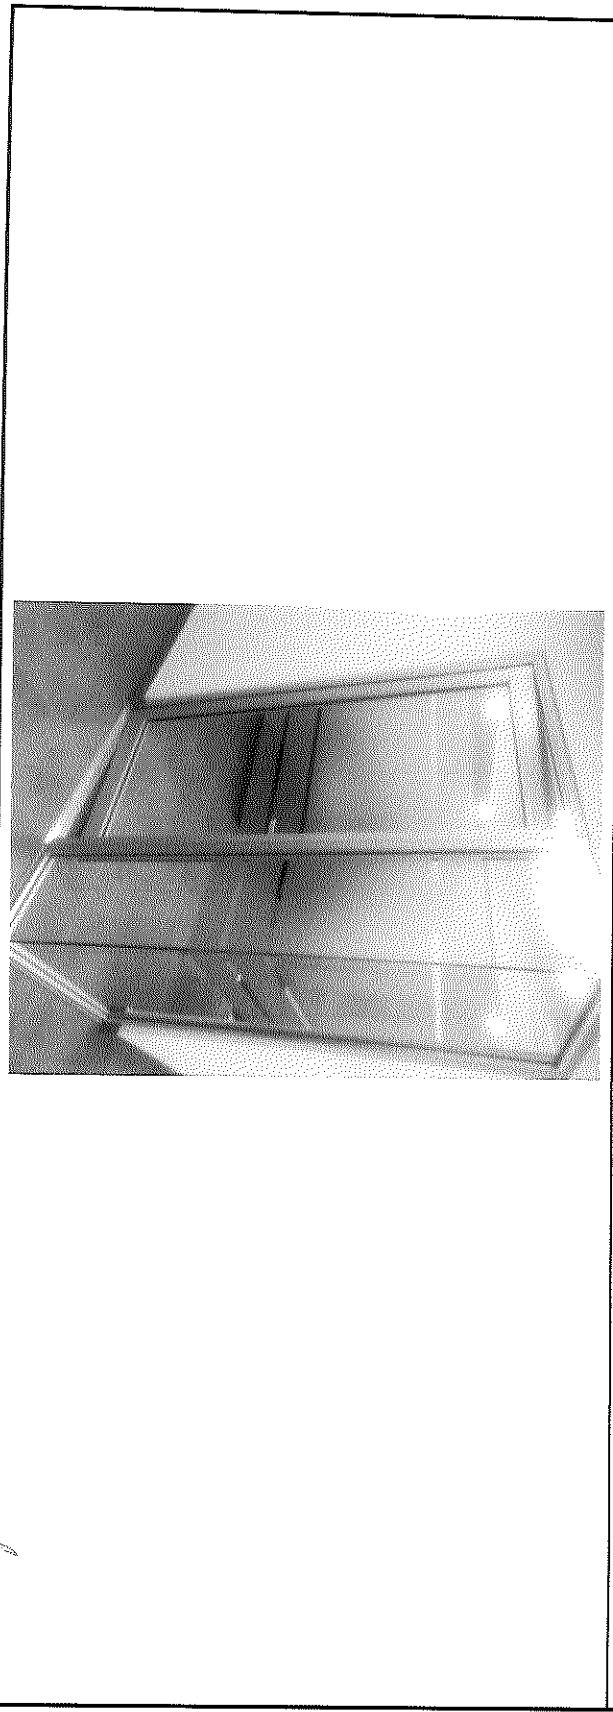

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas

Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

[Signature]


Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

[Signature]

Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	6
CONTRATO:	N/A	CANCELERIA	SUBPARTIDA:	PASILLO	CHIHUAHUA
GLAVE	CONCEPTO				
TEMP*18	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 51*240 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO 6 MM				

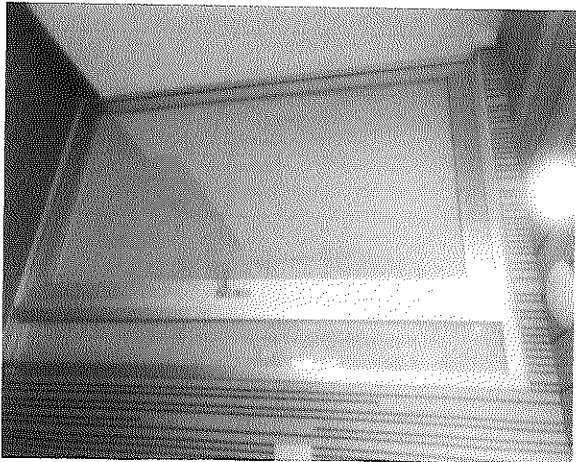

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivás Salcedo
 Arq. Carlos Olivás Salcedo
 Supervisor de Obra

Jose Luis Rodríguez Hernández
 Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	6
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 16/05/2020
CONTRATO:		CANCELERIA	SUBPARTIDA:	PABILLO		AL: 26/06/2020
	N/A				DE: 3	FECHA: 26/06/2020

CLAVE	CONCEPTO
TEMP-18	PUERTA DE 90*220 Y FLUO LATERAL DE 61*240 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO 6 MM

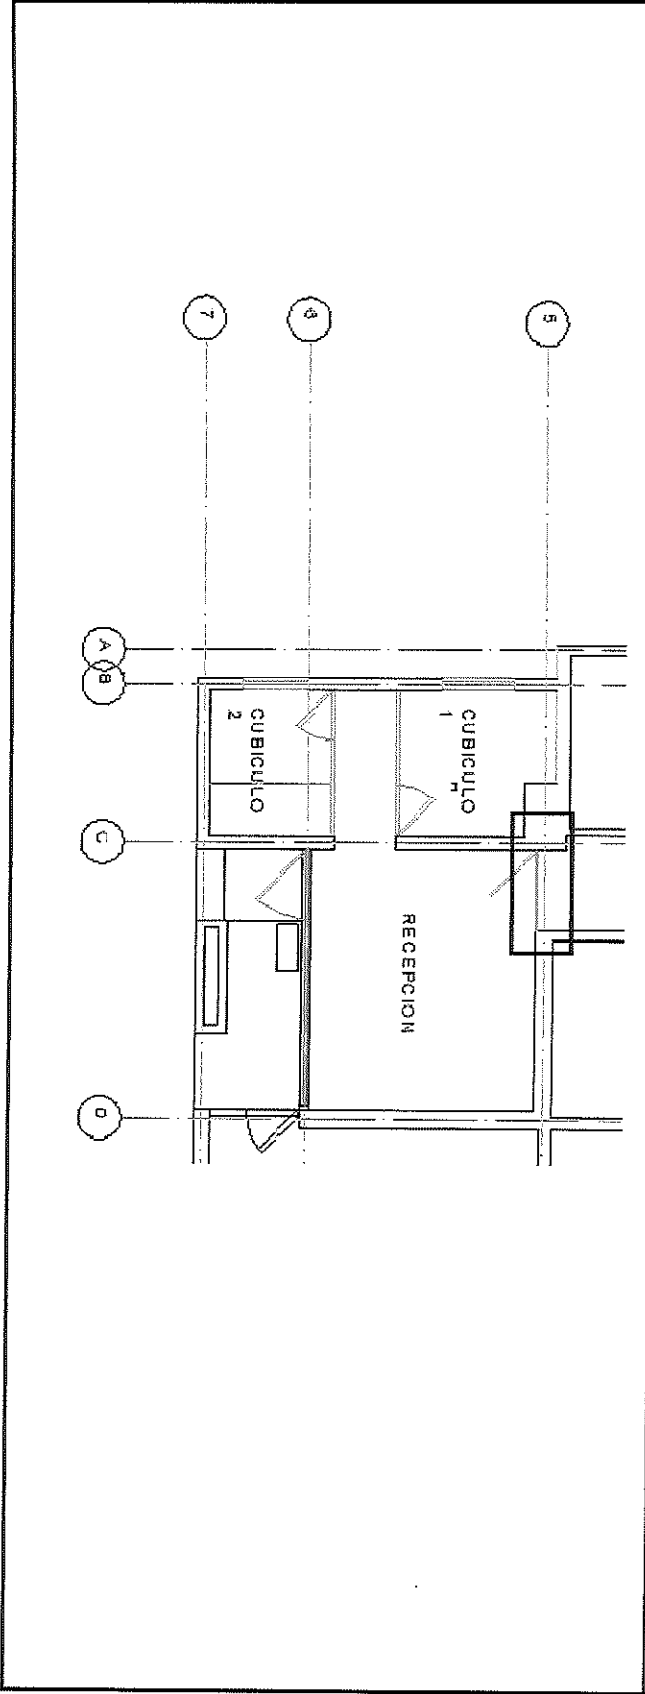

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas O.
Arq. Carlos Vargas Ortiga


[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo

[Signature]
Ing. José Luis Rodríguez Hernández

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	6
	CONTRATO:		CHIHUAHUA		DEL: 18/05/2020
	N/A				AL: 28/06/2020
					FECHA: 28/06/2020
CLAVE	PARTIDA:	CANCELERIA	SUBPARTIDA:	CUBICULO 3	DE: 2
CONCEPTO					

TEMP-17 PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 36*240 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO DE 6 MM

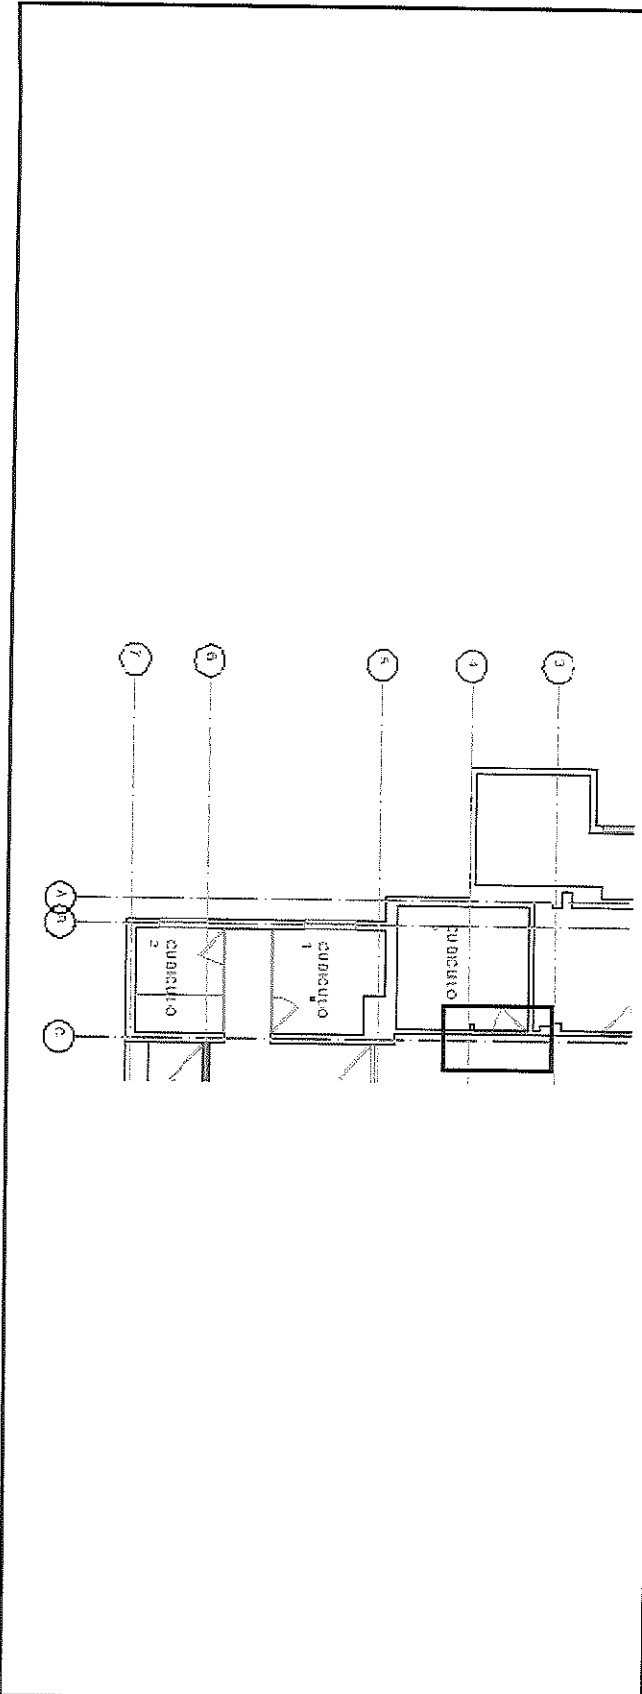


Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.


 Arq. Carlos Vargas Ortega



 Arq. Carlos Olivares Salcedo


 Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez

FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.		DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427 COL. ZARCO		ESTIMACION	6	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS		ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	18/05/2020
CONTRATO:	N/A	PARTIDA:	CANCELERIA	SUBPARTIDA:	CUBICULO 2	HORA: 2	AL:	28/06/2020
CLAVE			CONCEPTO		DE: 3	FECHA:	28/06/2020	

TEMP*22 PUERTA DE 80*220 Y FLUJO LATERAL DE 165*240 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO 6 MM

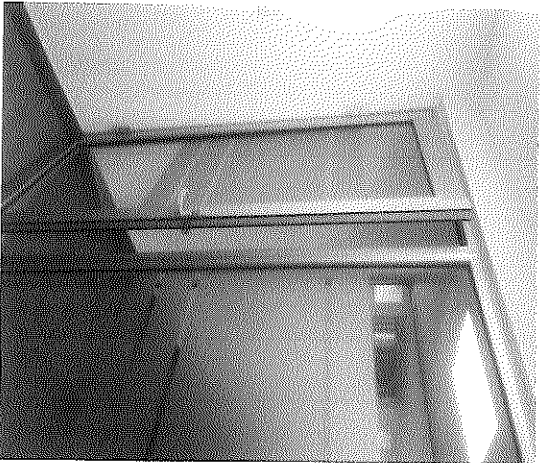

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
 Arq. Carlos Vargas Ortega
 Residente de Obra


Carlos Olivas Salcedo
 Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Supervisor de Obra

José LUIS Rodríguez Hernández
 Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	6
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 18/06/2020
CONTRATO:				SUBPARTIDA:		CUBICULO 2	AL: 26/06/2020	FECHA: 28/06/2020
PARTIDA:				CANCELERA			DE: 3	
CLAVE				CONCEPTO				

TEMP ² 22	PUERTA DE 80*220 Y FIJO LATERAL DE 165*240 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO 6 MM
----------------------	---

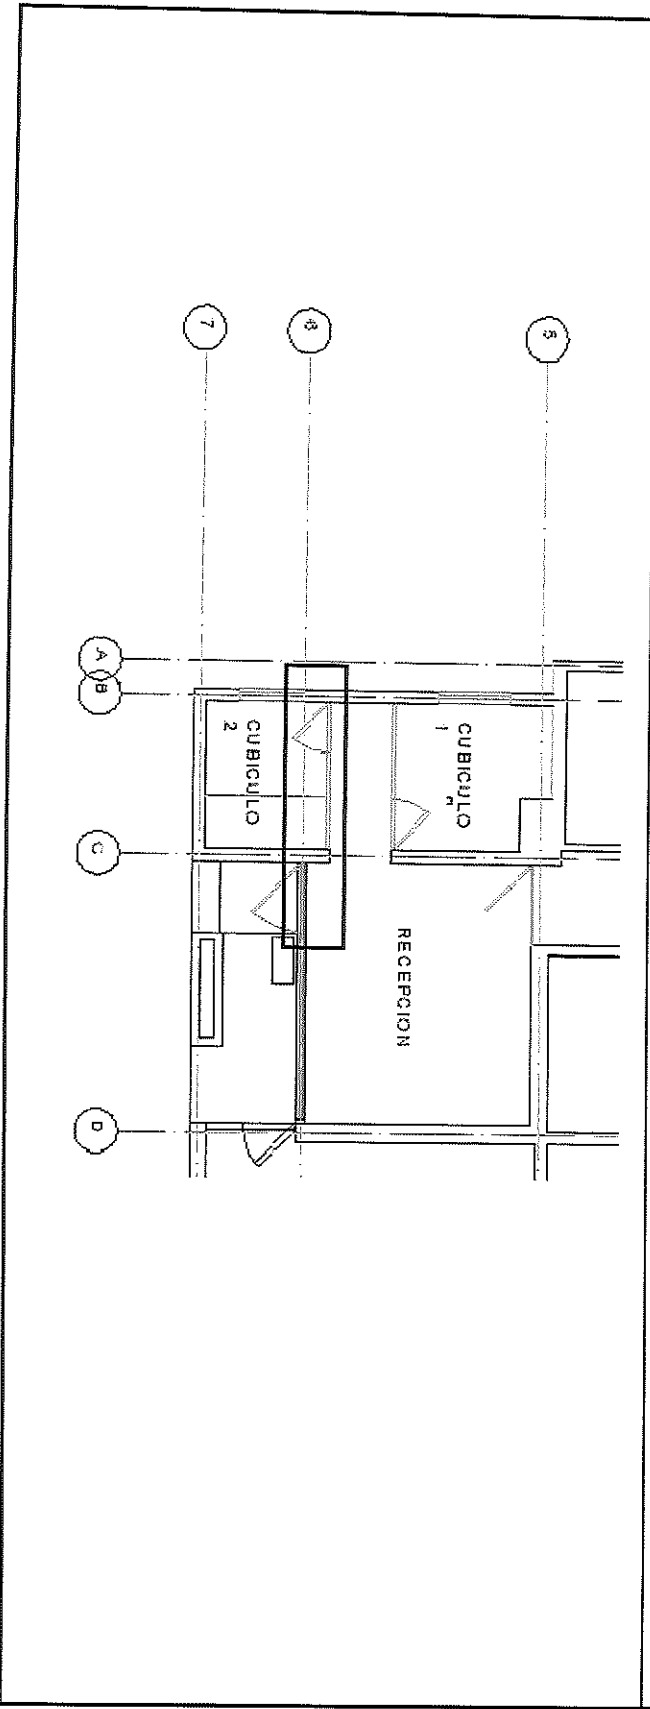

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Arg. Carlos Vargas Ortega


Arg. Carlos Olivares Salcedo

Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	CANCELERIA	SUBPARTIDA:	CUBICULO 4	DE: 3
				DEL:	18/05/2020
				AL:	28/05/2020
				FECHA:	28/06/2020

CLAVE	CONCEPTO
TEMP*16	PUERTA DE 90*220 Y FIJO LATERAL DE 36*240 EN ALUMINIO DE 2° G2 CON VIDRIO CLARO DE 6 MM

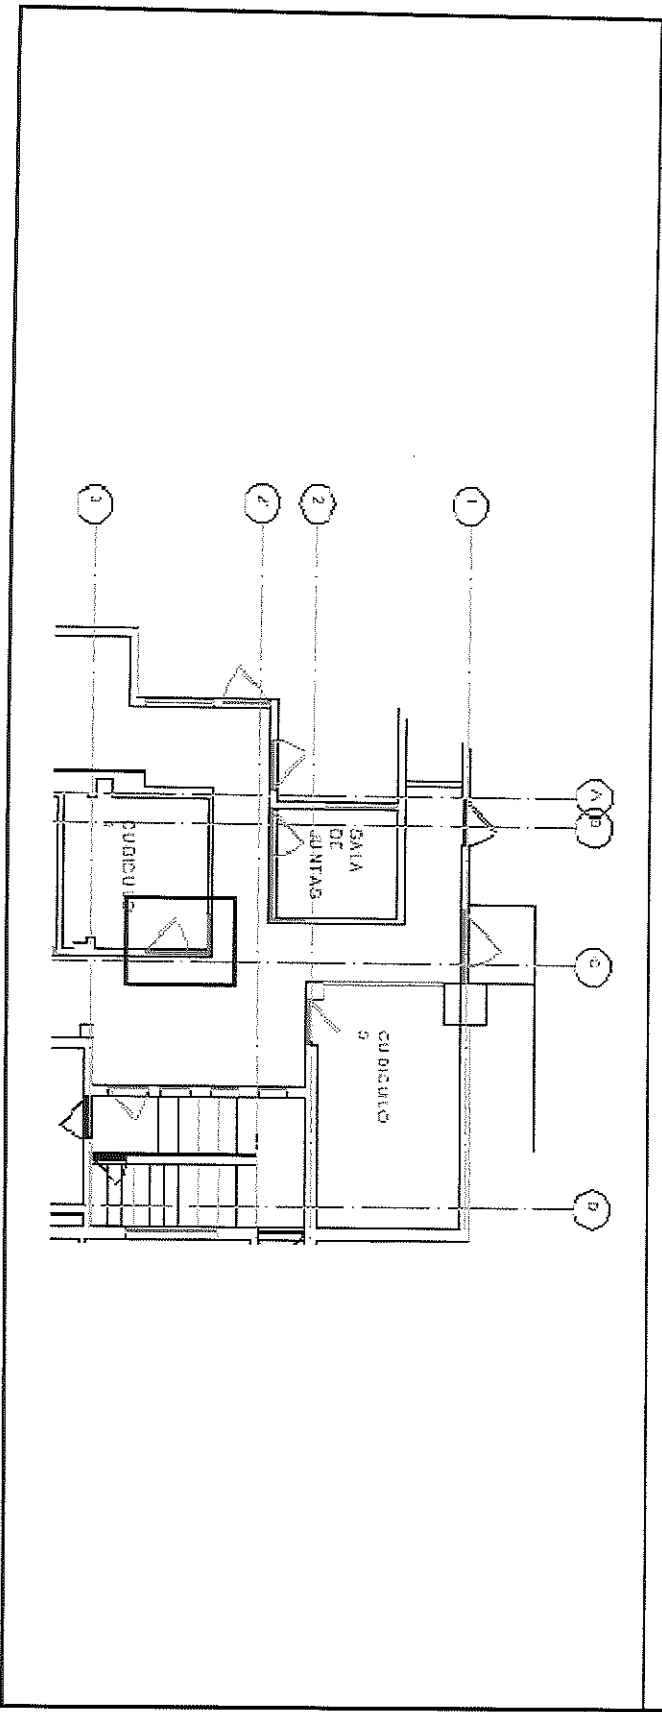

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

[Signature]
Arq. Carlos Vargas Ortiga

[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo


[Signature]
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez

FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	6
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
CONTRATO:	N/A	CANCELERIA	SUBPARTIDA:	CUBICULO 1	HOLA: 2	DEL: 18/05/2020
					DE: 3	AL: 28/05/2020
						FECHA: 28/06/2020

CONCEPTO

TEMP: 23	PUERTA DE 90*220 Y FUDO LATERAL DE 165*240 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO 6 MM
----------	---

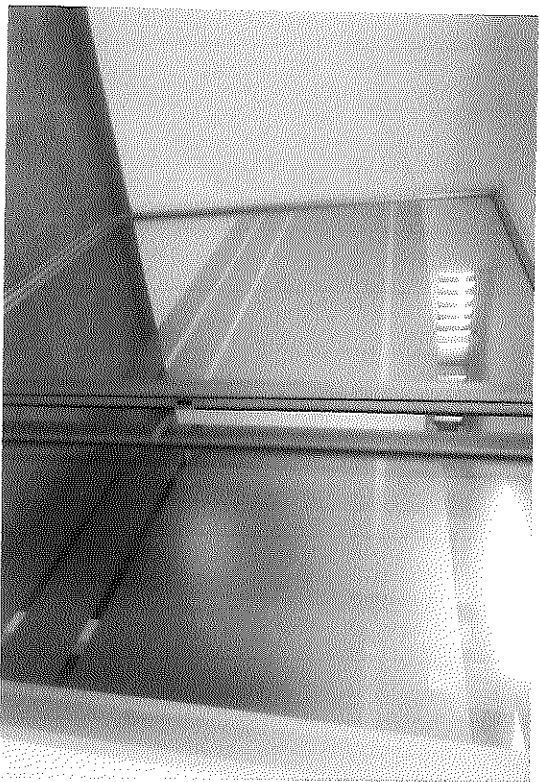

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra


Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra

José Luis Rodríguez Hernández
Ing. José Luis Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DICSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	5
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		CANCELERIA	SUBPARTIDA:	CUBICULO 1	DE: 3
PARTIDA:				HOLA: 3	FECHA: 28/05/2020
N/A				AL:	28/05/2020
				FECHA:	28/05/2020

CLAVE	CONCEPTO
TEMP*23	PUERTA DE 90*220 Y FLUJO LATERAL DE 165*240 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIO CLARO 6 MM

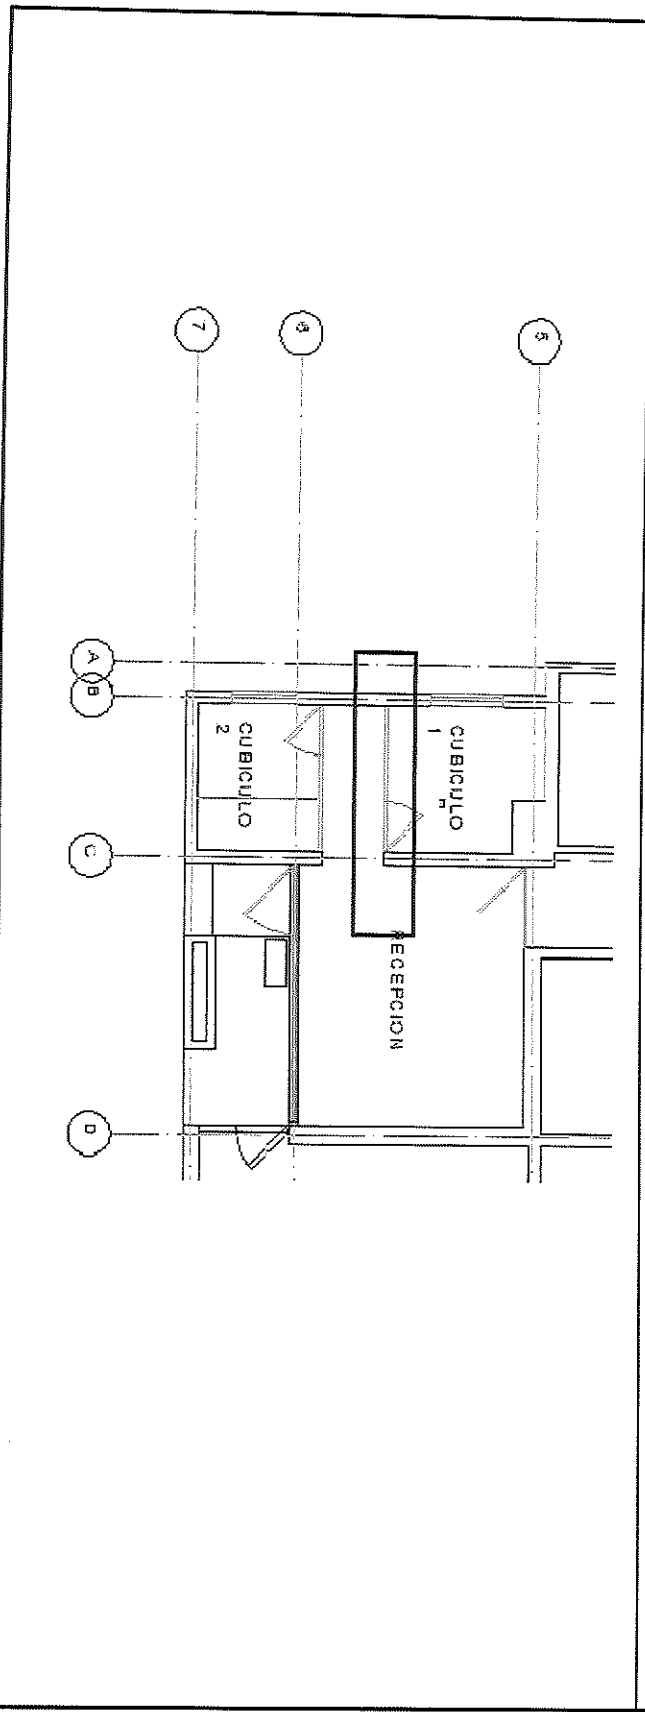

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega

Carlos Olivas Salcedo

Jose Lys Rodriguez Hernandez

Arq. Carlos Vargas Ortega


Arq. Carlos Olivas Salcedo

Ing. Jose Lys Rodriguez Hernandez

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.			DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	9	
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS			CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL:	16/06/2020
								HORA: 2	28/06/2020
CONTRATO:				CANCELERIA	SUBPARTIDA:	RECEPCION	DE: 2	FECHA:	28/06/2020
N/A									
PARTIDA:				CONCEPTO					

CLAVE	CONCEPTO								
TEMP*20	VENTANA CORREDIZA DE 1*1 EN ALUMINIO DE 2" G2 CON VIDRIOS CLAROS DE 6MM								

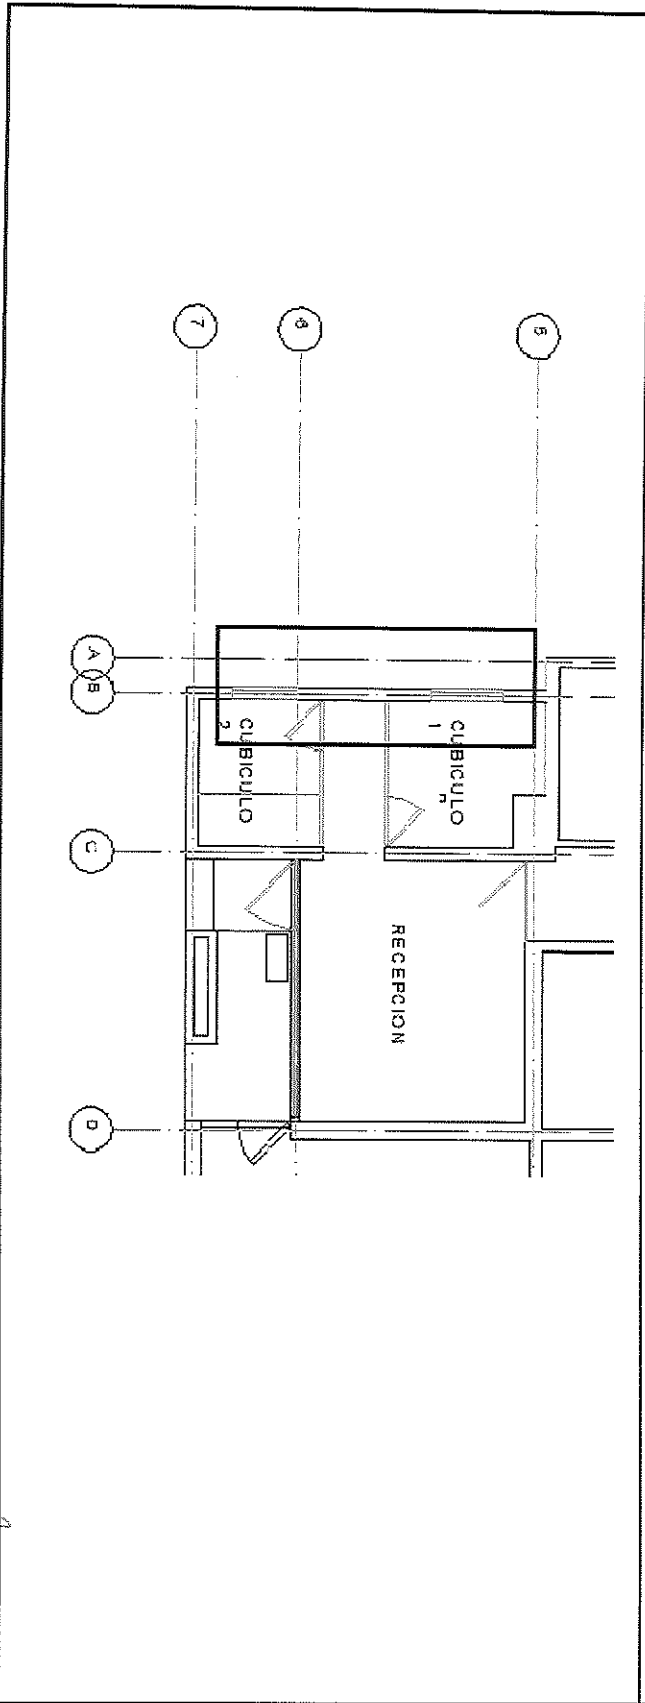

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Arq. Carlos Vargas Ortega


Arq. Carlos Olivas Salcedo

Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO	ESTIMACION	
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA DE LAS OFINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:		CANCELERIA	SUBPARTIDA:	RECEPCION	DE: 2
PARTIDA:				FECHA:	28/08/2020
CLAVE		CONCEPTO			

TEMP°36 VENTANAL FIJO DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 mm 480°240 INCLUYE PUERTA DE 120°240

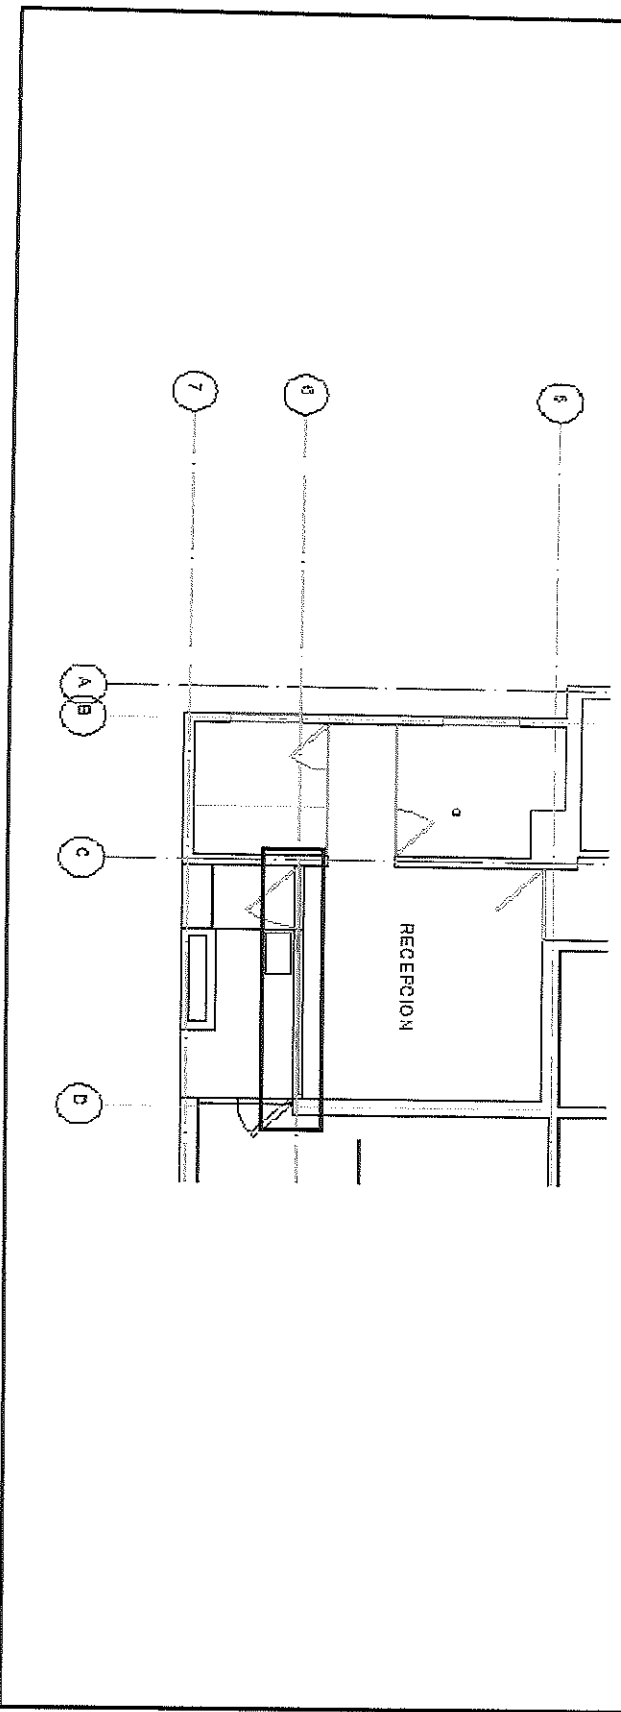

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
Arq. Carlos Vargas Ortega


Carlos Olivas Salcedo
Arq. Carlos Olivas Salcedo

Jose Luis Rodriguez Hernandez
Ing. Jose Luis Rodriguez Hernandez

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION	6
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CUIDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	DEL: 18/05/2020
CONTRATO:		SUBPARTIDA:		ALBALERIAS	HOLA: 2	A.L.: 28/08/2020
PARTIDA:		CONSTRUCCION EXTERIOR		DE: 2		FECHA: 28/08/2020
CONCEPTO						

TEMP*24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL
---------	-------------------------------------

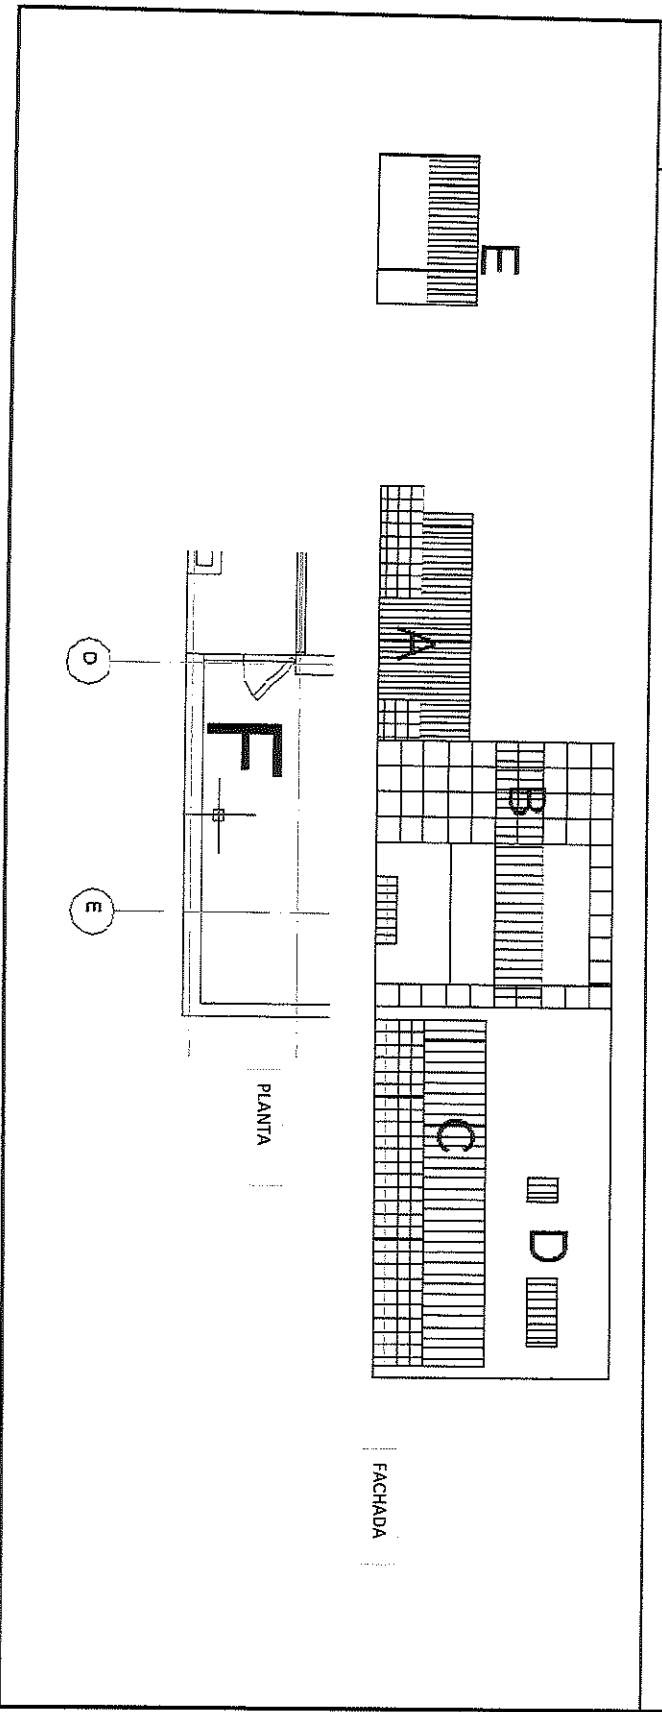

Elaboró

Autorizo

Va. Bo.

Carlos Vargas
Arq. Carlos Vargas Ortega

[Signature]
Arq. Carlos Olivas Salcedo

[Signature]
Ing. Jose Luis Rodríguez Hernández

FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE ZARCO N° 2427 COL. ZARCO	ESTIMACION	6
OBRA:	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCIÓN Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	ESTADO:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATO:	N/A	CANCELERIA	SUBPARTIDA:	CUBICULO 5	HOJA: 2
CLAVE	CONCEPTO				
PUERT 5	PUERTA DE SERVICIO PARA CUARTO ELECTRICO				



Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega

Arq. Carlos Vargas Ortega
Residente de Obra

Carlos Olivas Salcedo

Arq. Carlos Olivas Salcedo
Supervisor de Obra


José Lilia Rodríguez Hernández

Ing. José Lilia Rodríguez Hernández
Diseños y Construcciones Civiles S.A de C.V. DCSA

CROQUIS

CONTRATISTA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	DIRECCION:	AVE. ZARCO N° 2427, COL. ZARCO		ESTIMACION
OBRA:	REMODELACION Y REHABILITACION DEL AREA DE "ATENCION Y QUEJAS" Y AREA DE CALDERA Y BODEGA, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ACCESORIOS	CIUDAD:	CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
	CONTRATO:				DELI: 6
	N/A				18/05/2020
					AL: 28/05/2020
					FECHA: 28/05/2020
CLAVE	CONCEPTO				

MURO DUROCK	MUROS DE DUROCK 2 CARAS
-------------	-------------------------

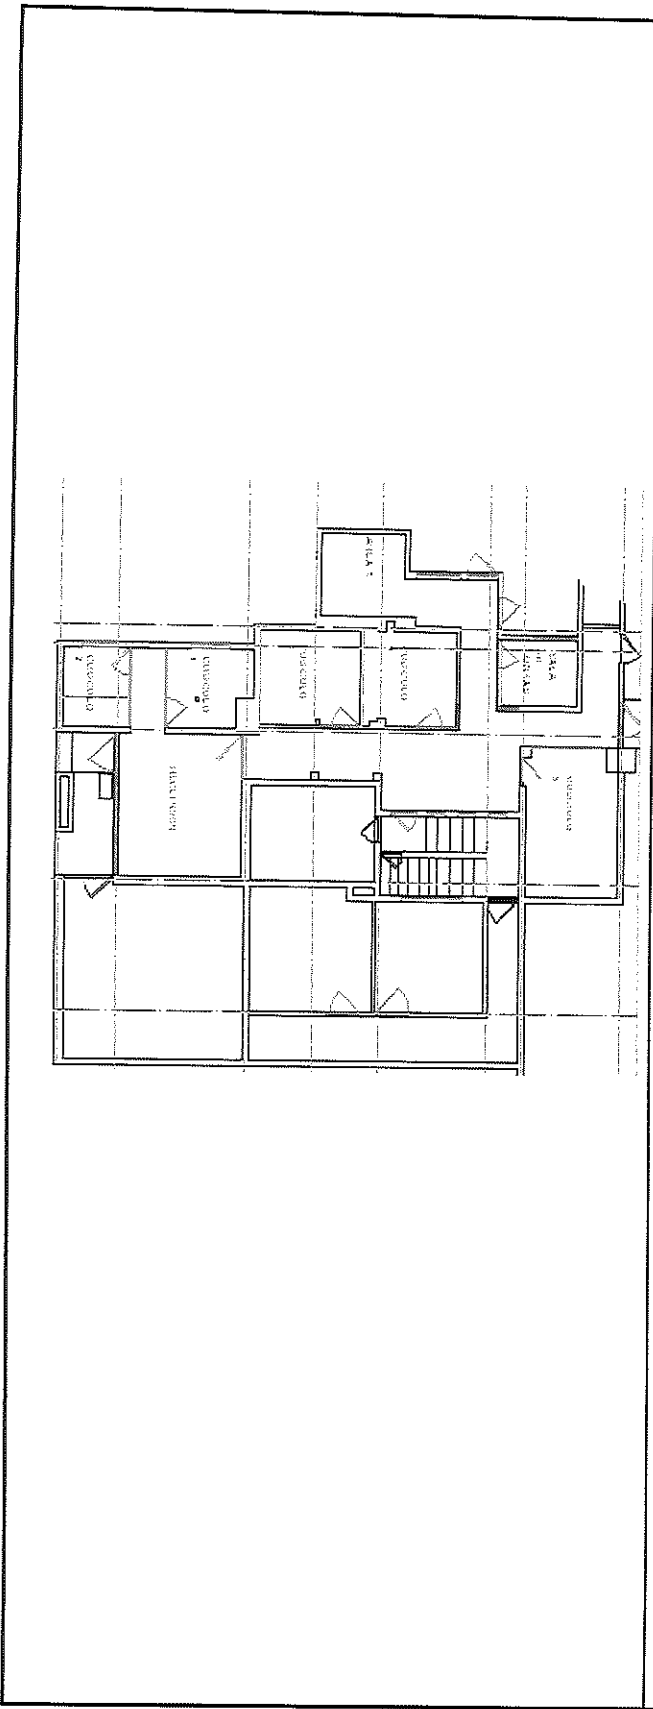

Elaboró

Autorizo

Vo. Bo.

Carlos Vargas Ortega
 Arq. Carlos Vargas Ortega

Arq. Carlos Olivas Salcedo
 Arq. Carlos Olivas Salcedo

Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Ing. José Luis Rodríguez Hernández

